



**ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Государственная лицензия 01 ГСЛ № 001227

АРХ.№38-1.2-2021

**Строительство подводящего газопровода
и сетей газоснабжения п. Актау и
п. Мустафина**

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Рабочий проект
34/2021-06-04-ПОС

Том I Книга 3

Технический директор

Главный инженер проекта



Б. Канахин

В. Селезнев

2022

Оглавление

3. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.....	2
3.1 Общие сведения по организации строительства с учетом обеспечения безопасности труда и условий охраны труда работающих.....	2
3.2 Общие положения строительства.....	5
3.3 Краткая характеристика условий осуществления строительства	6
3.4 Основные решения по организации работ.....	10
3.5 Продолжительность строительства	14
3.6 Основной период строительства и методы производства работ.....	16
Объекты газораспределительной системы.....	17
 Земляные работы	28
 Монтаж газопровода, изоляционные и укладочные работы.....	34
 Закрытые способы прокладки газопроводов.....	43
 Сооружения на газопроводах.....	51
 Соединения элементов газопроводов.....	55
 Контроль соединений газопроводов.....	66
 Строительство и монтаж средств ЭХЗ.....	69
 Пневматические испытания.....	75
3.7 Ведомость основных машин и механизмов	79
3.8 Потребность во временных зданиях и сооружениях. Санитарно-эпидемиологические мероприятия	79
3.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности	101
3.10 Охрана окружающей природной среды	107
3.11 Основные технико-экономические показатели по ПОС	107

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	3.7 Ведомость основных машин и механизмов 79
					3.8 Потребность во временных зданиях и сооружениях. Санитарно-эпидемиологические мероприятия 79
					3.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 101
					3.10 Охрана окружающей природной среды 107
					3.11 Основные технико-экономические показатели по ПОС 107
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС
					Лист 3

Подп. и дата		<i>Дн110х10мм протяженностью 2,424 км, Дн63х5,8 мм протяженностью 4,898 км;</i> • Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ -1,ГРПШ-2 Рвх=0,3 МПа, Рвых=3 кПа, Q=до 150,0 нм3/час, марки ГРПШ-04-2У-1 с регулятором РДНК-400М без узла учета 2 ед; • Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ -3,4,5,8, ШРП-2÷ ШРП-7 Рвх=0,3 МПа, Рвых=3 кПа, Q=до 100,0 нм3/час, марки ГРПШ-04-2У-1 с регулятором РДНК-400М без узла учета 10 ед; • Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ -6,7, ШРП-1 Рвх=0,3 МПа, Рвых=3 кПа, Q=до 25,0 нм3/час, марки ГРПШ-02-У-1 с регулятором Pietro Fiorentini без узла учета 3 ед; • Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления PN0,003 МПа из труб ПЭ100 SDR17 Дн110х6,6мм протяженностью 1,224 км, Дн63х3,8 мм протяженностью 10,164 км; • Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления PN0,003 МПа из труб стальных электросварных по ГОСТ 10705 (группа В) ГОСТ 10704 Дн273х6 мм протяженностью 0,028 км, Дн159х4,5 мм протяженностью 0,264 км, Дн108х4 мм протяженностью 0,312 км ,Дн89х4 мм протяженностью 1,861 км, Дн57х3,0 мм протяженностью 8,952 к 2-пусковой комплекс:									
Взам. инв. №											
Инв. № дубл.											
Подп. и дата											
Инв. № подл	Подп. и дата	45/2019-06-27-ПОС									
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство подводящего газопровода и сетей газоснабжения п. Актау и п. Муштафина						
Разраб.		Хлебникова	<i>[подпись]</i>								
Пров.		Ягафарова	<i>[подпись]</i>								
Н. контр.		Ржондковская	<i>[подпись]</i>								
ГИП		Селезнев	<i>[подпись]</i>		Проект организации строительства						
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Стадия</td> <td style="width: 20%;">Лист</td> <td style="width: 60%;">Листов</td> </tr> <tr> <td>РП</td> <td>2</td> <td>109</td> </tr> </table>	Стадия	Лист	Листов	РП	2	109
Стадия	Лист	Листов									
РП	2	109									
					 КАТЭК ПРОЕКТНО-ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ						

- Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления PN0,003 МПа из труб стальных электросварных по ГОСТ 10705 (группа В)ГОСТ 10704 Dн57х3 мм протяженностью 2,405 км

Функции заинтересованных организаций на разработку проекта разделены следующим образом:

- Заказчик рабочего проекта и Администратор – ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области»
- Генпроектировщик – ТОО «КАТЭК».
- Генподрядная строительная организация определяется на тендерной основе.

Настоящий раздел организации строительства является основанием для разработки генподрядной строительно-монтажной организацией проекта производства работ (ППР).

Проект организации строительства (ПОС), представленный в данном разделе, является составной частью рабочего проекта и рассматривает технологию и организацию строительства проектируемых объектов.

Проектом предусматривается:

- строительство ВЛ–10 кВ до площадки ГРПб-Актау, ГРПб-Мустафина;
- электрохимзащита подземного подводящего газопровода высокого давления PN 1,2 МПа;
- строительство подъезда к площадке ГРПб-Актау, ГРПб-Мустафина, ГРП-1

Категория подъездных определена в соответствии со СН РК 3.01-01-2013 и СП РК 3.01-101-2013 табл.14.1; СН РК 3.03-01-2013 и СП РК 3.03-101-2013 табл.4.1.1 – IV-в. Тип дорожной одежды – переходного типа с покрытием из:

- ПГС, С1 по ГОСТ 25607-2009 – 0,30 м;
- Уплотненный грунт.

Характеристика участка приведена в таблице 3.1.1

Тип прокладки газопровода – подземный и надземный. Изоляция стальных труб – заводская.

Таблица 3.1.1 - **Характеристики проектируемых газопроводов**

№ № п/п	Категория газопровода	Рабочее давление, РН, МПа	Диаметр трубопров ода, DN мм	Место расположения, от начальной точки и до конечной точки газопровода	Протяже нность, км
1	Подводящий распределительный газопровод высокого давления	1,2	108, 325	АГРС-«Темиртау» - ГРПб- «Актау»	24,545
2	Газопровод-отвод на ГРПб- «Мустафина»	1,2	108, 325		14,670
3	Распределительный газопровод высокого давления	0,6	110		2,644
4	Распределительный газопровод среднего давления	0,3	63÷160		27,790
5	Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления	0,003	57÷273		90,7856
ИТОГО:					160,505

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

34/2021-06-04-ПОС

Лист
4

3.2 Общие положения строительства

Проект организации строительства разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РК в области строительного производства, промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности, охраны здоровья и охраны окружающей природной среды.

При проектировании и строительстве газопроводов использованы технические нормы и правила Республики Казахстан и межгосударственные нормы, и стандарты.

Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, регламентируемыми проектом и следующими нормативно-техническими документами:

СН РК 1.02-03-2011	Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство
СН РК 1.03-00-2011	Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений.
СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012	Охрана труда и техника безопасности в строительстве
СН РК 1.03-03-2013 и СП РК 1.03-103-2013	Геодезические работы в строительстве
СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013	Защита строительных конструкций от коррозии
СН РК 5.01-01-2013 и СП РК 5.01-101-2013	Земляные сооружения, основания и фундаменты
ГОСТ 21778-81 (СТ СЭВ 2045-79)	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения
ГОСТ 7512-82*	Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.
ГОСТ 14782-86	Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ	Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.013-78	Электробезопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.3.002-75*	Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.009-76*	Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.003-86*	Работы электросварочные. Общие требования безопасности.

Работы по строительству должны выполнять строительно-монтажные организации, имеющие соответствующую лицензию и II -категорию.

К работам по строительству, монтажу и эксплуатации опасных производственных объектов, ведению технического надзора за строительством допускаются лица, прошедшие аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности и технических регламентов, распространяющихся на строительство газопроводов и других нормативно-технических документов) в объеме, соответствующем должностным обязанностям и установленной компетенции, обученные безопасным методам работы, и

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	34/2021-06-04-ПОС					Лист
										5
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

инженерно-технические работники, имеющие соответствующую техническую подготовку, в том числе в соответствии с Требованиями Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, утв. Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года №354.

Сварщики перед допуском к сварке газопроводов и специалисты сварочного производства, осуществляющие руководство и технический контроль за проведением сварочных работ, должны быть аттестованы в установленном порядке и иметь специальные удостоверения на право сварки газопроводов данным способом.

На трубы, фасонные части, арматуру, сварочные и изоляционные материалы, применяемые в соответствии с проектом, должны иметься сертификаты заводов-изготовителей (или их копии, заверенные владельцем сертификата, удостоверяющие их качество).

На оборудование, узлы, соединительные детали должны иметься технические паспорта заводов-изготовителей, центрально-заготовительных заводов (ЦЗЗ) строительно-монтажных организаций.

На законченные строительством участки следует составлять исполнительно-техническую документацию. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов организации строительства и проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

3.3 Краткая характеристика условий осуществления строительства

Район строительства с точки зрения наличия рабочих кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных и железных дорог относится к освоенному.

Для нормальной эксплуатации машин и механизмов, работу по строительству газопроводов и надземных площадочных сооружений необходимо организовать в 1 смену.

Доставка рабочих к месту работы и обратно организовывается транспортом подрядчика, доставка машин и механизмов осуществляется с эксплуатационной базы.

Для подъезда к участку проведения работ по строительству предусматривается максимальное использование существующих автодорог с устройством съездов.

Условия прохождения трассы газопроводов

Проектируемый подводящий газопровод от точки присоединения существующего стального тройника на газопроводе от АГРС – «Темиртау»- проходит по землям администрации г. Темиртау через п. Актау по территории Бухар-Жырауского района в п. Г. Мустафина. Проектируемая трасса газопровода проложена по землям сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, вдоль автодороги "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы, через Костанай, Нур-Султан, Караганда" М-36 и автомобильной дороги Бастау-Актау-Темиртау – Р-37.

От существующего тройника газопровода от АГРС «Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» трасса подводящего газопровода высокого давления РН 1,2 МПа на протяжении 24,545 км идет в северо-восточном направлении вдоль автодороги «Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы, через Костанай, Нур-Султан,

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Подп. и дата	Ине. № подл.						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС			6					

Караганда" М-36 и автомобильной дороги Бастау-Актау-Темиртау – Р-37. в направлении п.Актау, где устанавливается головной пункт редуцирования газа ГРПб-«Актау» в пределах следующих абсолютных высот 499,08м в БС - 500,34м в БС, с отводом на ГРПб-Мустафина.

По трассе газопровода высокого давления РН 1,2 МПа протяженностью 24,545 км на участках устройства площадок складирования грунта стесненность отсутствует.

Распределительные сети газоснабжения высокого давления РН 0,6 МПа от ГРПб-«Актау» до ГРП-1 обеспечивают подачу природного газа в распределительные газопроводы среднего давления РН 0,3 МПа. Сети газоснабжения высокого давления прокладываются по территории с абсолютными отметками 501,99÷500,78 м БС.

Распределительные сети газоснабжения среднего давления РН 0,3 МПа от ГРП-1, ГРП-2 обеспечивают подачу природного газа во внутриквартальные газопроводы низкого давления РН 0,003 МПа через групповые ГРПШ-1÷13 и ШРП-1÷14, а также подачу газа коммунально-бытовым потребителям. Внутрипоселковые сети газоснабжения прокладываются по территории с абсолютными отметками 502,38÷512,58 м БС.

Распределительный газопровод-отвод высокого давления РН 1,2 МПа на ГРПб- Мустафина протяженностью 14,670 км идет в восточно-южном направлении вдоль автодороги Бастау-Актау-Темиртау – Р-37.в направлении п. г. Мустафина, где устанавливается головной пункт редуцирования газа ГРПб-Мустафина.

По трассе газопровода-отвода высокого давления РН 1,2 МПа протяженностью 14,670 км на участках устройства площадок складирования грунта стесненность отсутствует.

Распределительные сети газоснабжения среднего давления РН 0,3 МПа от ГРПб-Мустафина обеспечивают подачу природного газа во внутриквартальные газопроводы низкого давления РН 0,003 МПа через групповые ГРПШ-1÷11 и ШРП-1÷9, а также подачу газа коммунально-бытовым потребителям. Внутрипоселковые сети газоснабжения прокладываются по территории с абсолютными отметками 494,28÷495,92м БС.

В границах населенного пункта газопроводы проложены в стесненных условиях при наличии:

- жилых зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;
- интенсивного движения транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;
- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске;
- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

В геоморфологическом отношении трасса проектируемого газопровода характеризуется своеобразием рельефа и геологических условий.

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Ине. № подп	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС		7

Большая часть территории района занимает Казахский мелкоопочник. Рельеф — мелкоопочная равнина (абсолютная высота 500—700 м). Самая высокая точка гора Семизбугы (1049 м). Рельеф участка относительно ровный. Местность представляет собой слабо холмистую равнину, местами изрезанную оврагами и промоинами.

Переходы газопроводов через следующие коммуникации предусмотрены закрытым способом, методом ГНБ:

- газопровод высокого давления РН 1,2 МПа через реку Нура и автомобильную дорогу Республиканского значения М-36;
- газопровод высокого давления 0,6 МПа через автомобильную дорогу Республиканского значения Р-37, железные дороги АО «НК «КТЖ» и АО «САС»;
- газопровод среднего давления 0,3 МПа через железную дорогу АО «НК «КТЖ».

Прокладка подводящего газопровода на ГРПб-Актау и газопровода-отвода на ГРПб-«Мустафина» и распределительных газопроводов выполняется подземно, на глубине не менее 0,8 м до верха трубы.

Для определения местонахождения трассы газопровода на углах поворота устанавливаются опознавательные знаки. Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м.

Поставка материалов на трассу осуществляется по существующим автомобильным дорогам.

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки:

Климатический район: IVГ

Среднегодовая температура: «плюс» 3,7°C, абсолютная минимальная температура зимой: «минус» 42,9 °C, абсолютная максимальная температур летом: «плюс» 40,2 °C, средняя температура наиболее холодной пятидневки: «минус» 32,6 °C, средняя температура наиболее холодного месяца (январь): «минус» 13,6 °C, средняя температура за отопительный период: «минус» 5,6 °C. Продолжительность отопительного периода (суток): 206.

Нормативная ветровая нагрузка: 0,48кПа – IV ветровой район. Нормативная снеговая нагрузка: 1,0 кПа - III снеговой район.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль: Ю, преобладающее направление ветра за июнь-август: С, СВ. Нормативная глубина промерзания грунтов, м: суглинки – 1,26 м.

Таблица 3.3.1 - Строительная категория грунтов

№ п/п	Наименование и краткая характеристика грунтов	Группа грунтов при разработке	
		одноковшовым экскаватором	вручную
1	Суглинок (29а)	2	2
2	Насыпной грунт	4	4

Полоса отвода для строительных работ

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № подл					Лист
						34/2021-06-04-ПОС				8
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Для ведения строительных работ по укладке трубопровода по проекту выделены земельные участки:

Таблица 3.3.2 - Основные показатели по отводу земельных участков в границах г. Темиртау на период строительства, м²/га

Наименование показателей	Площадь земельных участков в границах, мхм	ИТОГО:
Подводящий газопровод высокого давления РН 1.2, D _н 325х8 мм	2870х16	44815/4,4815
Лесной фонд	7692х16	123072/12,3072
ИТОГО:		167887/16,7887

Таблица 3.3.3 - Основные показатели по отводу земельных участков в границах Бухар-Жырауского района на период строительства, м²/га

Наименование показателей	Площадь земельных участков в границах, мхм	ИТОГО:
Газопровод высокого давления РН 1.2 МПа до ГРП "Актау" D _н 325х8 мм	13200х16	210957/21,0957
ИТОГО:		210957/21,0957

Таблица 3.3.4 – Основные показатели по отводу земельных участков в границах п. Актау, м²/га

Наименование показателей	Площадь земельных участков в границах	ИТОГО:
Газопровод высокого давления РН 1.2МПа до ГРП "Актау" D _н 325х8 мм	630 х16	10132/1,0132
Газопровод высокого давления РН 1.2МПа до ГРП "Мустафина" D _н 325х8 мм	4200х16	67200/6,720
Газопровод высокого давления РН 0.6МПа от ГРП "Актау" до ГРП-1, в том числе ВЛ 10кВ к ГРП "Актау" D _н 110х10 мм	2644х16	42304/4,2304
Газопровод среднего давления D _н 63-110 мм	13390х2	26780/2,6780
Газопровод низкого давления D _н 57÷273мм	43530х2	87060/8,7060
ИТОГО:		233476/23,3476

Таблица 3.3.5 – Основные показатели по отводу земельных участков в границах п. Г. Мустафина, м²/га

Наименование показателей	Площадь земельных участков в границах	ИТОГО:
Газопровод высокого давления РН 1.2МПа до ГРП "Мустафина" D _н 325х8 мм	10470х16	167520/16,752

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Лист	9
34/2021-06-04-ПОС						Лист	9
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата			

Газопровод среднего давления Дн63-110 мм	14400x2	28800/2,8800
Газопровод низкого давления Дн57÷273мм	42730x2	85460/8,5460
ВЛ 10кВ к ГРП "Мустафина"	408x8	3120/0,3120
ИТОГО:		284900/28,4900

Заказчик предоставляет Подрядчику непрерывную полосу земельного отвода по всей длине намеченных трасс газопроводов. Для выполнения строительных работ без перебоев по всей длине трассы, Заказчик заблаговременно предоставляет Подрядчику доступ к полосе отвода.

До начала работ по расчистке площадки, Подрядчик знакомится со всеми положениями, принятыми Заказчиком в отношении земли и соглашениями в отношении землеотвода. Подрядчик приложит все усилия для соблюдения таких положений и избежание нанесения ущерба растительному покрову для сохранения окружающей природной среды.

3.4 Основные решения по организации работ

Основные мероприятия общей организационно-технической подготовки строительства выполняют заказчик, генподрядная и субподрядные строительные организации.

При организации строительного производства на площадке строительства рекомендуется образовать штаб стройки, в функции которого входит обеспечение:

- согласованной работы всех участников строительства объекта с координацией их деятельности по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников независимо от их ведомственной подчиненности;
- комплексной поставки материальных ресурсов в сроки, предусмотренные календарными планами и графиками работ;
- выполнения работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения;
- соблюдения правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- соблюдения требований по охране окружающей природной среды.

Подготовка строительства составляет ≈15-20% сметной стоимости, трудоемкости и продолжительности строительства объекта.

Организация строительного производства включает решение следующих основных вопросов:

- обеспечение стройки проектно-сметной документацией;
- оформление финансирования строительства;
- заключение договоров подряда и субподряда на строительство;
- оформление разрешений и допусков на производство работ;
- обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водоснабжением, системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров строителей;
- организация поставки на строительство труб, оборудования, материалов и готовых изделий;

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Ине. № инв.	Подп. и дата	Ине. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС	Лист
						10

- разработка проектов производства работ Генподрядной организацией.

При штабе создается система оперативно-диспетчерского управления (СОДУ), основной задачей которой является осуществление постоянного контроля за выполнением графиков производства работ на объектах и графиков обеспечения их материальными ресурсами, средствами механизации, автотранспорта и т.п.

Основные функции СОДУ:

- Анализ и обобщение поступающей оперативной информации о ходе строительства.
- Обеспечение постоянного взаимодействия всех участников строительства путем совместного решения возникающих оперативных вопросов.
- Взаимодействие с диспетчерской службой субподрядчиков.

Организация строительства

В этот период Заказчик совместно с Генподрядчиком и районным акимом решают вопросы:

- обустройства площадки приемки строительных грузов, обеспечивающих складирование и временное хранение поступающих грузов с производственной базы подрядчика;
- схемы транспортировки грузов от производственной базы до строительной площадки;
- обеспечения строительства водой на хоз-питьевые и производственные нужды;
- энергоснабжения строительства;
- обеспечения строителей продуктами питания;
- медицинского обслуживания работников-строителей на объекте;
- разработки мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций (пожар, авария);
- организации контроля качества работ по проведению реконструкции (Генподрядчиком и Заказчиком).

Кроме этого, Генподрядчик решает непосредственно вопросы по:

- комплектации рабочими и ИТР;
- комплектации строительных бригад и звеньев машинами и механизмами;
- организации строительства;
- обеспечению охраны труда и пожарной безопасности.

Мобилизационный и подготовительный периоды строительства

Подготовительный период рекомендуется разделить на три этапа:

- организационный;
- мобилизационный;
- подготовительно-технологический.

В организационный этап рассматривается и оформляется техническая, организационная и финансовая документация, необходимая для строительства. Строительная организация утверждает:

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Подп. и дата	Ине. № подл.						Лист 11	
Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Подп. и дата	Ине. № подл.	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС	

- календарный план строительства;
- сроки начала и окончания строительства;
- сроки развертывания технологических бригад;
- графики материально-технического и ресурсного обеспечения комплекса строительства.

Работы организационного периода должны быть выполнены до начала строительно-монтажных работ.

В организационный период проводится:

- рассмотрение и приемка утвержденной ПСД;
- открытие финансирования строительства;
- окончательное определение Подрядчика и заключение договора подряда;
- определение источников поставок материальных ресурсов, получение фондов и размещение заказов на оборудование, изделий и материалов по номенклатуре заказчика;
- решение вопросов использования на период строительства существующих автомобильных дорог;
- обеспечение энергетическими ресурсами от действующих источников и сетей;
- разработка проектов производства работ (ППР).

Основанием для начала строительства является наличие следующих документов:

- утвержденного рабочего проекта и сводной сметы;
- утвержденных рабочих смет по рабочим чертежам;
- разрешения всех заинтересованных соответствующих ведомств и эксплуатационных служб на право выполнения СМР;
- оформление финансирования;
- оформление договоров подряда-субподряда.

Организационно-техническая подготовка включает: обеспечение стройки проектно-сметной документацией, отвод в натуре площадки под трассу газопровода и площадок под сооружения газопровода для строительства, оформление финансирования строительства, заключение договоров подряда и субподряда на строительство, обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- снабжением, системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров строителей, организацию поставки на строительство оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий.

В процессе сдачи-приемки стройплощадки генподрядчику, Заказчик передает документы на отвод земельных участков на период строительства.

Мобилизационный этап

В мобилизационный период выполняются работы по созданию социальной и технической базы генподрядчика:

- обустривается производственная база строителей, имеющая в своем составе:
 - бытовое и административное помещение, совмещенное с медпунктом, раздаточную столовую;
 - производственный участок с площадкой для складирования трубных плетей и оборудования;

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Ине. № подл.						Лист 12
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС						

- 2) Разбивка технологических осей, состоящая в разбивке и закреплении монтажных (технологических) осей для установки в проектное положение конструкций перехода.
- 3) Построение геодезической сетки в натуре по СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
- 4) Все геодезические работы должны выполняться в строгом соответствии с СН РК 1.03-03-2013 и СП РК 1.03-103-2013 «Геодезические работы в строительстве».

Снабжение строительства материалами

Трубы, оборудование, строительные машины и механизмы, строительные материалы от складов Генподрядчика автотранспортом поступают на производственные участки.

Обеспечение строительства инертными (ПГС, песок) материалами предусматривается с доставкой из карьеров, расположенных на расстоянии не более 30 км, ж/б изделия привозные, доставляемые с заводов ЖБК или после изготовления заготовок в условиях производственных мастерских Подрядчика.

3.5 Продолжительность строительства

Нормативный срок строительства по пусковым комплексам (таблица 3.5.1-3.5.4) определен в соответствии с главой 9.2 Коммунальное хозяйство СП РК 1.03-102-2014, на основании таблицы Б.5.2.1, п. 30 Распределительная газовая сеть последовательным выполнением работ подготовительного и основного периода строительства с совмещением работ

Таблица 3.5.1 – Продолжительность строительства

Пусковой комплекс	Наименование	Ед. изм.	Объемы работ	Норма продолжительности строительства, мес.		Формула расчета
				общая	в т.ч подготовительный период	
1-пусковой комплекс						
1	Подводящий газопровод высокого давления РN 1,2 МПа СТ Дn325x8 мм, Дn108 мм	км	24,430	11,4	0,5	Определена методом экстраполяции: (8,5 мес. * (корень куб (24.545 км по проекту/10 км норм.)
	Распределительный газопровод высокого давления РN0,6 МПа ПЭ Дn110	км	2,644	1,4	0,2	((1,5 мес. -1 мес. норм.)/(3 км норм. -1 км норм.)*(2,644 км принятые в проекте - 1 км норм.)+1 мес)
	Распределительные сети газоснабжения среднего и низкого давления РN0,3 МПа ПЭ Дn63-110	км	18,710	5,2	0,5	Определена методом экстраполяции: (3,5 мес. * (корень куб (18,710 км по проекту/10 км норм.)*1,2 коэф-т п.6 в услов. благоустроен. улиц
	Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления РN0,003 МПа СТ Дn57x3,0÷273x6 мм	км	11,532	8,9	0,5	Определена методом экстраполяции: (8,5 мес. * (корень куб (11,417 км по проекту/10 км норм.)*1,2 коэф-т п.6 в услов. благоустроен. улиц
	Продолжительность строительства по 1-пусковому комплексу, мес			17		T=T _{макс} +(T ₁ +T ₂ +T ₃ +T ₄)*K, T=11,4+(1,4+5,2+8,9)*0,35=17 мес
Протяженность газопроводов 1-пусковой комплекс, км			57,316			

Ине. № подп.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Наименование	Ед. изм.	Объем ы работ	Норма продолжительности строительства, мес.		Период строительства								Период строительства											
			общая	в т.ч подготов ительны й период	2023								2024											
					6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3 пусковой комплекс																								
Газопровод- отвод на п. «Г. Мустафина» высокого давления PN 1,2 МПа СТ DN325x8 мм	км	14,610	9,6	0,5																				
Распределительные сети газоснабжения среднего и низкого давления PN0,3 МПа ПЭ DN63÷160	км	60,783	7,7	0,5																				
Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа СТ DN57	км	2,465	2,1	0,2																				
Продолжительность строительства по 3-пусковому комплексу, мес			14		6										4									
Протяженность газопроводов 3-пусковой комплекс, км			77,86																					
Продолжительность с учетом совмещения сроков строительства, мес			12,00		6								6											

Таблица 3.5.3 – Принятая продолжительность строительства по пусковым комплексам, мес

Принятая продолжительность строительства	12 мес
--	--------

Таблица 3.5.4 - Нормы задела в строительстве по кварталам, в % от сметной стоимости в соответствии со строкой 30 «Распределительная газовая сеть» таблицы Б.5.2.1 и табл.Б.5.7.1 Городские уличные сети водо-газоснабжения и канализации СП РК 1.03-102-2014

Общая продолжительность с учетом совмещения сроков строительства по - 12мес

Задел по капитальным вложениям определен по формуле:

$$K'_n = K_{n_n} + \frac{(K_{n_{n+1}} - K_{n_n})\alpha_n \times 3}{m}$$

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

34/2021-06-04-ПОС

Наименование	Ед. изм.	Объемы работ	Норма продолжительности строительства, мес.		Период строительства								Период строительства											
			общая	в т.ч. подготовительный период	2023								2024											
					6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 пусковой комплекс																								
Подводящий газопровод высокого давления PN 1,2 МПа СТ Дн325х8 мм, Дн108 мм	км	24,430	11,4	0,5	10	15	20	37	50	64	Технологический перерыв			70	87	90	93	98	100					
Распределительный газопровод высокого давления PN0,6 МПа ПЗ Дн110	км	2,644	1,4	0,2	98	100																		
Распределительные сети газоснабжения среднего и низкого давления PN0,3 МПа ПЗ Дн63-110	км	18,710	5,2	0,5	15	37	64	87	98	100														
Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления PN0,003 МПа СТ Дн57х3,0+273х6 мм	км	11,532	8,9	0,5	5	15	37	64	87	90				93	98	100								
Продолжительность строительства по 1-пусковому комплексу, мес			17		6										6									
Протяженность газопроводов 1-пусковой комплекс, км			57,32																					
2 пусковой комплекс																								
Внутриквартальные сети газоснабжения среднего и низкого давления PN0,003 МПа ПЗ Дн63+110	км	23,636	5,6	0,5	15	37	64	87	98	100	Технологический перерыв													
Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа СТ Дн57	км	1,695	1,6	0,2	98	100																		
Продолжительность строительства по 2-пусковому комплексу, мес			6		6																			
Протяженность газопроводов 2-пусковой комплекс, км			25,33																					
3 пусковой комплекс																								
Газопровод- отвод на п. «Г. Мустафина» высокого давления PN 1,2 МПа СТ Дн325х8 мм	км	14,610	9,6	0,5	10	15	20	37	50	64	Технологический перерыв			87	93	98	100							
Распределительные сети газоснабжения среднего и низкого давления PN0,3 МПа ПЗ Дн63+160	км	60,783	7,7	0,5	10	15	37	64	87	93				98	100									
Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа СТ Дн57	км	2,465	2,1	0,2				93	98	100														
Продолжительность строительства по 3-пусковому комплексу, мес			14		6										4									
Протяженность газопроводов 3-пусковой комплекс, км			77,86																					
Продолжительность с учетом совмещения сроков строительства, мес			12,00		6										6									

3.6 Основной период строительства и методы производства работ

Отдел производственно-технологической комплектации

Для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности строительства формируется подразделение производственно-технологической комплектации.

В состав подразделения входят бригады по перевозке строительных грузов на трассу:

- бригада по обеспечению строительства строительными материалами, изделиями и оборудованием, перевозка труб с железнодорожной станции на трассу;
- бригада по обеспечению – технической и питьевой водой, горюче-смазочными материалами;
- бригада по обеспечению продуктами питания.

Подразделение комплектуется подъемно-транспортными механизмами, приспособлениями: кранами, бортовыми автомашинами.

Состав подразделения – до 10 чел.

Организация строительного-монтажных работ должна предусматривать поточный метод осуществления технологических операций.

В соответствии с Таблицей 6 гл.9.2 СП РК 1.03-102-2014 строительство проектируемых газопроводов организуется в 1 поток.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

34/2021-06-04-ПОС

Лист
17

Строительство выполняется механизированными комплексами с определенной структурой машинооснащения и численным составом.

Процесс строительства включает: подготовительные (подготовка строительной полосы), погрузочно-разгрузочные работы по транспортировке и складированию труб и изделий, земляные работы, сварочно-монтажные работы, испытания трубопровода, обеспечение качества СМР, мероприятия по охране труда и технике безопасности, охране окружающей природной среды.

Перевозка строительных грузов (вывоз строительного мусора, излишек грунта разрабатываемых траншей) осуществляется самосвалами грузоподъемностью 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки - 30 км.

3.6.1 Подготовительные работы

Подготовительные работы к производству строительного-монтажных работ включают:

- создание геодезической разбивочной основы;
- входной контроль (верификация) проектной (рабочей) документации, труб и соединительных деталей, технических устройств, материалов и изделий, и по его результатам составлены документы, подтверждающие их пригодность в строительстве;
- подготовку строительной полосы.

При подготовительных работах должно проверяться соблюдение установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов и технических устройств. В случае, если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил (например: хранение при более низких или более высоких температурах, предусмотренных технической документацией; отсутствие прокладок между трубами при укладке их штабелями; недопустимая высота штабеля и т.п.), применение для строительства материалов и технических устройств, хранившихся с нарушением и имеющих при этом истекший гарантийный срок эксплуатации, не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей их качества требованиям проектной (рабочей) документации, документации в области технического регулирования и стандартизации.

Создание геодезической разбивочной сети

Геодезическая разбивочная сеть для строительства газопровода создается в виде линий, параллельных трассам, с расположением их в местах, где обеспечивается их долговременная сохранность, с привязкой к имеющимся в районе строительства пунктам государственных геодезических сетей, пунктам сетей, имеющих координаты и отметки в местной системе координат или к постоянным ориентирам.

Плановые (осевые) знаки, определяющие ось трассы газопровода, устанавливаются:

- в начале и конце трассы газопровода;
- на углах поворота трассы газопровода;
- на прямолинейных участках в пределах их видимости, но не реже чем через 500 м;
- в местах установки отключающих устройств, средств электрохимической защиты и других сооружений;

Ине. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС					18

- на переходах через естественные и искусственные преграды;
- в местах пересечения с существующими сетями инженерно-технического обеспечения;
- в местах разработки котлованов при бестраншейной прокладке газопроводов;
- в местах входа (выхода) газопровода из земли.

В результате геодезических разбивочных работ должны быть оформлены разбивочные чертежи, каталоги координат и отметок исходных пунктов, каталоги проектных и фактических координат и отметок, чертежи геодезических знаков.

Разбивочные работы в процессе строительства предусматривают вынос в натуру осей газопровода от пунктов геодезической разбивочной сети оси газопровода. Перед выполнением разбивочных работ исполнитель должен проверить неизменность положения знаков, определяющих местоположение трассы газопровода, путем повторных измерений элементов сети.

Входной контроль (Верификация)

Входной контроль (верификация) включает в себя:

- входной контроль (верификация) проектной (рабочей) документации;
- входной контроль (верификация) геодезической разбивочной сети;
- входной контроль (верификация) труб, соединительных деталей, технических устройств, изделий и материалов.

Входной контроль (верификация) представленной проектной документации

При входном контроле (верификации) представленной проектной документации проверяются:

- комплектность проектной документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;
- наличие положительного заключения вневедомственной экспертизы;
- наличие в исходных данных пояснительной записки проектной документации копии технических условий заинтересованных организаций, правоустанавливающих документов на отвод земельных участков для строительства;
- наличие утверждения проектной документации заказчиком;
- наличие в проектной документации ссылок на ГОСТ и Технические условия на технические устройства и материалы;
- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров, приведенной в проектной (рабочей) документации;
- наличие разрешительных документов на материалы, изделия и технические устройства;
- техническая оснащенность и технологические возможности организации при выполнении работ в соответствии с проектной (рабочей) документацией;
- достаточность состава перечня актов освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных строительных конструкций.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Подп. и дата	Ине. № подл.					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС			Лист	19			

Проектная документация должна быть допущена к производству работ заказчиком с подписью ответственного лица путем постановки штампа на каждом листе

Входной контроль (верификация) представленной геодезической разбивочной сети

Представленная геодезическая разбивочная сеть проверяется на соответствие установленным требованиям к точности построения и измерения, надежности закрепления знаков на местности согласно СН РК 1.03-03-2013 и СП РК 1.03-103-2013.

Знаки геодезической разбивочной сети для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления в натуре должны соответствовать предоставленной технической документации.

Геодезический контроль точности геометрических параметров разбивочных работ выполняется двойными измерениями и заключается:

- в инструментальной проверке согласно СН РК 1.03-03-2013 и СП РК 1.03-103-2013;
- в исполнительной геодезической съемке по ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения».

При входном контроле (верификации) геодезической разбивочной сети следует провести рекогносцировочные работы, при которых проверяется соответствие фактического размещения зданий и сооружений с приведенным в отчете по инженерным изысканиям. В случае выявления несоответствий, на чертежи проектной (рабочей) документации следует нанести выявленные уточнения в съемке и направить заказчику для подтверждения намеченной трассы или внесения в нее изменений. По результатам контроля составляется акт приемки геодезической разбивочной сети.

Входной контроль труб (верификация), соединительных деталей, технических устройств, изделий и материалов

При входном контроле (верификации) должна быть проведена проверка:

- на соответствие проектной документации поставляемых на строительную площадку труб, соединительных деталей и технических устройств;
- наличия сертификатов качества на трубы и соединительные детали, на технические устройства – сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза или иная форма соответствия (заключение экспертизы промышленной безопасности), согласно законодательству РК, если иная форма оценки соответствия технического устройства не установлена;
- соответствия труб, соединительных деталей, технических устройств условным обозначениям, указанным на них;
- наружных диаметров, толщин стенок.

Лицом, осуществляющим строительство трубы при входном контроле (верификации) (приемке), разбраковке и освидетельствовании проверяют:

- все трубы - на соответствие сортамента, ГОСТ и Технических условий проектной документации;

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Подп. и дата	Ине. № подл.						Лист
													20
								34/2021-06-04-ПОС					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата									

- *стальные - на соответствие указанных в сертификатах качества показателей химического состава и механических свойств металла Техническим условиям или ГОСТ;*
- *полиэтиленовых на соответствие указанных в паспортах качества (сертификатах) механических свойств и овализации.*

Визуальным контролем проверяют:

- *маркировки и соответствие ее имеющимся сертификатам (паспортам);*
- *отсутствие недопустимых вмятин, задигов и других механических повреждений, металлургических дефектов и коррозии;*
- *отсутствие на торцах забоин, вмятин, наличие разделки под сварку;*

Инструментальным контролем с помощью измерительных приборов (штангенциркуль, линейка, рулетка) проверяют:

- *толщину стенки по торцам;*
- *овальность по торцам;*
- *кривизну труб;*
- *косину реза торцов труб;*
- *отсутствие расслоений на концевых участках труб;*
- *размеры обнаруженных забоин, рисок, вмятин на теле и на торцах.*

Трубы считаются пригодными при условии, что:

- *они соответствуют требованиям Технических условий и ГОСТ на поставку и имеют заводскую маркировку и сертификаты;*
- *отклонения наружного диаметра:*
 - a) *стальных труб на длине не менее 200 мм от торца не превышают для труб номинальным диаметром до DN 800 включительно предельных величин, регламентируемых соответствующими ГОСТ и техническими условиями, а для труб номинальным диаметром свыше DN 800 - ± 2 мм;*
 - b) *полиэтиленовых труб соответствуют указанным в ГОСТ;*
- *отклонения толщины стенки по торцам не превышают предельных значений, регламентируемых соответствующими ГОСТ и Техническими условиями.*
- *Толщину стенки трубы измеряют микрометром с обоих концов трубы с погрешностью не более 0,01 мм в четырех равномерно распределенных по окружности точках;*
- *Овальность полиэтиленовых труб соответствует указанной в проектной документации;*
Овальность труб определяют микрометром или штангенциркулем.
- *кривизна стальных труб не превышает 1,5 мм на 1 м длины, а общая кривизна - не более 0,2% длины трубы;*
- *косина реза торцов труб не превышает 2,0 мм;*

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Ине. № подл.	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС	
						21

- на концевых участках труб отсутствуют расслоения любого размера, выходящие на кромку или поверхность трубы;
- глубина царапин, рисок и задиров на поверхности труб (деталей, арматуры) не превышает 0,2 мм; на теле и на торцах трубы отсутствуют вмятины;
- в местах, пораженных коррозией, толщина стенки трубы не выходит за пределы минусовых допусков.

Входной контроль (верификация) соединительных деталей выполняется аналогично трубе.

Контроль изолированных в заводских или базовых условиях труб производится специальной лабораторией, укомплектованной необходимыми приборами, оборудованием, методиками испытаний.

Основными контролируемыми параметрами являются:

- толщина покрытия;
- диэлектрическая сплошность;
- адгезия покрытия к трубе;
- прочность покрытия при ударе и другие параметры, предусмотренные ГОСТ 9.602.

Качество изоляционного покрытия определяют внешним осмотром, адгезию к стали контролируют приборным методом (адгезиметром), сплошность покрытия – приборным методом неразрушающего контроля (дефектоскопом), ударную прочность – с помощью ударного приспособления согласно ГОСТ Р 51164.

Контроль адгезии необходимо осуществлять на 2% труб, а также в местах, вызывающих сомнение при нанесении изоляционного покрытия в заводских или базовых условиях и всех изолируемых участков в трассовых условиях.

При входном контроле (верификация) запорной арматуры необходимо проверять:

для стальной арматуры:

- наличие эксплуатационной документации, подтверждающей проведение заводом-изготовителем испытаний на прочность и герметичность, а также паспорта на стальную арматуру;
- соответствие климатического исполнения требованиям ГОСТ 15150 и проектной документации;
- соответствие ГОСТ 4666 маркировки и отличительной окраски, ее назначению, материалу, а также наличие стрелки, указывающей направление движения продукта;
- комплектность (наличие ответных фланцев и крепежных деталей специального назначения);
- плавность и легкость хода шпинделя и запорных устройств, затяжку сальников;
- наличие заглушек на проходных отверстиях и уплотнительных поверхностях фланцев и отсутствие повреждений уплотнительных поверхностей;
- наличие на фланцах отверстий под болты и шпильки;
- отсутствие трещин на корпусах и крышках;
- дополнительно для полиэтиленовой арматуры - наличие паспорта.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.						Лист 22
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС						

- b) марку флюса;
- c) номер партии;
- d) массу партии;
- e) результаты химического анализа;
- f) дату изготовления;
- g) обозначение стандарта на флюс.

Контроль качества электродов, проволоки и флюсов, а также допуски контролируемых параметров должны соответствовать требованиям ГОСТ 9466, ГОСТ 2246, ГОСТ 9087.

При контроле узлов и изделий ЭХЗ заводского изготовления и отдельных блоков следует проверять:

- соответствие оборудования, изделий и материалов проектной документации, ГОСТ или Техническим условиям;
- наличие на изделия заводского изготовления соответствующих сертификатов, технических паспортов, удостоверяющих качество оборудования, изделий и материалов;
- отсутствие дефектов на оборудовании, материалах и т.п.

Изоляционные материалы (грунтовки, битумные мастики, рулонные изоляционные, армирующие и защитные материалы) должны проходить входной контроль (верификацию) на соответствие требованиям ГОСТ и Технических условий.

По результатам входного контроля (верификации) составляется заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняется журнал учета результатов входного контроля.

Подготовка полосы отвода

После приемки представленной документации проводятся следующие подготовительные работы:

- разработка ППР на основе раздела ПОС при его наличии;
- обустройство строительных площадок бытовыми зданиями, оборудованными гардеробами, санитарно-техническими узлами. При строительстве газопроводов вне территории поселений бытовые здания рекомендуется заводского изготовления по возможности ближе к месту строительно-монтажных работ. При строительстве газопроводов на территории поселений, допускается использовать передвижные фургоны;
- устройство навесов и строительство закрытых складов для хранения изделий, материалов, технических устройств, на которые влияют атмосферные осадки, солнечные лучи и т.п. Подготовка складских площадок к приему строительных материалов, изделий и технических устройств. Площадки располагают в местах удобных для подъезда транспорта, кранов. Они должны быть спланированы и защищены от затопления поверхностными водами и максимально приближены к месту производства строительно-монтажных работ;
- расчистка полосы отвода для прокладки газопровода, выполняется в соответствии с ППР (в пределах границ полосы отвода земли на период строительства). Ширина расчистки территории должна обеспечивать рабочую зону для строительства, достаточную для размещения

Ине. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Ине. № подл	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС	
					24	

землеройных машин, строительных материалов, трубоукладчиков и т.д. На территориях, занятых зелеными насаждениями производится валка и разделка стволов, уборка пней и кустарников, очистка растительного слоя от корней. Вырубка и пересадка зеленых насаждений должна производиться в соответствии с законодательством РК;

- разметка контуров траншеи и котлованов производится посредством забивки колышков по границам траншеи и котлованов в характерных точках, в местах изменения ширины траншеи, на прямых участках не реже 50 м. При прохождении трассы газопровода под усовершенствованными покрытиями производится разметка границ вскрытия дорожных покрытий. Асфальтобетонные покрытия тротуаров разбираются путем вырубки или взламывания его и вывозки для последующей переработки. Цементно-бетонные покрытия и основания под покрытия разламываются бетоноломными машинами с вывозкой бетонного лома;
- устройства ограждений строительной площадки, установка предупредительных знаков в пределах видимости, но не реже 50 м. В местах интенсивного движения транспорта и пешеходов на ограждении должны быть установлены красные фонари.

Места складирования материалов, если они вынесены за общее ограждение, также ограждаются. Ограждают деревья и кустарники, расположенные в полосе строительства. Ширина ограждаемой полосы строительства определяется в ППР в зависимости от ширины рабочей зоны.

Размер строительной полосы, места складирования материалов и изделий (труб, фасонных частей, арматуры и т.п.), потребность в основных строительных машинах и механизмах, их размещение на площадке строительства определяются в соответствии с разделом ППР.

Способы хранения труб на строительной площадке (в штабелях, пакетах и бухтах) должны исключать их повреждение и повреждение изоляционного покрытия.

Концы труб должны быть защищены заглушками, исключающими загрязнение внутренней полости трубы и попадания в нее посторонних предметов.

Полиэтиленовые трубы и соединительные детали к ним необходимо транспортировать и хранить в соответствии с ГОСТ Р 50838, ГОСТ 18599, ГОСТ 52779 и Техническими условиями.

Хранение стальных труб в штабелях осуществляется с применением мягких междурядных подкладок, прокладок и стоек с эластичными накладками и т.п. Нижний ряд каждого штабеля должен быть уложен на спланированную площадку, оборудованную инвентарными подкладками с устройствами (упорами), исключающими раскатывание труб.

Трубы укладываются «в седло» и закрепляются по рядам. Высота штабеля труб при укладке их «в седло» определяется в зависимости от числа рядов труб по формуле:

$$H = D (0,866 n + 0,134), \quad (3.1.6.1.1)$$

где H - высота штабеля труб, м; D - диаметр труб, м; n - число рядов труб.


Укладка в один штабель труб разного диаметра не допускается. Изолированные трубы должны укладываться в штабеля, отстоящие один от другого не менее чем на 1 м.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Лист
34/2021-06-04-ПОС						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Детали газопроводов и запорная арматура должны храниться в складских помещениях или под навесами (укрытиями). При хранении и транспортировании задвижек их затворы должны быть плотно закрыты, а при транспортировании кранов - находиться в открытом состоянии. Соединительные детали газопроводов рекомендуется транспортировать и хранить в специальных ящиках, контейнерах под навесом.

Ширина строительной полосы для проведения строительных работ зависит от диаметра газопровода и ширины улицы.

Зона строительной полосы и схема расположения строительной техники и отвалов при строительстве газопровода показана на схеме 3.1.6.1. Границы строительной полосы обозначаются хорошо определяемыми знаками, устанавливаемыми одновременно с пикетными знаками. Пересечения трассы газопровода с автодорогами, ЛЭП и другими пересечениями фиксируется специальными знаками, которые устанавливаются на оси трассы трубопровода.

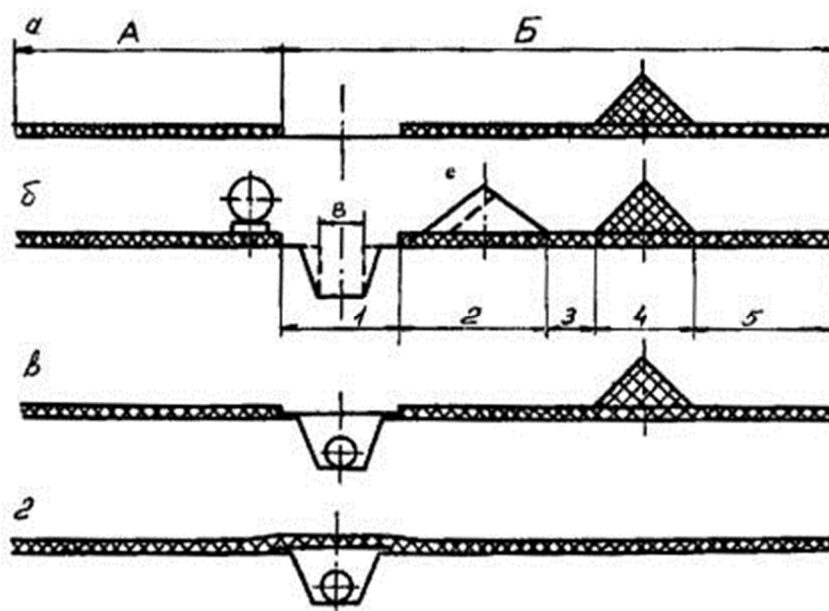

Диаметр трубопровода, мм	Параметры строительной полосы							
	Полоса монтажных работ А, м	Полосы земляных работ, м						
		1	2	3	4	5	Б	В
325 мм и менее	5	2	2	1,0	-	1,0	9,0	0,9-1,1

Схема 2.12.6.1 – **Последовательность операций земляных работ при строительстве трубопроводов:** А – полоса монтажных работ; Б – полоса земляных работ; В – ширина траншеи

В целях создания безопасных условий для работы и передвижения строительных и транспортных машин, перед началом разработки траншеи выполняется планировка трассы. Планировка трассы, включает срезку косогоров и бугров, склонов оврагов и балок при одновременной подсыпке низинных мест. Все работы по строительству должны быть ограничены полосой земельного отвода.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № инв.	Взам. инв. №
Ине. № дубл.	
Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № инв.	Взам. инв. №

Грунт, образующийся при планировке земли после снятия плодородного слоя, складывается на противоположном краю рабочей полосы. Работа должна быть выполнена посредством бульдозеров, экскаваторов.

После окончания работ по подготовке полосы отвода, подрядчик по строительству должен вновь выполнить разбивочные работы по выносу в натуру оси и характерных точек газопровода, а также границ полосы отвода.

При расчистке необходимо обеспечить стабильность грунта, защиту растительности и водных ресурсов. Трава, деревья и кусты, которые не подвергаются срезке, не должны иметь излишних повреждений. Там, где трубопровод пересекает культивируемую (земельную) собственность, ширина полосы отвода должна быть согласована с землевладельцем. Все работы по расчистке должны быть выполнены так, чтобы максимально уменьшить убытки, вызванные сооружением трубопровода.

В обязанности подрядчика входит вывоз из зоны строительства всех видов отходов и строительного мусора.

Временные сооружения должны располагаться за пределами охранных зон при проведении гидравлических испытаний участков трубопровода, место их расположения должно быть согласовано с землевладельцами и местными властями.

Подъездные дороги должны обеспечить свободное непрерывное движение строительных машин. Все дороги общего пользования, которые будут пересекаться или использоваться при маршрутном следовании техники подрядчика, должны быть незамедлительно очищены или восстановлены.

3.6.2 Строительство газопроводов в охранных зонах, полосах отвода других линейных сооружений и лесах

Строительство подземных газопроводов в пределах охранных зон должно осуществляться на основании технических условий, выданных заинтересованными организациями, и с учетом норм приведенных:

- в ПУЭ, устанавливающих охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства;
- в Правилах, устанавливающих охранные зоны для линий и сооружений связи и радиофикации;
- в Правилах, устанавливающих полосы отвода охранные зоны автомобильных дорог;
- в Положениях, устанавливающих требования при строительстве газопроводов в пределах водоохранных зон водных объектов.

Место расположения существующих подземных сооружений должно быть уточнено по всей длине при параллельной прокладке, в местах пересечения со строящимся подземным газопроводом и обозначено вешками высотой 1,5 - 2 м, которые устанавливаются на прямых участках трассы через 10 - 15 м у всех точек отклонений от прямолинейной оси трассы более чем на 0,5 м на всех поворотах трассы, а также на границах разрытия грунта, где работы должны выполняться ручным способом.

До обозначения трассы вешками и прибытия представителя предприятия, эксплуатирующего кабельную линию связи, проведение земляных работ не допускается.

Помимо вешек может быть установлен предупредительный знак.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Ине. № подл.						Лист 27
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС						

По результатам работы по уточнению местоположения подземных сооружений составляется акт. В акте должно быть указано, какие и в каком количестве вырыты шурфы, количество установленных вешек и предупредительных знаков.

Производители работ до начала работ в охранных зонах должны быть ознакомлены с расположением существующих трасс и подземных сооружений, их обозначением на местности и проинструктированы о порядке производства земляных работ ручным или механизированным способом, обеспечивающим сохранность сооружений.

Работы в охранных зонах должны выполняться в присутствии прораба или мастера.

Производство земляных работ должно выполняться после подготовительных работ территории трассы газопроводов. При выполнении работ должна быть обеспечена сохранность линейных объектов, в охранных зонах которых планируется выполнение работ.

Производство работ при пересечении с воздушными линиями АО «КЕГОС» на основании их письма за № 10-22-19/225 от 26.04.22г. выполнять в присутствии уполномоченного лица от филиала АО «КЕГОС», а также при наличии согласованного с филиалом АО «КЕГОС» проекта производства работ.

Земляные работы

Общие требования к земляным работам

Вертикальная планировка, разработка траншей под газопроводы и кабели ЭХЗ, а также котлованы при закрытом способе прокладки газопроводов и под сооружения на них, засыпка траншей после укладки газопроводов осуществляется в соответствии с ведомственными требованиями.

Особенности разработки траншей и котлованов

Временное крепление стенок траншей и котлованов должно выполняться в зависимости от глубины выемки, состояния грунта, гидрогеологических условий, величины и характера временных нагрузок на берме и других местных условий. Выбор вида крепления должен быть подтвержден технико-экономическим расчетом.

Установка креплений должна выполняться секциями после отрывки траншеи.

Котлованы глубиной не более 2 м, которые могут непродолжительное время оставаться открытыми, их стенки в большинстве случаев могут быть без крепления.

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см.

Работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения должны производиться с соблюдением требований, установленных организациями, эксплуатирующими эти сети инженерно-технического обеспечения, которые должны быть выполнены немедленно после вскрытия коммуникаций.

В случае выявленных несоответствий отметок подземных сетей инженерно-технического обеспечения вскрытых при разработке траншеи под газопровод, следует проверить геодезическую съемку и нанести

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						34/2021-06-04-ПОС	28
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							

на нее отметки дна траншеи и данных сетей инженерно-технического обеспечения и провести соответственно подсыпку или срезку грунта.

При обнаружении не указанных в проектной документации подземных сетей инженерно-технического обеспечения, работы должны быть приостановлены и возобновлены после согласования с владельцем сетей инженерно – технического обеспечения прокладки сетей газораспределения на данном участке и при необходимости внесения изменений в проектную документацию.

Разработку грунта в траншеях следует выполнять в два этапа (при узкой траншее и невозможности разместить в ней механизмы):

- механизированным способом на глубину 85% от глубины траншеи;
- без использования средств механизации до проектной отметки низа траншеи.

При разработке траншей следует исключить возможность подпора талых и поверхностных вод на участках, расположенных за пределами полосы отвода. При невозможности выполнения этого требования следует устраивать пропуски воды в отвалах грунта, в том числе специальные водопропуски (дюкеры). В случае попадания в траншею поверхностных вод следует предусмотреть их откачку на участки с пониженным рельефом с помощью насоса.

Прокладку кабеля ЭХЗ в земле, как правило, следует предусматривать механизированным способом при помощи кабелеукладчиков. В этом случае предварительного рытья траншеи не производят, так как кабелеукладчик выполняет эту работу одновременно с прокладкой кабеля.

При производстве земляных работ должны выполняться следующие меры безопасности:

- котлованы и траншеи, во избежание падения рабочих и посторонних лиц, должны быть ограждены с учетом ГОСТ 23407 и ГОСТ 12.4.059. Ограждения должны иметь предупредительные надписи и знаки, и сигнальное ночное освещение;
- для спуска рабочих в котлован траншеи должны применяться приставленные лестницы по ГОСТ 26887;
- землеройная техника должна устанавливаться на спланированной площадке;
- с целью безопасности не допускается нахождение персонала и рабочих в зоне действия землеройной техники в радиусе 5 метров от ее движущихся частей;
- во время перерыва в работе землеройной техники его рабочий орган следует застопорить, отвести в сторону от траншеи, и опустить на грунт.

За состоянием откосов и стенок траншей (котлованов), следует вести наблюдение, осматривая их перед началом каждой смены. При появлении трещин, осыпей, наличие треска в грунте нужно вывести рабочих из опасной зоны, выявить причины их появления и при необходимости принять меры против их обрушения. Аналогичные мероприятия следует проводить при выявлении деформаций креплений траншеи и котлована.

Особенности засыпки газопроводов

При засыпке газопровода необходимо обеспечить:

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Ине. № подл.						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС					29	

- сохранность труб и изоляции;
- плотное прилегание газопровода ко дну траншеи;
- проектное положение газопровода.

При засыпке газопровода должны быть исключены его подвижки. Рекомендуемые предельные отклонения и методы контроля при засыпке траншей и котлованов должны соответствовать требованиям СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы».

Засыпку траншеи с уложенными трубопроводами следует производить в три стадии:

- засыпка пазух немерзлым грунтом, не содержащим твердых включений;
- присыпка на высоту 0,2 м над верхом трубы тем же грунтом с подбивкой пазух с обеих сторон трубы;
- окончательная засыпка верхней зоны траншеи после предварительного испытания газопровода с равномерным послойным уплотнением до проектной плотности.

Грунт, используемый для создания постели и присыпки, не должен содержать мерзлые комья, щебень, гравий и другие включения размером более 50 мм в поперечнике.

Для создания подсыпки и присыпки возможно применять местный грунт (в частности, из отвала), если предварительно его просеять или подвергнуть сортировке с помощью грохота.

Стыки трубопроводов засыпаются после проведения предварительных испытаний газопроводов и составления протокола о положительных результатах испытаний.

Укладка, предусмотренной проектной документацией сигнальной ленты для газопроводов из полиэтиленовых труб и изолированного электропровода – спутника для полиэтиленового газопровода производится перед окончательной засыпкой на расстоянии 0,4 м от верха газопроводов.

До начала укладочных работ газопроводов и кабелей ЭХЗ производится устройство оснований под них из песка до проектных отметок или производится разравнивание основания траншеи в соответствии с проектными решениями.

Для полиэтиленовых газопроводов при температуре окружающего воздуха выше «плюс» 10°C окончательную засыпку следует производить в наиболее холодное время суток. При температуре окружающего воздуха ниже 10°C засыпку трубопроводов следует производить в самое теплое время суток.

Обратную засыпку траншеи следует выполнять с учетом рекомендуемых положений СП РК 4.03-101-2013.

Засыпку газопровода бульдозерами выполняют косопоперечными проходами с наращиванием отвала в траншеи с целью исключения динамического воздействия падающих комьев грунта на газопровод.

На горизонтальных участках поворота газопроводов вначале засыпается участок поворота, а затем остальная часть. Засыпку участка поворота начинают с его середины, двигаясь поочередно к концам.

На участках с вертикальными поворотами газопровода (в оврагах, балках, на холмах и т.п.) засыпку следует производить снизу вверх.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Укладка, предусмотренной проектной документацией сигнальной ленты для газопроводов из полиэтиленовых труб и изолированного электропровода – спутника для полиэтиленового газопровода производится перед окончательной засыпкой на расстоянии 0,4 м от верха газопроводов. До начала укладочных работ газопроводов и кабелей ЭХЗ производится устройство оснований под них из песка до проектных отметок или производится разравнивание основания траншеи в соответствии с проектными решениями. Для полиэтиленовых газопроводов при температуре окружающего воздуха выше «плюс» 10°С окончательную засыпку следует производить в наиболее холодное время суток. При температуре окружающего воздуха ниже 10°С засыпку трубопроводов следует производить в самое теплое время суток. Обратную засыпку траншеи следует выполнять с учетом рекомендуемых положений СП РК 4.03-101-2013. Засыпку газопровода бульдозерами выполняют косопоперечными проходами с наращиванием отвала в траншеи с целью исключения динамического воздействия падающих комьев грунта на газопровод. На горизонтальных участках поворота газопроводов вначале засыпается участок поворота, а затем остальная часть. Засыпку участка поворота начинают с его середины, двигаясь поочередно к концам. На участках с вертикальными поворотами газопровода (в оврагах, балках, на холмах и т.п.) засыпку следует производить снизу вверх.
Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

34/2021-06-04-ПОС

Лист 30

Засыпку газопровода в песчаных грунтах необходимо осуществлять непосредственно вслед за изоляционно-укладочными работами.

Особенности проведения земляных работ в зимних условиях

Грунты, подлежащие разработке в зимних условиях, должны быть подготовлены к экскавации путем предохранения их от промерзания рыхлением или оттаиванием. Предохранение грунта от промерзания должно производиться поздней осенью после окончания дождливого периода, но до выпадения первого снега и наступления устойчивой отрицательной температуры. Его осуществляют путем создания утепляющего слоя из предварительно разрыхленного грунта или из дешевых теплоизоляционных материалов. Предварительное рыхление грунта должно производиться плугами и рыхлителями на глубину не менее 35 см с последующим боронованием. Наибольшие площади (дно котлована, траншеи и т.п.) должны предохраняться от промерзания путем укрытия грунта слоем утеплителя (опилками, шлаком, листьями и прочими теплоизоляционными материалами). Если в траншее или котловане образовался лед, или их занесло снегом, к моменту укладки газопровода их следует очистить без использования средств механизации.

Присыпку уложенного газопровода мерзлым грунтом осуществляют специальной машиной производящей рыхление и просеивание грунта из отвала. Для рыхления мерзлого грунта используются тяжелые рыхлители, ударные приспособления, которыми оборудуют экскаваторы, а также специальные машины и механизмы.

Оттаивание и рыхление грунта должны производиться последовательно, по участкам, размеры которых назначают исходя из суточной производительности землеройных машин. При этом необходимо так организовать производство земляных работ, чтобы разработка подготовленного грунта производилась круглосуточно во избежание промерзания грунта во время перерывов (передача смен, ремонт механизмов и другие операции).

Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки котлованов и траншей с последующим его уплотнением, должен укладываться в отвал с предохранением его от промерзания. Транспортирование оставшегося грунта должно производиться автосамосвалами с обогреваемыми кузовами в отведенные места указанные в проектной документации. Температура талого грунта в момент окончания уплотнения должна быть не ниже 2°C. Лучшим способом уплотнения грунтов в зимнее время является трамбование, при котором можно вести отсыпку грунта наиболее толстыми слоями и подавать в насыпь более крупные куски мерзлого грунта. В качестве основных средств, при уплотнении свеженасыщенного грунта в зимних условиях следует применять трамбующие машины.

При засыпке газопровода в зимнее время мерзлым грунтом поверх него должен устраиваться валик грунта с учетом последующей его осадки при оттаивании или последующей его отсыпки или с уплотнением каждого слоя 15-20 см до проектной отметки верха траншеи.

При разработке траншей в зимнее время во избежание заноса траншей снегом и смерзания отвала грунта темп разработки траншей должен соответствовать темпу изоляционных и укладочных работ. Технологический разрыв между землеройной и укладочной техникой рекомендуется не более двухсуточной производительности.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Подп. и дата	Засыпка газопровода в песчаных грунтах необходимо осуществлять непосредственно вслед за изоляционно-укладочными работами.
34/2021-06-04-ПОС							Лист 31
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата			

Способы разработки траншей в зимнее время должны назначаться в зависимости от времени выполнения земляных работ, характеристики грунта и глубины его промерзания. Выбор технологической схемы земляных работ в зимнее время должен предусматривать сохранение снежного покрова на поверхности грунта до момента начала разработки траншеи.

При глубине промерзания грунта более 0,4 м перед разработкой его одноковшовым экскаватором грунт должен рыхлиться механическим способом.

При несовпадении темпа разработки траншеи в зимнее время с выполнением укладочных работ дно траншеи должно быть утеплено местными теплоизоляционными материалами

Контроль выполнения земляных работ

При производстве земляных работ при проведении операционного контроля следует выполнять проверку правильности:

- нанесения отметок ширины полосы для работы землеройных машин (в соответствии с ППР);
- профиля дна траншеи и котлованов;
- фактических радиусов кривизны траншей на участках поворота горизонтальных кривых;
- откосов траншей;
- толщины слоя подсыпки на дне траншеи и толщины слоя присыпки трубопровода грунтом;
- отметки грунта засыпки или обвалования траншеи;
- отметок рекультивируемой полосы.

Для проверки правильности нанесения ширины полосы для работы землеройных машин необходимо при помощи шаблона проверить расстояние от разбивочной оси до стенки траншеи по ее дну.

Расстояние должно составлять не менее половины проектной ширины траншеи. Допускается увеличение половины проектной ширины не более чем на 200 мм.

Контроль правильности переноса центральной линии шаблона производится теодолитом по ГОСТ 10529 с привязкой к разбивочной оси.

Проверку соответствия профиля дна траншеи проектному профилю следует выполнять сличением отметок дна траншеи с проектными отметками и проведением измерений глубины и ширины траншеи.

Отметки дна траншеи определяются во всех точках, где указаны проектные отметки, но не реже 100, 50, 25 м для трубопроводов диаметром до 325 мм и должны соответствовать проектным отметкам. Допускается изменение глубины траншеи ± 50 мм при условии, что эти допуски не приведут к нарушению нормативных расстояний, установленных в СП РК 4.03-101-2013. Отклонение ширины траншеи от проектной допускается в сторону увеличения не более чем на 100 мм.

Контроль соответствия отметок дна траншеи проектному профилю проверяется с помощью высокоточных нивелиров Н-05 по ГОСТ 10528, инварными штриховыми рейками РН-05 длиной 3,0; 2,0; 1,2; 1,0 м, подвесными рейками с инварной шкалой, а также рейками из алюминиевого корпуса с инварной полосой. Ширина траншеи по дну замеряется рулеткой по ГОСТ 7502.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Проверку соответствия радиусов кривизны траншеи на участках поворота газопровода в горизонтальной плоскости следует выполнять сличением фактической оси траншеи с проектной.

Для соблюдения проектного направления траншеи на криволинейных участках необходимо в пределах кривой по ширине траншеи с обеих сторон установить колышки не реже, чем через 2-5 м. Отклонение фактической оси траншеи на прямолинейном участке не может превышать ± 200 мм.

Контроль правильности разбивки радиусов поворота определяется теодолитом по ГОСТ 10529 с привязкой к разбивочной оси.

Проверку соответствия откосов траншеи проектным следует выполнять определением крутизны откосов с помощью измерения ширины траншеи по дну и верху и определению отношения высоты к заложению откоса.

Заложение откоса должно составлять половину разницы между шириной траншеи по верху и дну траншеи.

Контроль правильности откосов определяется замерами глубины траншеи, которые выполняются с помощью нивелира по ГОСТ 10528 и заложения с помощью рулетки по ГОСТ 7502.

Проверку толщины слоя подсыпки траншеи и присыпки трубопровода грунтом на соответствие проектной следует выполнять проведением измерений фактических величин.

Толщина слоя подсыпки на дне траншеи (выравнивающего слоя) должна соответствовать проектной.

Толщина слоя присыпки контролируется щупом.

Толщину слоя подсыпки следует измерять линейкой по ГОСТ 427.

Проверку отметок грунта засыпки траншеи следует выполнять сличением отметок грунта засыпанной траншеи с проектными отметками.

Отметка грунта засыпки должна соответствовать проектной. Допускается превышение ее величины не более чем на 100 мм.

Контроль правильности отметки грунта засыпки или обвалования производится с помощью нивелира по ГОСТ 10528.

Проверку соответствия отметок рекультивируемой полосы проектным отметкам следует выполнять сличением отметок с проектными отметками.

Отметки рекультивируемой полосы должны быть не менее проектных и не превышать проектную отметку более чем на 100 мм.

Контроль правильности отметок рекультивируемой полосы производится с помощью нивелира по ГОСТ 10528.

Выявленные в процессе контроля отклонения от проектной (рабочей) документации и требований нормативных документов в области стандартизации и технического регулирования или технологических инструкций должны быть исправлены до начала производства последующих работ.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Подп. и дата	Ине. № подл.						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС			33					

Запорная арматура должна быть выставлена в проектное положение без перекосов с обеспечением соосности с газопроводом и при монтаже не должна испытывать нагрузок от газопровода (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации, неравномерности затяжки крепежа и т.д.).

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	трубопровод рекомендуется принимать равным диаметру, но не менее 100 мм. Стыковка стального и полиэтиленового газопровода осуществляется через неразъемное соединение полиэтилен-сталь. Монтаж запорной арматуры следует проводить с учетом требований безопасности и в соответствии с технической документацией на арматуру (паспорт, эксплуатационная документация). Строповку запорной арматуры необходимо осуществлять за специально сделанные проушины, рым-болты, элементы конструкции или места крепления, указанные в технической документации на арматуру. Установка запорной арматуры должна соответствовать руководству по эксплуатации. Запорная арматура Ø500, 400, 300 размещается в смотровой колодец мелкого заглубления, размеры уточняется согласно прилагаемой Т12 раздела ГСН по месту. Запорная арматура Ø200, 150, 100, 50 устанавливаются в ковре, согласно прилагаемой Т11 раздела ГСН Запорную арматуру следует устанавливать с учетом направления потока газа в газопроводе. Запорная арматура должна быть выставлена в проектное положение без перекосов с обеспечением соосности с газопроводом и при монтаже не должна испытывать нагрузок от газопровода (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации, неравномерности затяжки крепежа и т.д.).
					Лит Изм. № докум. Подп. Дата 34/2021-06-04-ПОС Лист 35

Для устранения нагрузок на запорную арматуру от газопровода должны быть предусмотрены опоры, в соответствии с проектной документацией.

Фланцевые и приварные соединения запорной арматуры должны выполняться без натяжения трубопровода.

Для предотвращения заклинивания затвора приварной стальной запорной арматуры при нагревании корпуса во время сварки затвор должен быть полностью открыт. При приварке стальной запорной арматуры без подкладных колец, арматуру по окончании сварки допускается закрыть только после ее внутренней очистки.

При монтаже запорной арматуры на фланцевых соединениях в целях безопасности следует выполнить следующие мероприятия:

- гайки болтов расположить с одной стороны фланцевого соединения;
- высоту выступающих над гайками концов болтов и шпилек выдержать размером не менее одного шага резьбы (без учета фаски);
- гайки соединений с мягкими прокладками затягивать ключом способом крестообразного обхода, а с металлическими прокладками - способом кругового обхода;
- болты и шпильки соединений трубопроводов рекомендуется смазать в соответствии с требованиями технической документации;
- между фланцами установить прокладки. Размер диаметра отверстия прокладки должен быть не меньше внутреннего диаметра трубы и соответствовать внутреннему диаметру уплотнительной поверхности фланца.
- Осуществлять выравнивание перекосов фланцевых соединений натяжением болтов (шпилек), а также применением клиновых прокладок не рекомендуется.

В процессе монтажа необходимо проводить очистку внутренней поверхности (полости) трубы. В технологическом потоке сварочно-монтажных работ в процессе сборки и сварки отдельных труб (секций) или плетей в нитку очистку осуществлять:

- стальных - путем протягивания внутри трубы механического очистного устройства (для труб номинальным диаметром до DN 200 – с помощью штанги (троса), без использования средств механизации, номинальным диаметром DN 200 и более - преимущественно механизированным способом, например трактором, с помощью штанги);
- полиэтиленовых - диаметром менее de 400 – продувкой воздухом.

После очистки концы труб (секций), плети должны быть закрыты заглушками.

Изоляционные работы при строительстве газопроводов из стальных труб

Строительство подземных газопроводов следует производить из изолированных в заводских или базовых условиях труб и соединительных деталей.

Газопроводы и защитные футляры из стальных труб для подземных газопроводов следует применять с изоляционным покрытием «усиленного типа» по ГОСТ 9.602.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	поверхности фланца.			
					Осуществлять выравнивание перекосов фланцевых соединений натяжением болтов (шпилек), а также применением клиновых прокладок не рекомендуется.			
					В процессе монтажа необходимо проводить очистку внутренней поверхности (полости) трубы. В технологическом потоке сварочно-монтажных работ в процессе сборки и сварки отдельных труб (секций) или плетей в нитку очистку осуществлять:			
					- стальных - путем протягивания внутри трубы механического очистного устройства (для труб номинальным диаметром до DN 200 – с помощью штанги (троса), без использования средств механизации, номинальным диаметром DN 200 и более - преимущественно механизированным способом, например трактором, с помощью штанги); - полиэтиленовых - диаметром менее de 400 – продувкой воздухом.			
					После очистки концы труб (секций), плети должны быть закрыты заглушками.			
Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	<u>Изоляционные работы при строительстве газопроводов из стальных труб</u>			
					Строительство подземных газопроводов следует производить из изолированных в заводских или базовых условиях труб и соединительных деталей.			
					Газопроводы и защитные футляры из стальных труб для подземных газопроводов следует применять с изоляционным покрытием «усиленного типа» по ГОСТ 9.602.			
					34/2021-06-04-ПОС			Лист
					Лит	Изм.	№ докум.	Подп.

Очистку и изоляцию зон сварных кольцевых стыков труб с заводским покрытием рекомендуется выполнять вне траншеи при размещении плетей газопроводов на расстоянии не менее 0,5 м от края траншеи, а сварные стыковые соединения плетей и стыки захлестов – в траншее. Величина зазора между плетью и поверхностью грунта должна обеспечивать технологию выполнения работ по очистке и изоляции, и может быть обеспечена при размещении ее за пределами траншеи за счет применения временных (технологических) опор заданной высоты, в траншее за счет устройства приямков.

Зона сварных кольцевых соединений труб и участки прилегающего заводского изоляционного покрытия на расстояние не менее 200 мм должна быть очищена. Удаление изоляционного покрытия выполняется без использования средств механизации, с использованием скребков, щеток и т.п.

В зависимости от типа защитного покрытия степень очистки и степень шероховатости наружной поверхности труб должна соответствовать требованиям ГОСТ 9.402.

При наличии на поверхности очищенных труб острых кромок, выступов, заусенец, брызг металла и шлака, которые могут повредить покрытие, очищаются с помощью шлиф-машинки или напильников.

Степень очистки, осушки и при необходимости нагрева изолируемой наружной поверхности (труб, фасонных частей и т.п.) должна соответствовать требованиям, указанным в технических условиях на изоляционные материалы.

Изоляционное покрытие в трассовых условиях наносится аттестованными специалистами ручным способом на сварные стыковые соединения, фасонные части, не имеющие заводского изоляционного покрытия, неразъемные соединения полиэтилен-сталь, места врезок, арматуру подземной установки при отсутствии заводской изоляции, места повреждения заводского изоляционного покрытия. Наносимое, без использования средств механизации, изоляционное покрытие по своим защитным свойствам не должно быть ниже покрытия линейной части газопровода, иметь соответствующую адгезию к покрытию линейной части газопровода, и должны использоваться аналогичные материалы, что и для газопроводов.

Изоляционное покрытие наносится на подготовленную наружную поверхность (зону сварного соединения, соединительную деталь, места повреждения изоляции) и внахлест на существующую изоляцию на расстояние не менее 200 мм.

Технология изоляционных работ в трассовых условиях включает:

- подготовку изоляционных материалов;
- очистку трубопровода;
- сушку или подогрев изолируемой поверхности;
- нанесение грунтовки;
- нанесение изоляционного покрытия;
- нанесение защитного покрытия;
- контроль качества покрытий.

Укладочные работы

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Ине. № подл.	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС	
						37

Укладка газопроводов в траншею может осуществляться одиночными трубами (секциями), плетями, длинномерными полиэтиленовыми трубами (диаметром менее 200 мм) с бухт или катушек методом разматывания, и производится в зависимости от их диаметра и толщины стенки с помощью самоходных грузоподъемных средств (трубоукладчиков, автокранов и т.п.) или с использованием ручной такелажной оснастки (ремней, лебедок, полиспастов и т.п.).

Укладка должна выполняться в соответствии с профилем траншеи и с учетом продольной жесткости газопровода. Трубы должны плотно прилегать к дну траншеи, что должно обеспечиваться за счет подработки дна траншеи, которая выполняется без использования средств механизации или подбивки грунта под газопровод.

Укладку газопровода допускается вести без использования средств механизации, отдельными трубами (секциями) или плетями по следующей схеме - сваренный и полностью изолированный газопровод, включая стыки, следует приподнять над строительной полосой на высоту не более 0,5 - 0,7 м в зависимости от диаметра трубы с помощью трубоукладчиков, сместить в сторону траншеи и опустить в проектное положение. При этом работы должны вестись непрерывным способом.

Трубоукладчики и краны, с помощью которых производится укладка плетей и труб в траншеи, следует располагать от бровки траншеи на расстоянии, исключающем ее обрушение. Минимальные расстояния от подошвы откоса траншеи до ближайшей опоры подъемного крана, в зависимости от вида грунта приведены в таблице 3.6.3.

Таблица 3.6.3 - Минимальные расстояния от подошвы откоса траншеи до ближайшей опоры подъемного крана

Глубина выемки, м	Наименьшее расстояние от подошвы откоса до ближайшей опоры подъемного крана, м			
	грунт не насыпной			
	песчаный и гравийный	супесчаный	суглинистый	глинистый
1	1,5	1,25	1	1
2	3	2,4	2	1,5
3	4	3,6	3,25	1,75
4	5	4,4	4	3
5	6	5,3	4,75	3,5

В качестве грузозахватных приспособлений могут использоваться мягкие монтажные полотенца или специальные эластичные стропы. Применение открытых стальных канатов, монтажных «удавок» и других приспособлений, не имеющих мягких контактных поверхностей, не допускается.

Расстроповку элементов (плетей) газопровода, соединяемых электросваркой и воспринимающих монтажную нагрузку, следует выполнять после сварки проектными швами.

После укладки элементов газопровода на бровку траншеи необходимо закрепить их во избежание их самопроизвольного перемещения. Крепления следует производить с помощью заранее подготовленных устройств.

Снятие строповочных устройств следует осуществлять только после того как трубы газопровода будут плотно уложены на подготовленное основание траншеи.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Лист	34/2021-06-04-ПОС	38
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				

Укладка газопровода в траншею должна осуществляться в соответствии с СП РК 4.03-101-2013.

Укладка газопровода в траншею должна обеспечивать:

- исключение соприкосновения плетей с бровкой или стенками траншеи в процессе опускания;
- сохранность стенок самого газопровода (отсутствие на нем вмятин, гофр, изломов и других повреждений);
- сохранность изоляционного покрытия;
- полное прилегание газопровода ко дну траншеи по всей его длине;
- заданные проектом расстояния между осями смежных газопроводов при укладке в одну траншею нескольких газопроводов. С этой целью рекомендуется использовать дистанционные прокладки (проставки).

По окончании устройства траншеи и перед укладочными работами в случаях, предусмотренных проектной (рабочей) документацией, следует выполнить подсыпку в соответствии с СП РК 4.03-101-2013, при этом подсыпка производится бульдозером, а выравнивание – с выполнением геодезического контроля без использования средств механизации.

Предупредительную полиэтиленовую сигнальную ленту желтого цвета следует укладывать на присыпанный стальной газопровод на высоту, указанную в проектной документации. Вдоль присыпанного полиэтиленового газопровода уложить изолированный алюминиевый или медный провод.

Укладка в траншею газопроводов из полиэтиленовых труб должна производиться:

- не ранее чем через 30 мин после сварки последнего стыка для частичной релаксации усадочных напряжений в зоне сварного соединения;
- с учетом коэффициента линейного расширения, при температуре наружного воздуха не ниже минус 20 °С и не выше 30 °С.

Трубы из бухт для исключения излома следует разматывать при температуре наружного воздуха не ниже 5 °С.

Полиэтиленовые газопроводы в летний период следует укладывать змейкой, если это указано в проектной документации.

Газопроводы наружным диаметром до Dn 160 включительно могут укладываться в траншею с помощью текстильных строп, канатов, брезентовых полотенец и т.п.

Укладку полиэтиленовых газопроводов наружным диаметром Dn 160 и более рекомендуется выполнять с помощью трубоукладчиков. Расстояния между трубоукладчиками должно уточняться при разработке ППР.

Укладку полиэтиленовых труб из бухт (катушек) рекомендуется производить в заранее подготовленную траншею.

Укладку полиэтиленовых труб по непрерывной схеме монтажа следует осуществлять при наличии возможности осевого перемещения сваренных секций труб по трассе без риска их повреждения. При

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № подл.						Лист 39
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС						

данном способе укладки труб сварочная машина должна быть дополнительно оснащена роликовыми опорами, по которым будут перемещаться трубы.

После опускания газопровода в траншею монтажные (замыкающие) стыки плетей или секций сваривают в прямках неповоротно. Эти операции следует выполнять в наиболее прохладное время суток.

После укладки газопровода на дно траншеи и сварки монтажных стыков производят геодезическую проверку отметок укладки, просветы под трубой подбивают грунтом и трубы присыпают сверху грунтом слоем в 200 мм, оставляя свободными сварные стыки.

Укладку защитного футляра и газопровода в футляре следует производить:

- отдельно с последующим протаскиванием газопровода в футляре;
- совместно футляра с уложенным в него газопроводом.

Защитные футляры на пересечении с автодорогами III и IV категории шириной более 6 м без перекрытия движения транспорта следует прокладывать в два этапа с разделением автодороги на две зоны и поочередного перекрытия движения транспорта по каждой зоне. В этих случаях защитный футляр монтируют из двух секций. Обе секции защитного футляра перед укладкой должны быть тщательно подогнаны.

Участок газопровода, прокладываемый внутри футляра, должен иметь минимальное количество сварных швов.

Перед укладкой газопровода в футляр, на газопровод устанавливаются опоры, и газопровод протягивается в футляр. Шаг и конструкция опор должна приниматься в соответствии с решениями принятыми в разделе ГСН.

Концы футляра должны быть герметично закрыты. При выполнении герметизации футляра работы должны проводиться при температурах, приведенных в стандартах или технических условиях на соответствующие герметизирующие материалы.

При установке футляров на выходе газопровода из земли следует обеспечить центрацию футляра с помощью лазерного прибора по ГОСТ Р 53340, отвеса по отношению к газопроводу и устойчивое основание под ним. Футляр следует устанавливать на изолированный газопровод. Заделка концов футляра аналогична заделке футляров на горизонтальном газопроводе. Грунт засыпки выхода газопровода из земли должен быть тщательно уплотнен с устройством отмостки, позволяющей отводить поверхностные воды от конструкции.

Особенности проведения изоляционных и укладочных работ в зимних условиях

Проведение работ по изоляции ручным способом в трассовых условиях во время дождя, тумана, снегопада и сильного ветра допускается только при условии защиты изолируемой поверхности. При температуре воздуха ниже минус 25°C проведение изоляционных работ разрешается только в специальном укрытии.

Укладка в траншею газопроводов из полиэтиленовых труб должна производиться при температуре наружного воздуха не ниже минус 20 °C.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лист	34/2021-06-04-ПОС					Лист
40						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

В зимнее время газопроводы должны быть уложены немедленно после подчистки дна траншей и засыпаны талым грунтом на высоту не менее 0,3 м над газопроводом.

Контроль выполнения укладочных и изоляционных работ

При производстве укладочных и изоляционных работ при проведении операционного контроля следует выполнять проверку:

- чистоты внутренней полости трубы после сварки в секции и плети;
- укладки газопровода, кривых вставок, футляров открытым способом;
- изоляционного покрытия трубопроводов при его наличии;
- установки опор на газопроводе, прокладываемом в футляре, заделку концов футляра;
- установки опор (фундаментов) под арматуру, установки арматуры в подземном исполнении;
- толщины присыпки газопровода;
- укладки сигнальной ленты и/или изолированного медного или алюминиевого провода;
- установки контрольных трубок на концах футляров.

Проверку чистоты внутренней полости трубы газопровода следует выполнять в процессе проведения продувки газопровода воздухом или очистки трубы специальными поршнями.

Очистка полости трубы считается выполненной при условии, что очистное устройство (поршень) в конце очищаемого участка не имеет повреждений, а в результате продувки (промывки) воздух (вода) выходят без включения грунта, окарины и других посторонних предметов.

Контроль за выполнением операции по очистке полости трубы выполняется визуально.

Для проверки правильности укладки газопровода, кривых вставок и футляров в траншею необходимо проверить плотность прилегания газопровода, кривых вставок, футляров к основанию траншеи, отметки низа трубы (футляра) и расстояния от стенки траншеи до газопровода или футляра в свету.

Газопровод и футляр должны плотно прилегать к основанию траншеи, а расстояние от стенок газопровода или футляра до стенки траншеи должно соответствовать указанному в проектной (рабочей) документации. Допускается увеличение расстояний от стенки газопровода или футляра до стенки траншеи не более чем на 200 мм от проектных.

Контроль плотности прилегания газопровода или футляра к основанию траншеи производится визуально, контроль отметки низа трубы (футляра) производится нивелиром по ГОСТ 10528 на соответствие проектным отметкам. Контроль расстояний от стенок газопровода или футляра до стенки траншеи осуществляется с помощью линейки по ГОСТ 427 или рулетки по ГОСТ 7502.

Проверка соответствия нанесения изоляционного покрытия на газопровод проводится на 10% сварных соединений, изолированных в ручную и на участках труб с поврежденной заводской изоляцией. Проверку выполняют сличением проводимых замеров толщины покрытия, диэлектрической сплошности, адгезии к стали, ударной прочности покрытия с данными, указанными в Технических условиях на изоляционное покрытие, предусмотренное проектной (рабочей) документацией, и ГОСТ 9.602.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Контроль за выполнением операции по очистке полости трубы выполняется визуально.	
					Для проверки правильности укладки газопровода, кривых вставок и футляров в траншею необходимо проверить плотность прилегания газопровода, кривых вставок, футляров к основанию траншеи, отметки низа трубы (футляра) и расстояния от стенки траншеи до газопровода или футляра в свету.	
					Газопровод и футляр должны плотно прилегать к основанию траншеи, а расстояние от стенок газопровода или футляра до стенки траншеи должно соответствовать указанному в проектной (рабочей) документации. Допускается увеличение расстояний от стенки газопровода или футляра до стенки траншеи не более чем на 200 мм от проектных.	
					Контроль плотности прилегания газопровода или футляра к основанию траншеи производится визуально, контроль отметки низа трубы (футляра) производится нивелиром по ГОСТ 10528 на соответствие проектным отметкам. Контроль расстояний от стенок газопровода или футляра до стенки траншеи осуществляется с помощью линейки по ГОСТ 427 или рулетки по ГОСТ 7502.	
					Проверка соответствия нанесения изоляционного покрытия на газопровод проводится на 10% сварных соединений, изолированных в ручную и на участках труб с поврежденной заводской изоляцией. Проверку выполняют сличением проводимых замеров толщины покрытия, диэлектрической сплошности, адгезии к стали, ударной прочности покрытия с данными, указанными в Технических условиях на изоляционное покрытие, предусмотренное проектной (рабочей) документацией, и ГОСТ 9.602.	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС	Лист
						41

При контроле изоляционного покрытия должна выполняться проверка внешним осмотром изолируемой поверхности в процессе послойного нанесения.

Толщина покрытия, диэлектрическая сплошность, адгезия покрытия к стали, ударная прочность покрытия должны соответствовать, указанной в Технических условиях на изоляционное покрытие и ГОСТ 9.602.

Контроль толщины покрытия производится методом неразрушающего контроля с применением толщиномера ультразвукового по ГОСТ Р 55614, адгезию к стали контролируют адгезиметром, сплошность покрытия – приборным методом неразрушающего контроля (искровым дефектоскопом), ударную прочность – с помощью ударного приспособления в соответствии с ГОСТ Р 51164.

Проверку соответствия расстановки диэлектрических опор на газопроводе, прокладываемом в футляре, и заделки концов футляра следует выполнять сличением расстояний между опорами с расстояниями, указанными в проектной (рабочей) документации.

Расстояние между опорами должно соответствовать проектному. Допускается изменение расстояний между опорами $\pm 10\%$.

Контроль правильности заделки концов футляра производится визуально, расстояние между опорами проверяют с помощью линейки по ГОСТ 427 или рулетки по ГОСТ 7502.

Проверку правильности установки опор (фундаментов) под арматуру и установки арматуры в подземном исполнении выполняют сличением отметок основания фундаментов и отметок днища арматуры с проектными отметками.

Отметки основания фундаментов и арматуры должны соответствовать проектным отметкам дна траншеи.

Контроль отметок дна траншеи на соответствие указанных в проектной документации, производится с помощью нивелира по ГОСТ 10528.

Проверку правильности укладки сигнальной ленты или изолированного медного или алюминиевого провода выполняют сличением с техническими решениями, приведенными в проектной (рабочей) документации.

Сигнальная лента должна быть уложена на 0,2 м от верха присыпанного грунтом газопровода. Изолированный медный или алюминиевый провод должен быть уложен вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0,2-0,3 м.

Контроль правильности укладки сигнальной ленты производится визуально. Контроль правильности укладки изолированного медного или алюминиевого провода выполняют визуально и с помощью рулетки по ГОСТ 7502. Целостность провода-спутника проверяется лабораторией с помощью трассоискателя, АНТПИ или других приборов.

Проверку правильности размещения контрольных трубок на концах футляров следует выполнять сличением их с местами установки, предусмотренными проектной документацией.

Размещение контрольной трубки на футляре должно быть проверено с помощью замеров на соответствие ее местоположения проектной документации.

Ине. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	34/2021-06-04-ПОС					Лист
										42
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Контроль правильности размещения контрольной трубки от конца футляра предусматривается с помощью рулетки по ГОСТ 7502, контроль вертикальности установки контрольной трубки предусматривается с помощью уровня по ГОСТ 9416.

Выявленные в процессе контроля отклонения от проектной документации и требований нормативных документов в области стандартизации и технического регулирования или технологических инструкций должны быть исправлены до начала производства последующих работ.

По результатам операционного контроля должны составляться акты освидетельствования скрытых работ.

Закрытые способы прокладки газопроводов

Закрытые (бестраншейные) способы прокладки газопроводов применяются при строительстве переходов через естественные и искусственные преграды (водные преграды (р. Нура), овраги, автомобильные дороги, железные дороги, магистральные улицы и т.п.).

В качестве бестраншейных способов прокладки используются прокол, продавливание, горизонтальное направленное бурение.

Очередность и способы производства работ по бестраншейной прокладке должны быть увязаны со строительством всей трассы газопровода и опережать прокладку газопровода открытым способом.

Работы по бестраншейной прокладке должны производиться в соответствии с ППР, разработанным на основе раздела ПОС, входящего в состав проектной документации.

Проект производства работ на бестраншейную прокладку должен содержать:

- *план прокладки с расположением и привязкой всех размеров рабочего и приемного котлованов и расстояния между ними;*
- *продольный и поперечный профиль прокладки с нанесением всех насыпей, выемок, водоотводов, лесопосадок, сетей инженерно-технического обеспечения, высотных отметок рабочего и приемного котлованов, рабочей трубы и футляра;*
- *данные по:*
 - a) *основным инженерно - геологическим и гидрологическим характеристикам грунтов;*
 - b) *конструкции, креплению, обустройству котлованов и упорной стенки;*
 - c) *обеспечению работ системами электроснабжения;*
 - d) *оборудованию, используемому при производстве работ;*
- *схемы производства работ с указанием мероприятий по обеспечению безопасности движения транспорта и производства работ;*
- *график выполнения работ (для переходов под железными дорогами).*

Работы по бестраншейной прокладке разделяют на два этапа:

- подготовка участка и земляные работы;
- прокладка футляра;
- протаскивание газопровода в защитный футляр.

При подготовке участка выполняется разработка рабочего и приемного котлованов.

Второй этап включает:

- монтаж упорной стенки котлована для восприятия опорных реакций усилий при продвижении защитного футляра в грунте;
- сварку защитного футляра, или подготовку элементов сборного защитного футляра к монтажу с постепенным наращиванием в процессе прокладки;
- монтаж буровой установки или оборудования для прокола, продавливания защитного футляра;
- прокладку защитного футляра под пересекаемой преградой.

Сооружение переходов под автомобильными дорогами

Согласно выданным техническим условиям эксплуатирующих организаций, переходы через автомобильные дороги областного значения выполняются по технологической схеме, закрытой (бестраншейной) прокладки в защитных кожухах (футлярах).

Некатегорийные полевые и грунтовые дороги предусматривается перейти открытой (траншейной) прокладкой без защитного кожуха.

Внутрипоселковые дороги предусматривается перейти открытой (траншейной) прокладкой в защитном кожухе.

Переходы газопроводов под автомобильными дорогами состоят из защитного кожуха, рабочего трубопровода (трубной плети), опор, манжет, отводной трубы и вытяжной свечи, концы защитных футляров должны иметь уплотнения из диэлектрических материалов.

Строительство переходов под автомобильными дорогами представляет комплекс специальных строительных и монтажных работ, который включает в себя:

- изготовление узлов и деталей перехода;
- прокладку защитного кожуха;
- монтаж, сварку, контроль сварки и испытание трубной плети;
- очистку, изоляцию, контроль изоляции и оснастку трубной плети опорными элементами;
- размещение трубной плети в кожухе;
- монтаж манжет, отводной трубы и вытяжной свечи.

Переходы трубопроводов через автомобильные дороги предусматриваются в местах прохождения дорог по насыпям либо в местах с нулевыми отметками. Угол пересечения трубопровода с дорогами как правило близок к 90°. Прокладка трубопроводов через тело насыпи не допускается.

Глубина заложения защитных кожухов, прокладываемых под автомобильными дорогами всех категорий, должна быть не менее 1,4 м от бровки земляного полотна до верхней образующей защитного кожуха, в выемках и на нулевых отметках - не менее 0,4 м от дна кювета, водоотводных канав или дренажа.

Закрытый (бестраншейный) способ прокладки защитных кожухов при строительстве переходов газопроводов под автомобильными дорогами является основным способом.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	34/2021-06-04-ПОС					Лист
											44
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							

Работы по прокладке защитного кожуха закрытым способом могут быть разделены на два этапа:

- I. подготовка участка и земляные работы;*
- II. прокладка защитного кожуха.*

I этап включает следующие операции:

- *геодезическую разбивку места перехода и установку предупредительных знаков;*
- *водопонижение грунтовых вод (не менее 0,5 м от низа защитного кожуха);*
- *планировку участка по обе стороны дороги;*
- *рытье рабочего и приемного котлованов с устройством необходимых креплений.*

II этап включает следующие операции:

- *монтаж упорных стенок котлована;*
- *сварку защитного кожуха (или подготовку элементов сборного защитного кожуха к монтажу с постепенным наращиванием в процессе проходки);*
- *монтаж буровой установки или оборудования для продавливания защитного кожуха;*
- *прокладку защитного кожуха под насыпью дороги.*

До начала работ по строительству переходов необходимо спланировать площадку, сделать подъезд к ней, завести необходимое оборудование, машины, трубы, материалы, вагон-домик.

Перед разработкой котлованов и траншей должны быть выполнены расчистка и планировка трассы на участке перехода, а также разбивка оси котлованов и траншей. При этом необходимо также обозначить опасные места и места расположения подземных коммуникаций.

Если на месте устройства перехода обнаружены подземные коммуникации и сооружения, не указанные в проекте, работы необходимо приостановить и вызвать представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации или сооружения. Одновременно необходимо принять меры к защите этих коммуникаций от повреждения.

При приближении экскаватора к знакам, указывающим на расположение подземных коммуникаций, работу следует прекратить за 2 м до коммуникации. Разработку грунта на этом участке необходимо производить вручную с соблюдением требований СП РК 4.03-101-2013.

Рабочий котлован представляет собой траншею, длина которой на 8-12 м (по длине футляра из стальных электросварных труб) должна превышать длину кожуха, ширина по верху на 1,5-2 м ширину установки для горизонтального бурения, а по низу – менее чем на 1,5 м диаметра кожуха. Глубина котлована должна быть на 0,7 м ниже проектной отметки низа кожуха. Поперек рабочего котлована у откоса дороги отрывают траншею шириной 1-1,5 м, глубиной 0,5-1 м, длиной 10-12 м. Ее крепят деревянными стойками, на которые опирается при бурении труба-якорь, служащая для крепления блока полиспаста. Приемный котлован служит для приема кожуха и демонтажа головки шнека. Длина его должна быть 6 м, ширина по дну на 1,5 м больше диаметра кожуха, а глубина на 0,3 м ниже проектной отметки низа кожуха. Рабочий и приемный котлованы и траншеи разрабатываются с откосами согласно СНиП в зависимости от вида грунтов и глубины выемки. При разработке рабочих и приемных котлованов, во

избежание осадки насыпи необходимо отступить не менее чем на 2 м от подошвы насыпи дороги. При нарушении кювета в него должна быть уложена водопропускная труба, соответствующая сечению кювета.

Кожух из отдельных труб сваривают на берме траншеи, после чего его очищают очистной машиной и изолируют, часто вручную. Стык после сварки захлеста изолируют также вручную.

К началу работ по проведению горизонтального бурения должны быть готовы рабочий и приемный котлованы и поперечная траншея для якоря, установлены защитные инвентарные ограждения. В рабочем котловане устанавливают инвентарные роликовые опоры. На берме рабочего котлована в кожух при помощи крана-трубоукладчика устанавливают шнек. Кожух, с уложенным в него шнеком и укрепленной на шнеке режущей головкой, краном-трубоукладчиком опускают в рабочий котлован на роликовые опоры. На кожухе закрепляют установку горизонтального бурения и соединяют шнек с валом привода. К трубе-якорю, установленному в поперечной траншее, крепят неподвижный блок полиспаста. Пуск установки следует производить в строго определенном порядке: первым включается шнек, а затем лебедка. Остановка производится в обратном порядке. Схема бурения при устройстве перехода трубопровода представлена на рис. 3.6.3.

Бурение прекращают, как только кожух вышел в приемный котлован на 1-1,5 м. Затем демонтируют установки горизонтального бурения в обратной монтажу последовательности. При горизонтальном бурении нивелиром выверяют правильное направление кожуха. В процессе работы УГБ поддерживается краном-трубоукладчиком и ее положение проверяется по уровню.

В состав сварочно-монтажных работ при устройстве перехода входят: сборка и сварка защитного кожуха, рабочей плети трубопровода и присоединение к ней заглушек и штуцера для гидравлического испытания, сварку в нитку в пределах всего перехода. При сборке и сварке кожуха или рабочей плети их укладывают на инвентарные опоры (лежки) и очищают внутреннюю полость от грязи, камней, снега и прочих посторонних предметов. Далее необходимо осмотреть свариваемые кромки, в случае необходимости выровнять их, зачистить их шлифовальной машинкой до металлического блеска и прилегающую к ним наружную и внутреннюю поверхность на ширину не менее 10 мм.

Производство сварочно-монтажных работ выполнять по технологическим картам на сборку и сварку труб и звеньев труб в нитку.

Сварка трубной плети газопровода осуществляется непосредственно на участке строительства перехода из одиночных труб. Трубы должны быть с заводской изоляцией.

Сварка стыков плети на месте строительства перехода выполняется в неповоротном положении, как правило, ручной дуговой сваркой.

Для проведения пневматического испытания рабочей плети производится приварка сферических (инвентарных) заглушек, штуцера для заполнения плети воздухом и воздухопускного патрубка, устанавливаемого в верхней точке рабочей плети.

Все сваренные стыки трубной плети газопровода перед нанесением на них изоляции и размещением в защитном кожухе подвергают контролю рентгеновским способом.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист 46
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС						

Для предохранения изоляционного покрытия от механических повреждений при монтаже плети в защитном кожухе на нее накладывают защитный оберточный материал.

На трубной плети в пределах защитного кожуха монтируются опорно-направляющие кольца. Укладка трубной плети в защитный кожух осуществляется путем протаскивания ее с помощью кранов-трубоукладчиков и трактора в следующем технологическом порядке:

- плеть на монтажных полотенцах поднимается кранами - трубоукладчиками и перемещается в створ траншей;
- к плети присоединяется канат, который другим концом через защитный кожух прикреплен к трактору-тягачу;
- головная часть плети вводится в защитный кожух, а вся плеть приводится в соосное с защитным кожухом положение;
- продольным перемещением кранов-трубоукладчиков и трактором-тягачом плеть протаскивается в защитный кожух до выхода ее головной части на необходимую величину.

Протаскивание плети в защитный кожух рекомендуется производить в холодное время дня (утром).

При укладке плети в защитный кожух не допускается повреждение изоляции. Трубная плеть должна иметь опоры на дне рабочего и приемного котлованов на протяжении не менее 8 м с каждой стороны перехода. В качестве опор могут быть использованы мешки с мягким грунтом, расположенные один от другого с интервалом 1 м.

После размещения трубной плети в защитном кожухе проверяют сплошность изоляционного покрытия. После проверки изоляции производят испытание на прочность и герметичность в зависимости от категории участка

По окончании работ по прокладке плети в защитном кожухе выполняют монтаж манжет, вытяжной свечи и другие работы, предусмотренные проектом перехода.

При открытом способе прокладки трубную плеть, изоляцию, опоры и манжеты предварительно устанавливают в защитном кожухе и опускают в рабочий котлован.

Перед засыпкой конца защитного кожуха все металлические наружные части, которые будут находиться в грунте, изолируют, а части на поверхности покрывают масляной краской.

Рабочий и приемный котлованы засыпают бульдозером с подбивкой грунта под трубопроводом и в пазухах, устраивая грунтовый валик по оси газопровода. Затем засыпают отводной трубопровод и свечи.

Сваренный газопровод перед протаскиванием должен быть испытан на герметичность $R_{исп}=1,5$ МПа. После протаскивания газопровод должен быть повторно испытан на герметичность.

Прокладка защитного кожуха методом продавливания состоит в том, что к его переднему концу приваривают кольцевой нож для уменьшения лобового сопротивления вдавливанию кожуха в грунт. Скосы режущих кромок ножей выполняют под углом $15-22^\circ$, при этом они могут быть изготовлены с наклоном внутрь или наружу.

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 47
Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС

Для уменьшения сил трения, возникающих между стенкой защитного кожуха и грунта, необходимо обеспечить зазор между кожухом и скважиной. Для формирования такого зазора наружный диаметр кольцевых ножей принимают на 30-60 мм больше наружного диаметра прокладываемого защитного кожуха.

При продавливании должно уделяться внимание прочности задней (упорной) стенки, воспринимающей упорные реакции усилий подачи, развиваемых пневматической установкой.

Строительство переходов методом горизонтально-направленного бурения (железные дороги, водные преграды (р. Нура)).

Бурение проводится при помощи гидромониторной буровой головки, бур приводится в движение за счет бентонитовой гидравлической промывки, подаваемой двумя отдельными дизельными насосами высокого давления через буровую штангу. В отличие от вертикального бурения при наклонно-направленном бурении производится бурение пологой арки под пересекаемым препятствием.

Технологическая схема ГНБ при строительстве переходов включает четыре последовательных этапа:

Этап I – бурение пионерной скважины с выходом буровой головки на противоположенной стороне

- По проектной траектории прокладки трубопровода бурится пионерная скважина диаметром 90 мм. Бурение по заданной траектории осуществляется при помощи зонда с датчиками, вмонтированного в пилотную штангу за буровой головкой.
- Для увеличения продольной жесткости буровой колонны через 30–40 м от гидромониторной головки начинается бурение промывочной буровой колонны.
- Первый этап бурения наклонно-направленной скважины заканчивается выходом промывочной буровой колонны на противоположной стороне преграды. Буровые штанги для бурения пилотной скважины, и гидромониторная буровая головка демонтируются и вынимаются из промывочной буровой колонны. В стволе скважины остается только промывочная буровая колонна.

Этап II – расширение пионерной скважины

- К промывочной буровой колонне на ее выходе крепится расширитель. Расширение скважины ведется в направлении «на себя» путем последовательного протаскивания нормального ряда бочковых расширителей. Приложением тягового усилия буровой установки и одновременным вращением расширитель протаскивается буровой установкой, расширяя ствол скважины. При этом штанги, снимаемые с бурового станка, перевозятся на противоположную сторону дороги и навинчиваются на хвостовую часть расширителей.

Этап III – протаскивание рабочего трубопровода в расширенную скважину

- На противоположной от места расположения буровой установки стороне препятствия готовится рабочая плеть трубопровода, которую необходимо протащить через выполненную скважину. Для этого к переднему концу рабочей плети крепится головка, воспринимающая тяговое усилие. Эта головка через шарнирный переходник (вертлюг) крепится к расширителю, закрепленному в свою очередь к буровой колонке.

Ине. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Ине. № подл	Лист	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС		48

- Таким образом, вращая и протаскивая буровую колонну через ствол скважины, буровая установка втягивает в скважину расширитель и рабочую плетть трубопровода. При этом вращение буровой колонны и расширителя, благодаря наличию вертлюга, не передается на трубопровод. Часть бурового раствора, находящегося в скважине, вытесняется рабочей плетью трубопровода, другая его часть остается в затрубном пространстве.

Этап IV – испытание трубопровода в скважине

- Продольный профиль ствола скважины представляет собой пологую кривую. Радиус кривой определяется радиусом естественного изгиба протаскиваемого трубопровода. Угол входа и угол выхода буровой головки должен быть в пределах 6-20°
- Поперечный профиль скважины представляет собой окружность с диаметром, равным диаметру протаскиваемого расширителя. При наклонно-направленном бурении выработанное поперечное сечение скважины закрепляется только буровым раствором.
- Прочность стенок скважины носит временный характер. Это означает, что работы по расширению скважины должны проводиться непрерывно и протаскивание трубопровода следует производить сразу же после завершения расширительных работ.
- Входная и выходная части скважины оборудуются приямками для накопления бурового раствора.
- Заглубление трубопровода в самой низкой точке перехода должно быть указано на трассировочном профиле.
- При выполнении буровых работ следует предусмотреть рециркуляцию бурового раствора и мероприятия по промежуточному хранению неочищенного бурового раствора и необходимого запаса воды. Затраты на данные сооружения учитываются в объёмах работ и сводном сметном расчёте.
- Строительно-монтажные работы ведутся одновременно на строительно-монтажных площадках, расположенных по обоим сторонам дороги.

В состав площадок включаются следующие сооружения:

- монтажные площадки №1 и №2 входа и выхода буровой скважины;
- монтажная площадка раскладки плети трубопровода;
- заградительные обваловки от разлива бурового раствора у площадок №1 и №2;
- насыпь над скважиной в точке входа и выхода пилотной скважины;


Предусматривается совмещение работ по монтажу трубопровода на площадке, подготовке плети и устройству скважины методом наклонно-направленного бурения.

Монтаж технологического оборудования и трубопроводов, установку бурового агрегата, бурение скважин, контроль изоляции и протаскивание подготовленных и предварительно испытанных трубопроводов выполняет субподрядная организация, обладающая лицензиями и опытом, дающими право на выполнение подобных работ. На завершающей стадии проводятся уборка площадки, транспортировка в отвал разработанного в скважине грунта и отработанного раствора бентонита.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС	Лист
						49

Рисунок 3.6.3 – Технологическая схема прокладки кожуха методом ГНБ на переходе трубопровода под дорогой

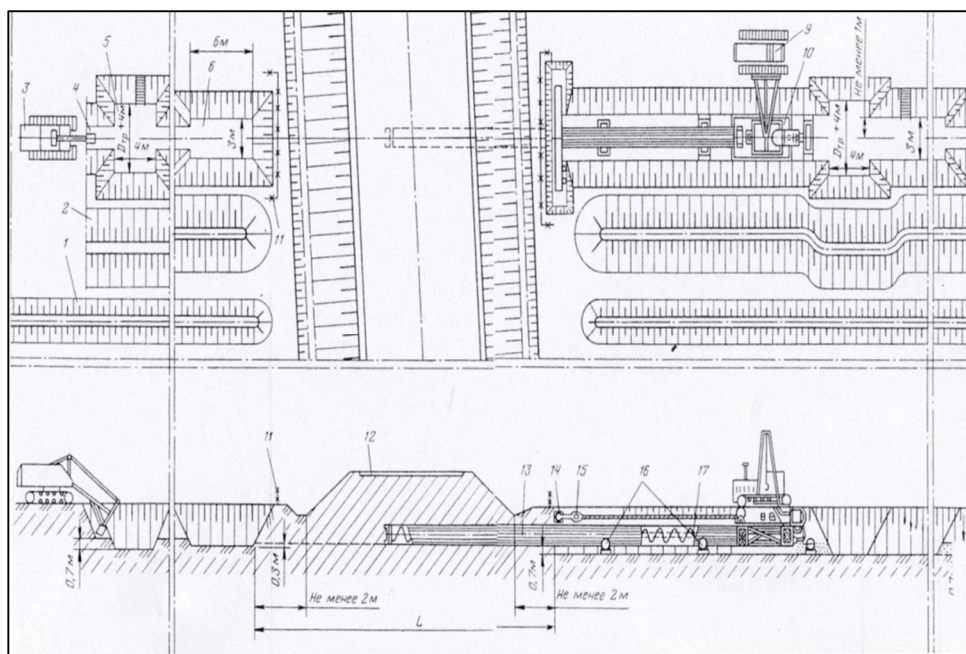

1, 2 – отвалы плодородного и минерального грунта; 3 – однокошовой экскаватор, 4 – траншея, 5 – приямок для сварки захлеста в котловане; 6 – приемный котлован; 7 – поперечная траншея для якоря; 8 – рабочий котлован; 9 – кран-трубоукладчик; 10 – установка горизонтального бурения (УГБ); 11 – инвентарное защитное ограждение; 12 – дорожное полотно; 13 – кожух; 14 – якорь (стальная труба); 15 – полиспаст; 16 – инвентарные роликоопоры; 17-шнек

Переходы закрытым методом предусмотрены через автомобильные дороги.

Контроль выполнения работ при закрытых способах прокладки газопровода

При закрытых способах прокладки газопроводов при проведении операционного контроля следует выполнять проверку правильности:

- закрепления оси перехода газопровода;
- размеров рабочего и приемного котлованов;
- крутизны откосов котлованов или их креплений, основания котлованов,
- упорных и опорных стенок;
- прокладки футляра;
- конструкции и расстановки диэлектрических опор на газопроводе;
- заделки концов футляра.

Для проверки правильности закрепления оси перехода газопровода необходимо проверить наличие плановых (осевых) знаков, определяющих ось трассы газопровода. Ось перехода должна быть закреплена при выполнении разбивочных работ и соответствовать проектной (рабочей) документации.

Контроль правильности закрепления оси перехода газопровода производится при выполнении разбивочных работ путем измерений с помощью лазерных приборов по ГОСТ Р 53340.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

34/2021-06-04-ПОС

Лист
50

Для проверки правильности размеров рабочего и приемного котлованов необходимо проверить их габариты с помощью измерительных приборов.

Ширина, длина и глубина рабочего и приемного котлованов должна быть не менее, указанной в проектной (рабочей) документации. Допустимые отклонения по вертикали должны быть не более 1% глубины заложения, по горизонтали не более 5%.

Контроль правильности длины и ширины рабочего и приемного котлованов производится с помощью рулетки по ГОСТ 7502 или лазерного прибора по ГОСТ Р 53340, глубины с помощью нивелира по ГОСТ 10528.

Проверку соответствия крутизны откосов котлованов или их креплений, основания котлованов, упорных и опорных стенок следует выполнять сличением отметок дна и верха котлована и заложение откосов с принятыми в проектной (рабочей) документации и ППР.

Крутизна откосов котлованов проверяется по замерам глубины котлованов и заложения откосов и должно проводиться проведением их измерений.

Контроль правильности глубины, и заложения откосов производится с помощью геодезических приборов по ГОСТ Р 53340, наличия креплений, упорных и опорных стенок - визуально.

Проверку правильности прокладки футляра закрытым способом следует выполнять сличением отметок верха футляра или оси футляра на входе и выходе из земли предусмотренным в проектной (рабочей) документации.

Отметки верха футляра и оси футляра проверяются с помощью измерений на соответствие проектной документации. Отклонение оси футляра от проектного положения допускается в пределах, установленных в инструкции по эксплуатации на оборудование, применяемого для закрытого способа прокладки.

Контроль правильности прокладки футляра (отметки верха футляра) производится с помощью геодезических приборов по ГОСТ Р 53340.

Проверку правильности расстановки диэлектрических опор на газопроводе и их конструкцию следует выполнять сличением с проектной документацией.

Выявленные в процессе контроля отклонения от проектной (рабочей) документации и требований нормативных документов в области стандартизации и технического регулирования или технологических инструкций должны быть исправлены до начала производства последующих работ.

По результатам операционного контроля должны составляться акты освидетельствования скрытых работ.

Сооружения на газопроводах

На сетях газораспределения монтируются следующие сооружения:

- колодцы;
- коверы;
- контрольные трубки;

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

34/2021-06-04-ПОС

- опознавательные знаки.

При разработке грунта под сооружения газопроводов необходимо руководствоваться следующими положениями:

- естественная структура грунта в основаниях при разработке котлована не должна быть нарушена;
- отметка экскавации грунта должна быть на 15-20 см выше отметки заложения подготовки фундамента сооружения. Окончательную зачистку котлована выполняют без применения средств механизации.

Монтаж колодца

Колодцы на сетях газораспределения могут быть следующих видов:

- сборные бетонные из бетонных блоков;
- сборные из железобетонных колец;
- полимеропесчаные.

Монтаж колодцев из сборных бетонных и железобетонных конструкций

До начала монтажа фундаментных блоков необходимо подготовить основание котлована. Для этого на дно котлована укладывают деревянную раму из брусков сечением 10 - 15 см. Размеры сторон рамы должны превышать соответствующие размеры днища колодца на 20 см. Раму следует уложить на грунт и выровнять по нивелиру или гидравлическому уровню так, чтобы верх ее соответствовал положению подошвы днища колодца. При устройстве монолитного железобетонного днища колодца, внутри рамы следует произвести подготовку, предусмотренную рабочей документацией, и одновременно при бетонировании днища установить сетку из арматурной стали по ГОСТ 5781 с соблюдением защитного слоя бетона, предусмотренного рабочей документацией. Способ приготовления и доставки бетона определяется в ППР. При устройстве сборного основания днища колодца в раме необходимо устроить песчаную подготовку, на которую укладывают железобетонные плиты основания колодцев.

После монтажа каждого ряда блоков по их верху укладывается цементный раствор, толщиной предусмотренной рабочей документацией, на который укладывается очередной ряд фундаментных блоков непосредственно перед их установкой. По осям следует проверить правильность укладки предыдущего блока, а при подаче крановщиком очередного блока необходимо развернуть его в требуемое положение. Средняя толщина швов допускается 15 мм.

После установки блока на место при помощи уровня проверяется его горизонтальность и положение блока относительно осей и не допускается их отклонение. В случае неправильного положения блока его необходимо приподнять и вновь установить с нужным смещением. Выступающий из-под блоков цементный раствор удаляется, а шов тщательно затирается снаружи и изнутри колодца. После этого заливают раствором вертикальные швы между блоками. Во избежание вытекания раствора вертикальные швы предварительно затирают цементным раствором. Аналогично выполняется монтаж железобетонных колец, при устройстве круглых сборных железобетонных колодцев.

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Лист	52
Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	34/2021-06-04-ПОС	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата			

В процессе монтажа стен колодца необходимо установить футляры, предусмотренные для пропуска газопроводов, зазоры заделываются бетонным раствором.

По верхнему ряду бетонных блоков (верхнему кольцу) должна устраиваться подготовка из цементного раствора, на которую монтируется сборное железобетонное перекрытие колодца.

На перекрытие колодца устанавливается горловина колодца, из сборных железобетонных колец, монтируемых аналогично стенам колодца.

Установка люка должна производиться в строгом соответствии с проектными отметками.

Для гидроизоляции стенок колодцев применяют оклеечную и (или) обмазочную гидроизоляцию. Оклеечная гидроизоляция применяется способом наклеивания рулонного материала (гидроизол, металлоизол и т.д.). Обмазочная гидроизоляция наносится горячими мастиками на черных вяжущих (битум, каменноугольном дегте) с наполнителем (асбест, молотый известняк и др.) в 2-3 слоя.

Наружные поверхности стен колодцев до нанесения изоляции должны быть подготовлены: устранены острые углы, заделаны стыки, швы, выбоины.

При обратной засыпке пазух котлована следует соблюдать осторожность с целью предотвращения повреждения изоляции.

Дорожная одежда при размещении колодца на проезжей части автодороги должна быть восстановлена. При размещении колодца вне проезжей части дорог следует устраивать отсыпку.

Монтаж ковера

Грунт над техническим устройством, вывод которого защищается ковером, уплотняется до отметок, предусмотренных в проектной документации. По уплотненному грунту устраивается щебеночная подготовка, на которую устанавливается опорное железобетонное кольцо, предусмотренное проектной документацией.

После выверки положения опорного железобетонного кольца на него устанавливается ковер.

Монтаж контрольной трубы

Монтаж контрольной трубы на стальном футляре газопровода, производится до протяжки газопровода в футляре, в процессе монтажа самого футляра.

Вырезка отверстия под установку контрольной трубы следует вести режущим инструментом (фрезами), вырезку отверстия газовым резаком не допускается, для предотвращения образования наплывов металла на внутренней поверхности футляра.

Приварка контрольной трубы к футляру ведется по технологии сварки, применяемой для сварки труб газопровода. Сварное соединение подвергается ВИК.

Контрольная труба на стальном футляре и место ее врезки в футляр изолируется аналогично основного газопровода.

Обратная засыпка места установки контрольной трубы выполняется без использования средств механизации, в процессе засыпки необходимо контролировать вертикальность контрольной трубы. В процессе засыпки необходимо избегать повреждения изоляции контрольной трубы.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	предусмотренных в проектной документации. По уплотненному грунту устраивается щебеночная подготовка, на которую устанавливается опорное железобетонное кольцо, предусмотренное проектной документацией. После выверки положения опорного железобетонного кольца на него устанавливается ковер. <u>Монтаж контрольной трубы</u> Монтаж контрольной трубы на стальном футляре газопровода, производится до протяжки газопровода в футляре, в процессе монтажа самого футляра. Вырезка отверстия под установку контрольной трубы следует вести режущим инструментом (фрезами), вырезку отверстия газовым резаком не допускается, для предотвращения образования наплывов металла на внутренней поверхности футляра. Приварка контрольной трубы к футляру ведется по технологии сварки, применяемой для сварки труб газопровода. Сварное соединение подвергается ВИК. Контрольная трубка на стальном футляре и место ее врезки в футляр изолируется аналогично основного газопровода. Обратная засыпка места установки контрольной трубы выполняется без использования средств механизации, в процессе засыпки необходимо контролировать вертикальность контрольной трубы. В процессе засыпки необходимо избегать повреждения изоляции контрольной трубы.
Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	34/2021-06-04-ПОС
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 53

Монтаж опознавательных знаков

Места установки опознавательных знаков по трассе подземного газопровода определяются проектной документацией.

Опознавательные знаки устанавливаются в пробуренные в грунте отверстия. Строительные машины и механизмы, применяемые для бурения, определяются в ППР.

Пробуренные до проектных отметок скважины заполняются бетоном, после чего устанавливается опознавательный знак, при этом защитный слой бетона должен быть не менее 10 см.

Особенности производства работ в зимних условиях

При монтаже сооружений на газопроводе следует выполнять следующие рекомендации:

- бетонные блоки и железобетонные изделия перед монтажом должны быть очищены от снега, ледяных корок. Очистка должна проводиться механическим способом или с помощью обогрева. Применение холодной и горячей воды не допускается;
- в случае применения растворов без пластификаторов и противоморозных добавок необходимо применять подогретый раствор. Раствор готовят непосредственно перед применением с использованием подогретых компонентов. Температура раствора перед его укладкой должна быть не менее 10 °С. Для контроля температуры раствора на стройплощадке должны использоваться термометры; в случае применения растворов с пластификаторами и противоморозными добавками раствор доставляют к месту монтажа автобетоносмесителями с заводов-изготовителей;
- монтаж блока следует производить сразу после укладки раствора, для предотвращения охлаждения раствора;
- при монтаже бетонных и железобетонных конструкций с использованием «тепляков» для обогрева зоны монтажа следует применять мобильные воздушонагреватели (электрические, газовые, жидкотопливные и т.п.). Температура внутри «тепляка» (не ниже 5 °С) и время ее поддержания определяется из условия набора раствором 20% от его проектной прочности. Данное условие выполняется при поддержании температуры в «тепляке» 5°С в течение 6 суток, 10°С в течении 7 суток, 15°С в течение 4 суток, 20°С в течение 3 суток.

Контроль выполнения работ по монтажу сооружений

В процессе монтажа сооружений при проведении операционного контроля следует выполнять проверку правильности:

- бетонных работ;
- монтажа сборных железобетонных конструкций;
- гидроизоляции сооружений;
- монтажа контрольной трубки;
- монтажа опознавательных знаков.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата						Лист 54
					34/2021-06-04-ПОС					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Результаты контроля бетона и выполненных бетонных работ должны отражаться в журнале и акте испытания конструкций.

Контроль работ по монтажу сборных железобетонных конструкций включает проверку:

- соблюдения технологии и последовательности выполнения монтажных работ, контроль осуществляется документарной проверкой, по записям в журнале работ;
- геометрических размеров и положения смонтированных частей сооружений, теодолитом или иными геодезическими приборами по ГОСТ 53340 на соответствие проектной (рабочей) документации.
- замоноличивания стыков железобетонных конструкций, визуалью на полноту заполнения шва раствором. Выявленные пустоты должны быть заполнены раствором.

Контроль за выполнением изоляционных работ внешних поверхностей стен колодцев следует выполнять в соответствии с требованиями СН РК 2.04-05-2014 и СП РК 2.04-108-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия» Адгезию покрытия контролируют в соответствии с ГОСТ 26589.

При монтаже контрольной трубки следует контролировать:

- вертикальность ее установки, при помощи уровней строительных по ГОСТ 9416, отклонения от вертикальности не допускаются;
- сварные соединения.

Контроль работ по монтажу опознавательного знака включает в себя:

- контроль бетонных работ;
- контроль вертикальности при помощи уровней строительных по ГОСТ 9416;
- контроль привязки опознавательного знака к оси трассы газопровода при помощи рулетки по ГОСТ 7502, на соответствие проектной (рабочей) документации.

По результатам операционного контроля должны составляться акты освидетельствования скрытых работ.

Соединения элементов газопроводов

Соединения подземных газопроводов подразделяются на:

- сварные стальных газопроводов, выполненные:
 - а) ручной дуговой сваркой;
- сварные полиэтиленовых газопроводов, выполненные;
 - а) сваркой нагретым инструментом встык;
 - б) сваркой с использованием деталей с ЗН;

Соединения подземных стальных газопроводов, выполненные сваркой по ГОСТ 5264, должны осуществляться сварщиками, аттестованными в установленном порядке в объеме, предусмотренном регламентами и Правилами безопасности.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Подп. и дата	Ине. № подл						Лист
													55
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС								

Операторы сварочных машин и специалисты сварочного производства по монтажу полиэтиленовых газопроводов должны быть аттестованы в порядке, установленном Технологическими регламентами и Правилами безопасности.

При подготовке сварочного оборудования, прежде всего, проверяется его комплектность согласно инструкции по эксплуатации. Если при выполнении сварки необходимы вспомогательные средства, не перечисленные в инструкции (ножи для снятия стружки, регулируемые опоры, средства контроля и т.п.), они должны быть предоставлены в распоряжение сварщика и использоваться в его работе.

Размещение сварочного оборудования должно производиться на заранее расчищенной и спланированной площадке или трассе газопровода после складирования на ней полиэтиленовых труб. Сварщик должен освободить вокруг места своей работы достаточную площадь для того, чтобы он мог без приложения особых усилий производить необходимые рабочие операции по подготовке сварного шва. При необходимости место сварки защищают от атмосферных осадков, пыли и песка при помощи тентов или палаток. В летнее время установка тента над зоной сварки будет способствовать более быстрому охлаждению сварного соединения. В сырую и дождливую погоду можно рекомендовать устанавливать сварочное оборудование на деревянные щиты. При сварке свободный конец трубы или плети закрывают инвентарными заглушками для предотвращения сквозняков внутри свариваемых труб.

Перед началом сварочных работ необходимо заварить (пробный) допускной стык и после получения удовлетворительных результатов качества стыка в аттестованной лаборатории приступить к сварке труб.

У каждого сварного соединения должно быть нанесено обозначение (цифровой или буквенный код) сварщика-оператора, выполнившего это соединение. Кроме этого, у каждого сварного соединения наносят его порядковый номер. Нанесение на трубу в зоне соединения кода оператора и порядкового номера стыка называют клеймом (маркировкой). Способ маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение установленного срока эксплуатации газопровода. Маркировку сварных стыков полиэтиленовых газопроводов производят несмываемым карандашом-маркером яркого цвета (например: белого или желтого). Маркировку (номер стыка и код оператора) наносят рядом со стыком со стороны, ближайшей заводской маркировки труб. Допускается маркировку (код оператора) производить клеймом на горячем расплаве грата через 20-40 секунд после окончания операции осадки в процессе охлаждения стыка в зажимах центриатора сварочной машины в двух диаметральных точках. Рекомендуется использовать клейма типа ПУ-6 или ПУ-8 по ГОСТ 2930.

Сварочные работы должны выполняться в соответствии с СП РК 4.03-101-2013, ГОСТ Р 55474, ГОСТ Р 55473.

Диаметр отверстия прокладки разъемного фланцевого соединения не должен быть меньше внутреннего диаметра трубы и должен соответствовать внутреннему диаметру уплотнительной поверхности фланца. Размеры прокладок должны соответствовать ГОСТ 15180.

Соединения элементов стальных газопроводов

Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных газопроводов должны соответствовать ГОСТ 16037 и требованиям СП РК 4.03-101-2013.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Ине. № подл.						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС					56	

Технология сварки газопроводов включает: подготовку труб к сварке, сборку стыков, базовую сварку труб в секции и сварку труб или секции в плеть.

При необходимости подготовка кромок под стандартную разделку выполняется механической обработкой или газовой резкой с последующей зачисткой шлиф-машинкой.

Перед сваркой труб необходимо:

- очистить до металлического блеска кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности труб, соединительных деталей газопроводов, патрубков, арматуры на ширину не менее 10 мм;
- проверить геометрические размеры кромок, выправить плавные вмятины на концах труб глубиной до 3,5% наружного диаметра трубы;
- очистить до чистого металла кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности труб на ширину не менее 10 мм.

Концы труб, имеющие трещины, надрывы, забоины, задиры фасок глубиной более 5 мм, обрезают.

Сборку стыков труб производят на инвентарных лежках с использованием наружных или внутренних центраторов.

Допускаемое смещение кромок свариваемых труб не должно превышать величины $0,15S + 0,5$ мм, где S - наименьшая из толщин стенок свариваемых труб.

Сварка стыков разнотолщинных труб или труб с соединительными деталями и патрубками арматуры допускается без специальной обработки кромок при толщине стенок менее 12,5 мм (если разность толщин не превышает 2,0 мм).

Сварка стыков производится в соответствии с ГОСТ 16037 при выполнении следующих требований:

- просвет между трубами, соединяемыми внахлест, не более 1 - 2 мм и равновелик по периметру;
- величина нахлеста по длине соединяемых труб не менее 3 см;
- на конце трубы меньшего диаметра выполняется фаска вовнутрь под углом не менее 45° на всю толщину стенки трубы;
- соединения свариваемых торцов после специальной подготовки (утонении) кромок изнутри или снаружи более толстостенного элемента с толщиной стенки S_3
- до толщины S_2 свариваемого торца (рисунок 2), которая не превышает 1,5 толщины менее толстостенного элемента S_1 .

Сборку под сварку труб с односторонним продольным или спиральным швом производят со смещением швов в местах стыковки труб не менее чем на:


- 15 мм – для труб номинальным диаметром до DN 50;
- 50 мм – то же от DN 50 до DN 100;
- 100 мм – « св. DN 100.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС					Лист
										57

При сборке под сварку труб, у которых швы сварены с двух сторон, допускается не производить смещение швов при условии проверки места пересечения швов физическими методами.

Для закрепления труб в зафиксированном под сварку положении электродами, применяемыми для сварки корневого шва, следует выполнять равномерно расположенные по периметру стыка прихватки в количестве:

- для труб номинальным диаметром до DN 80 - 2 шт.;
- для труб номинальным диаметром свыше DN 80 до DN 150 мм - 3 шт.;
- для труб номинальным диаметром свыше DN 150 до DN 300 мм - 4 шт.;
- для труб номинальным диаметром свыше DN 300 - через каждые 250 мм.

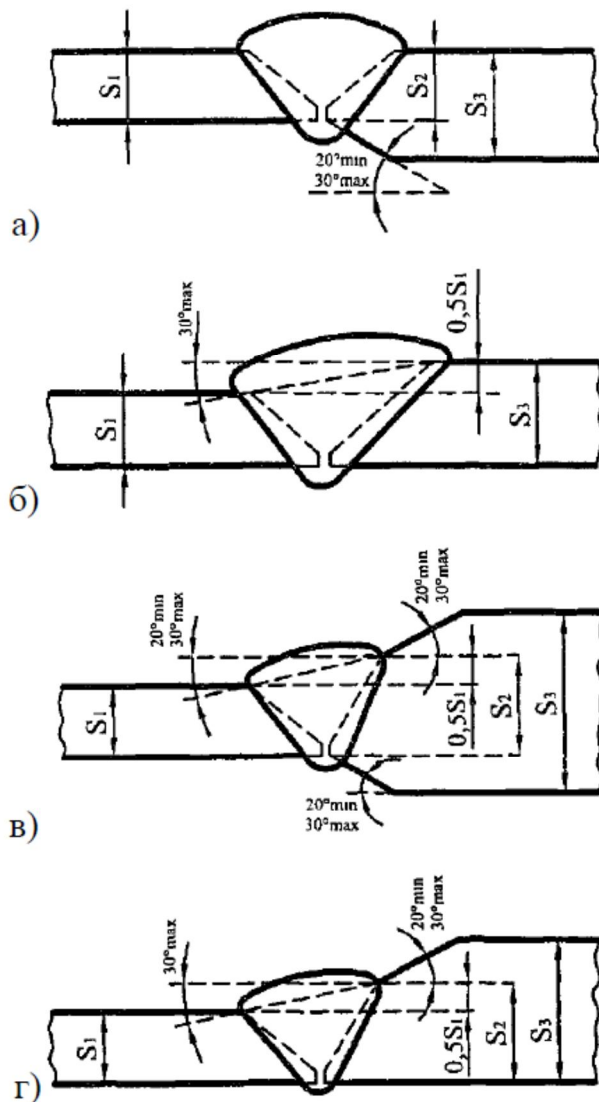

а) Обработка с внутренней стороны толщины S_3 до $S_2 = S_1$; б) Соединение $S_2 \leq 1,5S_1$ без обработки свариваемых торцов ($S_2 = S_3$); в) Обработка с внутренней и наружной стороны толщины S_3 до $S_2 \leq 1,5S_1$; г) Обработка с наружной стороны толщины S_3 до $S_2 \leq 1,5S_1$

Рисунок 3.6.4 - **Обработка свариваемых торцов труб**

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

34/2021-06-04-ПОС

Высота прихватки должна составлять 1/3 толщины стенки трубы, но не менее 2 мм; длина прихватки - 20 - 30 мм при номинальном диаметре стыкуемых труб до 50; 50 - 60 мм - при номинальном диаметре стыкуемых труб более DN 50.

Перед началом выполнения сварочных работ поворотных и неповоротных стыков труб производится просушка или подогрев торцов труб и прилегающих к ним участков.

Просушку торцов труб путем нагрева на 50 °С рекомендуется производить:

- при наличии влаги на трубах независимо от температуры окружающего воздуха;
- при температуре окружающего воздуха ниже 5 °С.

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, грозы, снегопада, тумана и при ветре скоростью свыше 10 м/с можно выполнять при условии обеспечения защиты места сварки от неблагоприятных природных воздействий.

Необходимость предварительного подогрева стыков определяют в зависимости от марок стали свариваемых труб, подразделяющихся на следующие группы.

- I - трубы из спокойных (сп) и полуспокойных (пс) сталей марок: Ст3 по ГОСТ 380; 08, 10, 15 и 20 по ГОСТ 1050;
- II - трубы из кипящих (кп) сталей марок: Ст3, по ГОСТ 380;
- III - трубы из низколегированных сталей марок: 09Г2С, 17ГС, 17Г1С по ГОСТ 19281; марки 10Г2 по ГОСТ 1050.

Предварительный подогрев стыков производят при сварке труб с толщиной стенки от 5 до 10 мм электродами с рутиловым или целлюлозным покрытием при температуре наружного воздуха: ниже «минус» 20 °С - для труб I и II групп, ниже «минус» 10 °С - для труб III группы. При сварке при температуре «минус» 10 °С подогрев труб с толщиной стенки более 10 мм обязателен. Минимальная температура подогрева должна составлять 100 °С и измеряться на расстоянии 5- 10 мм от кромки трубы. Температуру предварительного подогрева контролируют контактными термометрами или термокарандашами. Место замера температуры контактными термометрами следует предварительно зачистить металлической щеткой. При необходимости просушки, и подогрева стыка, производится только подогрев стыка.

Не рекомендуется зажигать дугу с поверхности трубы. Дуга зажигается с поверхности разделки кромок или же с поверхности металла уже выполненного шва.

При применении для сборки стыка наружных центраторов снимать их допускается после сварки не менее 50% стыка. При этом отдельные участки шва равномерно располагают по периметру стыка. Перед продолжением сварки корневого шва после снятия центратора все сваренные участки зачищают, а концы швов прорезают углошлифовальной машинкой.

До полного завершения корневого слоя шва не рекомендуется перемещать свариваемый стык.

Для предупреждения образования дефектов между слоями сварного шва перед выполнением каждого последующего слоя поверхность предыдущего слоя очищают от шлака и брызг.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Предварительный подогрев стыков производят при сварке труб с толщиной стенки от 5 до 10 мм электродами с рутиловым или целлюлозным покрытием при температуре наружного воздуха: ниже «минус» 20 °С - для труб I и II групп, ниже «минус» 10 °С - для труб III группы. При сварке при температуре «минус» 10 °С подогрев труб с толщиной стенки более 10 мм обязателен. Минимальная температура подогрева должна составлять 100 °С и измеряться на расстоянии 5- 10 мм от кромки трубы. Температуру предварительного подогрева контролируют контактными термометрами или термокарандашами. Место замера температуры контактными термометрами следует предварительно зачистить металлической щеткой. При необходимости просушки, и подогрева стыка, производится только подогрев стыка. Не рекомендуется зажигать дугу с поверхности трубы. Дуга зажигается с поверхности разделки кромок или же с поверхности металла уже выполненного шва. При применении для сборки стыка наружных центраторов снимать их допускается после сварки не менее 50% стыка. При этом отдельные участки шва равномерно располагают по периметру стыка. Перед продолжением сварки корневого шва после снятия центратора все сваренные участки зачищают, а концы швов прорезают углошлифовальной машинкой. До полного завершения корневого слоя шва не рекомендуется перемещать свариваемый стык. Для предупреждения образования дефектов между слоями сварного шва перед выполнением каждого последующего слоя поверхность предыдущего слоя очищают от шлака и брызг.						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС					Лист
										59

Для облегчения удаления шлака рекомендуется подбирать режимы сварки, обеспечивающие вогнутую (менискообразную) форму поверхности корневого и заполняющих слоев.

Начало и конец кольцевого сварного шва должны отстоять от заводского шва трубы (детали, арматуры) не менее:

- 50 мм - для номинальных диаметров менее DN 400;
- 75 мм – для номинальных диаметров от DN 400 до DN 1000;
- 100 мм - для номинальных диаметров более DN 1000.

Места начала и окончания сварки каждого слоя («замки» шва) располагают для труб номинальным диаметром DN 400 и более не ближе 100 мм от «замков» предыдущего слоя шва; для труб номинальным диаметром менее DN 400 - не ближе 50 мм.

Неразъемные соединения элементов стальных газопроводов, выполненные дуговой сваркой

При сборке газопроводов под сварку в целях безопасности не допускается передача нагрузки на сварной стык до его полного остывания после сварки и термообработки.

Длину прямого участка между сварными швами двух соседних гибов рекомендуется принимать не менее 100 мм.

При применении крутоизогнутых отводов допускается расположение сварных соединений в начале изогнутого участка и сварка между собой отводов без прямых участков.

Расстояние между соседними сварными соединениями и длину кольцевых вставок при вварке их в трубопровод рекомендуется принимать равным не менее 100 мм.

Ручную дуговую сварку стыков труб при толщине стенок до 6 мм выполняют не менее чем в два слоя, при толщине стенок более 6 мм - не менее чем в три слоя.

Автоматическую дуговую сварку под флюсом выполняют по первому слою, сваренному ручной дуговой сваркой (теми же электродами, которыми прихватывались стыки) или сваркой в среде углекислого газа.

При сварке труб газопроводов из сталей с различными пределами текучести, электроды следует применять по более высокому пределу текучести.

Соединения элементов полиэтиленовых газопроводов

Неразъемные соединения полиэтиленовых газопроводов выполняются сваркой встык нагретым инструментом и при помощи соединительных деталей с ЗН согласно ГОСТ Р 55473.

К выполнению сварочных работ допускается только квалифицированный персонал, обученный и аттестованный для выполнения работ по сварке полиэтиленовых газопроводов в соответствии с правилами РК.

Сварные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ16310, ГОСТ Р 55473 и Сводом правил СП РК 4.03-101-2013.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	трубопровод рекомендуется принимать равным не менее 100 мм. Ручную дуговую сварку стыков труб при толщине стенок до 6 мм выполняют не менее чем в два слоя, при толщине стенок более 6 мм - не менее чем в три слоя. Автоматическую дуговую сварку под флюсом выполняют по первому слою, сваренному ручной дуговой сваркой (теми же электродами, которыми прихватывались стыки) или сваркой в среде углекислого газа. При сварке труб газопроводов из сталей с различными пределами текучести, электроды следует применять по более высокому пределу текучести. <u>Соединения элементов полиэтиленовых газопроводов</u> Неразъемные соединения полиэтиленовых газопроводов выполняются сваркой встык нагретым инструментом и при помощи соединительных деталей с ЗН согласно ГОСТ Р 55473. К выполнению сварочных работ допускается только квалифицированный персонал, обученный и аттестованный для выполнения работ по сварке полиэтиленовых газопроводов в соответствии с правилами РК. Сварные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ16310, ГОСТ Р 55473 и Сводом правил СП РК 4.03-101-2013.
					34/2021-06-04-ПОС Лист 60
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Сварочные работы могут производиться при температуре окружающего воздуха от «минус» 15 °С до «плюс» 45°С.

Сваркой встык нагретым инструментом соединяются трубы и соединительные детали толщиной стенки по торцам более 5,0 мм.

Сборку и сварку труб и соединительных деталей рекомендуется производить на сварочных машинах с высокой и средней степенью автоматизации процесса сварки. Допускается также использовать машины с ручным управлением процессом сварки, но с обязательным автоматическим поддержанием заданной температуры нагретого инструмента.

Сваркой деталями с 3Н соединяются трубы независимо от диаметра и толщины стенки.

Производство сварочных работ включает подготовительные работы и сварку труб и соединительных деталей.

Подготовительные работы для обоих способов сварки включают:

- подготовку и проверку работоспособности сварочного оборудования;
- подготовку места сварки и размещение сварочного оборудования;
- выбор необходимых параметров сварки;
- закрепление и центровку труб и деталей в зажимах центратора сварочной машины или позиционера;
- механическую обработку (протирка для деталей с 3Н) торцов свариваемых поверхностей труб и деталей.

Перед началом сварочных работ необходимо заварить (пробный) допускной стык и после получения удовлетворительных результатов качества стыка в аттестованной лаборатории приступить к сварке труб.

Для крепления труб при стыковой сварке подбираются зажимы и вкладыши, соответствующие диаметру свариваемых труб. Вкладыши зажимных устройств должны быть чистыми, без сколов и заусенцев, которые могли бы повредить поверхность труб. Трущиеся поверхности металлических деталей покрываются смазками, следуя рекомендациям изготовителя. Рабочие поверхности нагревателя и инструмента для обработки полиэтиленовых труб (торцеватели, скребки, зачистные оправки) очищаются от пыли и остатков полиэтилена при помощи чистых и сухих хлопчатобумажных или льняных тканей (или деревянных лопаточек), а при необходимости протираются растворителями. Очистку нагревателя от остатков налипшего полиэтилена производят в горячем состоянии. Электрические кабели полностью разматывают и присоединяют к автономным источникам питания или электрической сети переменного тока. Чтобы не повредить гидравлические шланги и электропровода, необходимо следить, чтобы они не подвергались перегибам. При расстановке оборудования шланги не должны натягиваться.

Работоспособность оборудования определяется при визуальной проверке комплектующих узлов сварочных машин, аппаратов, приспособлений и их контрольном включении. У сварочных машин стыковой сварки проверяют плавность перемещения подвижного зажима центратора и работу торцевателя.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС					61

Выбор необходимых параметров сварки производится в зависимости от используемого способа сварки - сваркой встык нагретым инструментом или при помощи соединительных деталей с ЗН.

Параметры технологических режимов стыковой сварки нагретым инструментом приведены в СП 42-101-2003, а параметры технологических режимов сварки с деталями с ЗН должны соблюдаться в соответствии с штрих-кодами деталей.

Перед сборкой и сваркой концы труб и присоединительные части соединительных деталей, предназначенные для стыковой сварки, тщательно очищают и протирают внутри и снаружи от всех загрязнений на расстояние не менее 50 мм от торцов. Очистку производят сухими или увлажненными полотенцами (ветошью) с дальнейшей протиркой насухо. Если концы труб или деталей окажутся загрязненными смазкой, маслом или какими-либо другими жирами, их обезжиривают с помощью растворителей на немасляной основе.

Концы труб, подготавливаемых под сварку деталями с ЗН, проверяют, чтобы они были обрезаны ровно. Концы труб деформированные, или имеющие глубокие (более 4-5 мм) забоины, обрезают. Полиэтиленовая труба отрезается под прямым углом ручными ножницами или труборезом.

Максимальный допуск косого реза, возможный при сварке труб деталями с ЗН, приведен в Своде правил СП 42-101-2003.

После очистки концов труб производится их механическая обработка (зачистка) с целью удаления оксидного слоя.

При стыковой сварке зачистка осуществляется с помощью торцовочных устройств, при сварке деталями с ЗН - вращающихся оправок для зачистки, скребков или универсальных зачистных механизмов, которые позволяют обрабатывать трубы определенного размерного ряда: 20-90 мм, 63-225 мм, 90-500 мм.

При использовании деталей с ЗН удаление как минимум 0,1-0,2 мм поверхностного слоя полиэтиленовой трубы является необходимым, максимальные же значения зависят от наружного диаметра трубы. При отсутствии плюсовых допусков по диаметру трубы, существует опасность чрезмерной обработки, в этом случае для зачистки целесообразно использовать ручной скребок, который позволяет снимать более тонкую стружку толщиной до 0,1 мм.

При стыковой сварке нагретым инструментом механическая обработка торцов труб производится после их закрепления в зажимах центратора. Труба обрабатывается снаружи на длину приблизительно 1,2 Dn от глубины посадки детали. Для седловых отводов зачищается место на трубе, где они будут установлены с припуском 5-10 мм с каждой стороны седла отвода. Толщина снимаемого слоя зависит от допуска по диаметру трубы и не должна приводить к появлению недопустимых зазоров между трубой и деталью. Сами детали с закладными нагревателями механической обработке не подвергаются из-за возможности повредить спираль.

Сборку свариваемых труб и деталей, включающую установку, центровку и закрепление свариваемых концов, производят в зажимах центратора сварочной машины или позиционера. Рекомендуемый вылет концов труб из центратора при стыковой сварке нагретым инструментом составляет 15-30 мм (иногда до 50 мм), деталей с короткими хвостовиками - не менее 5 мм, с удлиненными - 10-15 мм. Вылет концов

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Подп. и дата	Ине. № подл.						Лист
													62
								34/2021-06-04-ПОС					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата									

труб из позиционера при сварке деталями с ЗН должен составлять 5-15 см. Зажимы стягивают так, чтобы предотвратить проскальзывание труб при приложении к ним усилия сварки и устранить овальность на торцах. Сильнее или слабее затягивая двусторонние крепления верхнего полукольца зажимов, можно добиться небольшой радиальной подгонки труб в пределах $\pm 1-2$ мм. Под свободные концы труб устанавливают опоры, чтобы выровнять их в горизонтальной плоскости.

Концы труб и деталей при сварке нагретым инструментом встык центруют по наружной поверхности таким образом, чтобы максимальная величина смещения кромок не превышала 10% номинальной толщины стенки свариваемых труб.

Центрация труб при сварке деталями с ЗН производится до величины, позволяющей без усилия установить привариваемую деталь между торцами труб. Оси свариваемых труб и деталей должны быть параллельны, без перекосов во избежание непровара. Концы труб, входящие в соединительные детали, не должны находиться под действием изгибающих напряжений и под действием усилий от собственного веса. Муфты после монтажа должны свободно вращаться от нормального усилия руки. Для того чтобы на зону соединения не передавались внешние нагрузки, трубы закрепляют в зажимных приспособлениях - позиционерах. Закрепление труб в позиционере является обязательной операцией. Трубы должны находиться в закреплённом положении до окончания фазы остывания сварного соединения.

После механической обработки загрязнение поверхности торцов не допускается. Удаление стружки из полости трубы или детали производят с помощью кисти, а снятие заусенцев с острых кромок торца - с помощью ножа.

При отсутствии на соединительных муфтах центрирующего упора (например, при врезке ответвлений в действующие газопроводы) перед тем, как надвигать муфту на трубы, производят разметку глубины, на которую должна быть надвинута муфта. Разметку глубины целесообразно производить после механической зачистки и протирки.

Соединения полиэтиленовых труб сваркой нагретым инструментом встык и с использованием деталей с ЗН

Во избежание термического ожога не допускается касаться поверхности зеркала нагревателя в период его работы.

Не допускается при работе механизированного оборудования производить замеры обрабатываемых труб или убирать стружку из-под режущего инструмента.

Неразъемное соединение полиэтилен-сталь

Вварку неразъемных соединений в газопровод при использовании технологии стыковой сварки и сварки с помощью деталей с ЗН производят в следующей последовательности:

- производят сборку и сварку труб из полиэтилена встык или сборку и сварку труб из полиэтилена с помощью детали с ЗН;
- осуществляют подгонку и сварку металлических труб.

Ине. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Ине. № подл

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

34/2021-06-04-ПОС

Перед монтажом на трассе рекомендуется в базовых условиях предварительно приварить к стальному участку перехода металлический патрубок длиной 0,5-0,8 м для обеспечения большего удобства при подгонке труб. Продольные (заводские) швы стальных труб должны быть смещены поворотом вокруг продольной оси относительно друг друга. При подгонке стальных труб в захлесте газовую резку и шлифовку кромок труб следует производить на конце стального газопровода, а не патрубка неразъемного соединения.

В процессе подгонки и сборки стального стыка, выполнения прихваток и последующей электродуговой сварки полиэтиленовый патрубок должен быть защищен от брызг металла и шлаков. Зона раструбного соединения «полиэтилен -сталь» не должна нагреваться свыше 50-60 °С.

Особенности соединения элементов газопроводов в зимних условиях

Кромки свариваемых труб должны быть тщательно очищены от льда, снега, ржавчины и просушены на ширину 100—150 мм с каждой стороны.

Сушку кромок целесообразно производить нагревом до температуры 100 – 150°С токами промышленной частоты или газовыми горелками. Температура сушки кромок определяется термокарандашами или каплями воды. Последние должны кипеть, попадая на только что просушенную кромку.

Все материалы должны храниться в сухом отапливаемом помещении. Сварочная проволока перед сваркой очищается от ржавчины, а электроды дополнительно испытываются. Флюс должен быть сухим.

Для сварки газопроводов при толщине стенки трубы до 16 мм и температуре наружного воздуха ниже «минус» 20°С требуется предварительный подогрев. При сварке шунтирующей перемычки предварительный подогрев требуется при температуре ниже «минус» 10°С.

Во всех этих случаях допускается сварка без подогрева при температурах на 10°С ниже указанных, но с соблюдением следующих условий:

- ручная сварка должна выполняться электродами типа Э-42А с покрытием основного типа (УОНИ-13/45, УП-2, СМ-11 и др.);
- автоматическая сварка под флюсом должна выполняться на постоянном токе обратной полярности, желательно в несколько проходов.
- режимы сварки (изменение величины сварочного тока) должны повышаться против обычных на 4—5% при понижении температуры воздуха на каждые 10 °С.

Для повышения погонной энергии при автоматической сварке под флюсом рекомендуется увеличивать напряжение на дуге, что обеспечивает введение дополнительного тепла в сварочную ванну, а также некоторое уширение шва, которое создает лучшие условия для кристаллизации и дегазации металла шва.

В процессе сварки при низкой температуре нужно соблюдать мероприятия по уменьшению скорости охлаждения сварных швов.

К числу таких мероприятий относятся:

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС					Лист
										64

- применение вместо ручной сварки автоматической под флюсом (если позволяет конструкция сварных соединений), дающей большое количество шлаков, медленно отдающих тепло. Переход тепла от шлака к металлу уменьшает перепад температур и благоприятствует раскислению наплавленного металла.
- при температурах ниже «минус» 10°C повышение погонной энергии сварки (режимов) на 4—5% на каждые 10°C понижения температуры окружающего воздуха. Для повышения погонной энергии при автоматической сварке под флюсом рекомендуется увеличивать напряжение на дуге, что обеспечивает введение дополнительного тепла в сварочную ванну, а также некоторое уширение шва, которое создает лучшие условия для кристаллизации и дегазации металла шва.
- выбор наиболее благоприятной формы поперечного сечения шва, обеспечивающего более полную дегазацию металла шва;
- наложение каждого последующего слоя при многослойной сварке на неостывший предыдущий слой. Длина свариваемых участков должна уточняться в каждом конкретном случае в зависимости от условий сварки и температуры воздуха. Допускается применять способ сварки двойным швом, горкой или секциями, если это предусмотрено проектной (рабочей) документацией. При сварке труб с толщиной стенки до 10 мм длина свариваемого участка может приблизительно составлять при ручной сварке 1 м, а при автоматической сварке под флюсом не ограничена.
- устранение действия ветра, сквозняков, снега, способствующих увеличению теплоотдачи в окружающее пространство. На открытых площадках, где возможны сильные ветры или снежная пурга, необходимо применять особые защитные устройства, предохраняющие сварное соединение и сварщика от влияния внешних атмосферных воздействий.
- предварительный и сопутствующий (в процессе сварки) подогрев кромок перед сваркой. Оптимальной температурой подогрева конструкций из углеродистых сталей является температура 150 – 250°C, а ширина зоны подогрева в каждую сторону от оси шва не менее 150 мм.

Для получения плотных швов в зимних условиях целесообразно применять многослойную сварку. При автоматической сварке необходимо применять постоянный ток.

При транспортировании и укладке сваренных плетей труб нужно избегать резких ударов, особенно по швам и околошовной зоне.

Перед началом сварки все прихватки (во избежание использования лопнувших) должны быть осмотрены. Прихватки с трещинами следует удалять резакон, а затем по нагретому металлу выполнить новые прихваточные швы.

Окончательный осмотр и приемку сварных соединений следует производить через 3 - 4 дня после окончания сварки. Рекомендуется также дополнительно осматривать сварные конструкции после первого резкого похолодания, наступившего после окончания сварочных работ.

Особенности сварки полиэтиленовых газопроводов в зимних условиях:

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Ине. № подл.						Лист 65
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС						

При выполнении сварочных работ при температурах окружающего воздуха ниже «минус» 10 °С определяется особый технологический режим сварки, который должен быть аттестован.

Контроль соединений газопроводов

Соединения газопроводов подвергаются визуально - измерительному контролю, контролю физическими методами в соответствии с ГОСТ 3242 (ГОСТ Р 55724 для ультразвукового метода контроля и ГОСТ 7512 для радиографического метода контроля).

Визуально-измерительный контроль осуществляется в 100% объеме всех соединений. При обнаружении дефектов соединения бракуются и подлежат исправлению, а соединения вызывающие сомнения в своем качестве подвергаются физическим методам контроля.

После замены дефектных участков сварные соединения подлежат 100% контролю ВИК и физическим методом.

По результатам всех видов контроля составляются соответствующие протоколы проверки сварных и паяных соединений, которые оформляются в соответствии с ГОСТ Р 55 724, ГОСТ 26126.

Контроль сварных соединений стальных газопроводов

При проведении ВИК выявляют наличие пор, поверхностные трещины, подрезы, прожоги, наплывы, кратеры, раковины и другие несплошности и дефекты формы швов; не соответствие геометрических размеров сварных швов. Стыки, сваренные дуговой или газовой сваркой, по результатам внешнего осмотра должны соответствовать ГОСТ 16037.

Выполнению сварочно-монтажных работ должен предшествовать входной контроль за качеством поступающей в монтаж продукции и соответствием её требованиям проекта; при этом качество (в т.ч. геометрические размеры) труб, деталей трубопроводов, запорной и распределительной арматуры и сварочных материалов должно удовлетворять требованиям ГОСТ или ТУ, а номенклатура указанной продукции должна соответствовать приложенным к ней сертификатным (паспортным) данным и отвечать требованиям проекта.

По результатам входного контроля, осуществляемого линейными ИТР, запрещается принимать в монтаж продукцию, не соответствующую требованиям проекта (за исключением случаев, когда имеется соответствующее согласование проектной организации) или не удовлетворяющую по качеству требованиям ГОСТ или ТУ.

В процессе выполнения сборочно-сварочных работ линейные ИТР должны осуществлять операционный контроль в объеме 100% за качеством каждой из технологических операций (вплоть до завершения сварки), в т.ч. их последовательностью и соблюдением временных интервалов, обеспечивая неукоснительное выполнение всех требований по сборке и сварке, регламентируемых ведомственными нормативными документами.

Выполненные сварные соединения стальных газопроводов, удовлетворяющие по результатам визуального осмотра и измерений геометрических размеров требованиям нормативных документов, должны подвергаться контролю физическими методами в объеме указанном в таблице 3.1.7.1.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС	66

Ультразвуковой метод контроля сварных стыков стальных газопроводов применяется при условии проведения выборочной проверки не менее 10 % стыков радиографическим методом. При получении неудовлетворительных результатов радиографического контроля хотя бы на одном стыке объем контроля следует увеличить до 50 % от общего числа стыков.

Таблица 3.6.4 - **Число стыков, подлежащих контролю, % общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте (табл.22 СП РК 4.03-101-2013)**

Газопроводы	Число стыков, подлежащих контролю, % общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте
3 Газопроводы ГРП	100
5 Надземные газопроводы природного газа	5, но не менее одного стыка
3 Подземные газопроводы природного газа давлением: - до 0,005 МПа - св. 0,005 до 0,3 МПа - св. 0,3 до 1,2 МПа	10, но не менее одного стыка 50, но не менее одного стыка 100
7 Подземные газопроводы всех давлений, прокладываемые под проезжей частью улиц с капитальными типами дорожных одежд, а также на переходах через водные преграды во всех случаях прокладки газопроводов в футлярах (в пределах перехода и по одному стыку в обе стороны от пересекаемого сооружения)	100
8 Подземные газопроводы всех давлений при пересечении с коммуникационными коллекторами, каналами, тоннелями (в пределах пересечений и по одному стыку в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений)	100
9 Надземные газопроводы всех давлений на участках переходов через автомобильные категории I-III, магистральные дороги и улицы	100
11 Подземные газопроводы всех давлений, прокладываемые на расстоянии по горизонтали в свету менее 3 м от коммуникационных коллекторов и каналов (в том числе каналов тепловой сети)	100
14 Подземные газопроводы природного газа св. 0,005, прокладываемые вне населенных пунктов за пределами черты их перспективной застройки	20, но не менее одного стыка
Примечания 1 Для проверки следует отбирать сварные стыки, имеющие худший внешний вид. 2 Процент контроля сварных соединений газопроводов следует устанавливать с учетом реальных условий прокладки 3 Соединения труб газопроводов, швы приварки к газопроводам фланцев и плоских заглушек, сварные стыки соединительных деталей стальных газопроводов, изготовленные в условиях ЦЗЗ, ЦЗМ, неповоротные и сваренные после производства испытаний монтажные стыки стальных газопроводов подлежат 100 % - ному контролю физическими методами	

Ине. № подп	Подп. и дата
	Взам. инв. №
	Ине. № дубл.
	Подп. и дата
	Ине. № подп

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

34/2021-06-04-ПОС

Для возможности проведения контроля нижней части стыка трубопровод должен быть уложен на инвентарные опоры высотой не менее 500 мм. При контроле потолочной части сварных стыков необходимо обеспечить дефектоскописта утепленным ковриком, изготовленным из влагонепроницаемого материала.

Контроль неразрушающим методом (просвечивание) сварных швов трубопровода (методом рентгенодефектоскопии или гамма-дефектоскопии) разрешается проводить при условии, если фактическая мощность дозы излучения на ближайших рабочих местах не будет превышать 0,3 мБэр/ч (2,18х11 А/кг).

Для каждого источника излучения (гамма-дефектоскопа) до начала работы должно быть определено безопасное расстояние. Опасную зону, в пределах которой мощность дозы излучения превышает 0,3 мБэр/ч (2,18х11 А/кг), следует обозначить знаками радиационной опасности и предупреждающими надписями, хорошо видимыми на расстоянии не менее 3 метров.

Просвечивание рекомендуется проводить в нерабочее время.

В зоне просвечивания запрещается находиться людям. Если дефектоскопист по каким-либо причинам не может наблюдать за запретной зоной, охрана ее возлагается на рабочего, которого выделяет мастер (прораб). Дефектоскопист обязан проинструктировать этого рабочего по технике безопасности на рабочем месте с оформлением инструктажа в специальном журнале или карточке.

По результатам проверки радиографическим методом стыки следует браковать при наличии следующих дефектов:

- трещин, прожогов, незаваренных кратеров;
- непровара по разделке шва;
- непровара в корне шва и между валиками глубиной более 10% толщины стенки трубы;
- непровара в корне шва и между валиками свыше 25 мм на каждые 300 мм длины сварного соединения или свыше 10% периметра при длине сварного соединения менее 300 мм;
- непровара в корне шва в стыках газопроводов диаметром 920 мм и более, выполненных с внутренней подваркой;
- непровара в корне шва в сварных соединениях, выполненных с подкладным кольцом;
- если размеры дефектов стыков (пор, шлаковых и других включений) превышают установленные для класса 6 по ГОСТ 23055.

По результатам ультразвукового контроля стыки следует браковать при наличии дефектов, площадь которых превышает площадь отверстия в стандартных образцах предприятия, прикладываемых к ультразвуковому аппарату, а также при наличии дефектов протяженностью более 25 мм на 300 мм длины сварного соединения или на 10% периметра при длине сварного соединения менее 300 мм.

При выявлении недопустимых дефектов сварных соединений стальных газопроводов при контроле ВИК и физическими методами необходимо вырезать дефектное соединение с участком газопровода на расстояние не менее 20 см от дефектного соединения и заварить стык вновь по принятой технологии.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Лист
34/2021-06-04-ПОС						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Контроль сварных соединений полиэтиленовых газопроводов

Контролю физическими методами подлежат соединения полиэтиленовых газопроводов, сваренных сваркой нагретым инструментом встык.

Соединения полиэтиленовых газопроводов подлежат контролю ультразвуковым методом по ГОСТ Р 55724. Обязательному контролю физическими методами не подлежат стыки полиэтиленовых газопроводов, выполненные на сварочной технике высокой степени автоматизации и сварные соединения, выполненные при помощи деталей с закладными нагревательными элементами.

Допускается уменьшать количество контролируемых стыков, сваренных с использованием сварочной техники средней степени автоматизации на 60%.

Обязательному контролю физическими методами не подлежат соединения полиэтиленовых газопроводов, выполненных при помощи деталей с закладными нагревательными элементами, а также сварные соединения, выполненные на сварочной технике высокой степени автоматизации.

Предельно допустимые размеры и количество дефектов приведены в СП 42-101-2003.

При выявлении не допустимых дефектов сварных соединений полиэтиленовых газопроводов при контроле (ВИК, физическими методом) необходимо вырезать дефектное соединение с участком газопровода и заварить стык вновь по принятой технологии.

При производстве работ по контролю сварных соединений физическим методом следует руководствоваться требованиями безопасности, приведенными в ГОСТ 7512 (раздел 7), ГОСТ Р 55724 (раздел 5), а так же инструкций изготовителей оборудования, применяемого для контроля физическими методами.

Строительство и монтаж средств ЭХЗ

Монтажная организация должна производить предварительную заготовку основных монтажных узлов и блоков.

После окончания монтажа установок ЭХЗ и составления соответствующего акта приемки производятся пуско-наладочные работы, выполняемые аттестованными специалистами специализированной организации.

Места размещения установок ЭХЗ и прокладки кабелей должны соответствовать проектной документации.

Монтаж на объектах строительства установок ЭХЗ должен осуществляться по технологическим картам, предусмотренным ППР и включать в себя:

- монтаж оборудования;
- установку анодных заземлителей;
- установку защитного заземления;
- прокладку кабельных линий;
- подключение кабельных линий к защищаемому сооружению и элементам установки ЭХЗ;

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС	Лист
						69

- индивидуальное опробование электрических коммуникаций и установленного оборудования;
- подключение оборудования к источнику электроэнергии.

Монтаж установки катодной защиты

При монтаже установки катодной защиты должны быть выполнены следующие работы:

- монтаж станции катодной защиты (СКЗ)
- установка стационарных электродов сравнения;
- установка контрольно-измерительных пунктов (КИП);
- монтаж анодных заземлителей;
- прокладка кабельных линий;
- монтаж защитного заземления;
- монтаж узлов присоединения кабелей к защищаемому сооружению и анодному заземлению.

Монтаж СКЗ в зависимости от ее модификации осуществляется:

- в соответствии с инструкцией по эксплуатации и монтажу;
- непосредственно на монолитном фундаменте с креплением ее к анкерным болтам фундамента. Затягивание гаек должно проводиться до упора гаечным ключом;
- на металлической раме, поставляемой на площадку строительства вместе со станцией и закрепляемой к фундаменту. Затягивание гаек должно проводиться до упора гаечным ключом.

Монтаж СКЗ наружной установки или в блок-боксе должен производиться без использования средств механизации, при массе станции до 50 кг или с помощью грузоподъемных механизмов и строповочных устройств при массе свыше 50 кг.

Установка блока с размещенным в нем СКЗ должна производиться по аналогии с монтажом СКЗ наружной установки на монолитном фундаменте.

Установка стационарных электродов сравнения должна отвечать следующим требованиям:

- медносульфатные электроды сравнения допускается использовать после проведения лабораторного предустановочного контроля, которым строительная организация проверяет переходное сопротивление «электрод- влагонасыщенный песок». Переходное сопротивление «электрод - влагонасыщенный песок» измеряют с помощью омметра и его величина не должна превышать 15 кОм.
- проверенные медносульфатные электроды сравнения погружают в заранее пробуренные скважины, заполненные незамерзающим электролитом так, чтобы дно корпуса находилось на уровне нижней образующей трубопровода и на 100 мм от его боковой поверхности. При этом плоскость датчика должна быть перпендикулярна к оси трубопровода, а на боковой поверхности трубопровода не должно быть дефектов в изоляции. Провода от электродов сравнения протягиваются в КИПы, которые устанавливаются в заранее вырытые котлованы над электродами;

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС					Лист
										70

- медносульфатные электроды сравнения после установки (так же, как контрольно-измерительные пункты, электроперемычки, контактные устройства, индикаторы коррозии и пр.) необходимо засыпать грунтом без использования средств механизации.

Установка контрольно-измерительных пунктов (КИП)

Монтаж КИП должен выполняться в следующей последовательности:

- перед установкой КИП отрыть крышку пункта;
- протянуть кабели и провода в полость стойки КИП, предусмотрев их резерв длиной 0,4 м;
- присоединить провода от электрода сравнения, от защищаемого газопровода, от анодных заземлителей, кабель от СКЗ и т.д. к клеммной панели;
- выполнить маркировку клемм КИП, соответствующую схеме соединений несмывающейся краской или прикрепить бирку установленной формы;
- установить стойку КИП в котлован вертикально;
- уплотнить грунт вокруг пункта в радиусе 1 м смесью песка со щебнем фракцией до 30 мм;
- нанести на наружную часть стойки несмывающейся краской порядковый номер пункта по трассе газопровода.

Монтаж анодного заземления

Монтаж анодного заземления из вертикальных неупакованных стальных электродов (заземлителей) должно включать следующие операции:

- бурение скважин на проектную глубину;
- установка электродов-заземлителей в скважины;
- прокладка магистрального кабеля на дне траншеи;
- выполнение электрического контакта между электродами-заземлителями и магистральным кабелем;
- соединение между электродами- заземлителями и магистральным кабелем;
- изоляция мест контактных соединений заливкой битумной мастикой.

Монтаж анодного заземления из горизонтально уложенных неупакованных электродов -заземлителей, должна включать следующие операции:

- укладка электродов -заземлителей в траншею на подсыпку горизонтально;
- засыпка электродов слоем коксовой мелочи или графита до проектной отметки;
- засыпка траншеи слоем грунта толщиной 0,5 м с уплотнением трамбовками, при этом провода анодных электродов должны быть закреплены в вертикальном положении;
- прокладка магистрального кабеля на дне траншеи;
- присоединение провода электродов -заземлителей к магистральному кабелю;
- присоединение магистрального кабеля к станции катодной защиты;
- изоляция мест контактных соединений заливкой битумной мастикой;

Ине. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	34/2021-06-04-ПОС	Лист 71
	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

- окончательная засыпка траншеи грунтом с уплотнением трамбовками.

Заземлители следует устанавливать в скважину или траншею механизированным способом, избегая ударов и сотрясений. Не допускается использовать токовода анодного заземлителя при его перемещениях и спуско-подъемах.

В сухих и маловлажных грунтах заземлители (после контроля качества изоляции контактных соединений) необходимо залить глиняным раствором, состоящим из глины и воды до мягкопластичной консистенции при показателе текучести более 0,50, но менее или равно 0,75. Требуемое соотношение между глиной и водой должно определяться в лабораторных условиях.

Прокладка кабельных линий

Прокладка электрокабелей в заранее вырытой траншее должна осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ. Засыпка уложенных в траншее кабелей производится после их приемки представителем технического надзора с оформлением актов на скрытые работы.

Монтаж защитного заземления

Корпуса катодных установок ЭХЗ и прочего оборудования во избежание поражения людей электрическим током должны быть заземлены.

Установка защитного заземления включает следующие операции:

- погружение в грунт вертикальных или укладка на дно траншеи горизонтальных электродов – заземлителей;
- соединение заземляющего проводника с электродами - заземлителями сваркой;
- соединение заземляющего проводника с заземляемой конструкцией;
- изоляция места сварных соединений битумной мастикой;
- уплотнение и выравнивание грунта над заземлением;
- окраска надземной части заземляющего проводника в черный цвет.

Контактные соединения защитного заземления должны находиться от поверхности земли на расстоянии, указанном в проектной документации.

Расположенные в земле заземлители и заземляющие проводники не должны иметь окраски и изолирующих покрытий.

Соединение элементов заземления одного с другим, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять сваркой, при этом длина нахлеста должна быть равна шести диаметрам при круглом сечении и двойной ширине при прямоугольном сечении заземлителя.

Вертикальные электроды заземления необходимо погружать в грунт механизировано - вращательным или вибрационным способом.

Присоединение заземляющих проводников к заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам СКЗ - сваркой или надежным болтовым соединением с применением мер, предусматривающих ослабление контактов.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Подп. и дата	Ине. № подл						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС			72					

Сварные швы, расположенные в земле, должны быть изолированы битумной мастикой.

Монтаж узлов присоединения кабелей к защищаемому газопроводу.

После приварки контактных устройств, электроперемычек или контрольных проводников изоляционные покрытия на газопроводах должны быть восстановлены.

После приварки проводов изоляционные покрытия на газопроводах должны быть восстановлены.

Монтаж установки дренажной защиты

Присоединение дренажных кабелей к соответствующим устройствам сети электрифицированного транспорта, должны производиться в соответствии с предписаниями эксплуатационных организаций (железных дорог) и в присутствии представителей этих организаций.

Для монтажа установки дренажной защиты должны быть выполнены следующие операции:

- монтаж станции дренажной защиты. Подключение электродренажной установки к рельсовой сети электрифицированного транспорта должно быть осуществлено через дроссель-трансформатор. Соединительные кабели необходимо подвести к электродренажному устройству через трубу и подключить к его шинам зажимами;
- установка стационарных электродов сравнения;
- установка контрольно-измерительных пунктов;
- прокладка воздушной электролинии или кабелей в предварительно вырытой траншее;
- монтаж узлов присоединения кабелей к газопроводу и рельсам. Дренажный кабель подключается к трубопроводу через стальную пластину неразъемным соединением, для чего:
 - a) дренажный кабель приваривают к пластине или соединяют с ней методом прессования;
 - b) пластину изготавливают из той же стали, что и трубопровод;
 - c) пластину приваривают к трубопроводу;
 - d) место соединения кабеля с трубопроводом изолируют.
- подключение дренажного кабеля к газопроводу и рельсам (отрицательной шине, отсасывающему пункту);
- монтаж защитного заземления.

Подсоединение дренажного кабеля к рельсу и от газопровода к электродренажному устройству необходимо выполнять на заключительной стадии строительно-монтажных работ (перед засыпкой газопровода).

Присоединение заземляющих проводников к заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам станции дренажной защиты - сваркой или надежным болтовым соединением с применением мер, препятствующих ослаблению контактов.

Остальные работы при выполнении электродренажной защиты выполняются аналогично работам по монтажу элементов катодной защиты.

Ине. № подп	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС					73

Монтаж установки гальванической (протекторной) защиты

Монтаж гальванической (протекторной) установки включает в себя:

- монтаж гальванических анодов (протекторов);
- монтаж соединительных кабелей;
- монтаж контрольно-измерительного пункта.

Перед монтажом гальванической (протекторной) установки производится:

- разработка траншеи под кабель;
- укладка кабеля (от протектора до КИП, от КИП до объекта защиты - стального подземного газопровода (стальной вставки) или стального футляра) в траншею и засыпка траншеи;
- бурение скважин под гальванические аноды (протекторы).

Контроль монтажа средств ЭХЗ

При производстве монтажных работ средств ЭХЗ при проведении операционного контроля следует выполнять проверку:

- монтажа станции катодной и дренажной защиты на фундаменте;
- монтажа КИП;
- соединений кабелей между собой и остальными элементами ЭХЗ;
- изоляции контактных соединений анодных и защитных заземлений;
- устройства защитного покрытия кабеля из кирпича;
- монтажа гальванической (протекторной) защиты стальных футляров и стальных вставок.

Измерить сопротивление изоляции кабелей, защитного заземления, сопротивление растеканию анодных заземлителей.

Для проверки правильности монтажа станций катодной и дренажной защиты на фундаменты необходимо проверить соответствие их размещения проектной документации и установки на анкерные болты фундаментов.

Станции должны быть размещены и закреплены на фундаментах в соответствии с проектной документацией. Крепления должны обеспечивать прочность и устойчивость станций.

Контроль правильности монтажа станций производится визуально. Контроль креплений проверяется на плотность затяжки гайками станций к верхней поверхности фундаментов. Степень затяжки болтов контролируется щупом толщиной 0,3 мм, который не должен проникать в зону, ограниченную радиусом $1,3d_0$ от центра болта (d_0 - номинальный диаметр отверстия) и на наличие не менее двух ниток резьбы, выступающих за гайку.

Для проверки правильности монтажа КИП необходимо проверить соответствие мест размещения, отметки низа КИП и вертикальность установки.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Подп. и дата						Лист 74
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС							

- требования пожарной, газовой, технической безопасности и указания о размерах охранной зоны.

Проведение очистки полости, а также испытания трубопроводов на прочность и проверка их на герметичность при отсутствии бесперебойной связи не допускаются.

В соответствии с п.11.4.2 СП РК 4.03-101-2013 перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопровода должна быть очищена в соответствии с проектом производства работ. Очистку полости внутренних газопроводов и газопроводов ГРП следует проводить продувкой воздухом перед их монтажом.

Полость трубопровода до испытания очищается от окалины и грата, а также от случайно попавших при строительстве внутрь трубопроводов грунта, воды и различных предметов.

Очистка полости трубопровода выполняется продувкой без пропуска очистных поршней.

Очистка полости должна производиться после укладки и засыпки газопроводов; надземных трубопроводов - после укладки и крепления на опорах.

Очистку полости газопроводов выполняют продувкой воздухом. Допускается пропуск очистных поршней из эластичных материалов. Продувка осуществляется скоростным потоком (15-20 м/с) воздуха под давлением, равным рабочему. Газопровод очищается участками или целиком в зависимости от его конфигурации и протяженности.

Продолжительность продувки должна составлять не менее 10 мин, если в проектной документации не содержится других требований. После очистки полости трубопровода на концах очищенного участка устанавливаются временные инвентарные заглушки.

Испытание на прочность и проверка на герметичность производится после полной готовности участка или всего трубопровода (полной засыпки, обвалования или крепления на опорах, очистки полости, установки арматуры и приборов, катодных выводов и представления исполнительной документации на испытываемый объект).

Проверка на герметичность под рабочим давлением $R_{исп} = R_{раб}$ производится в течение времени, необходимого для осмотра участка, но не менее одного часа. Испытание проводить в соответствии СП РК 4.03-101-2013, таблица 23, таблица 24.

Таблица 3.6.5 - Значения испытательного давления и время выдержки под давлением стальных газопроводов (по табл. 23 СП РК 4.03-101-2013)

Рабочее давление газа, МПа	Вид изоляционного покрытия	Испытательное давление, МПа	Продолжительность испытаний, ч
Газопроводы высокого давления: - св. 0,6 до 1,2	Независимо от вида изоляционного покрытия	1,5	24

Таблица 3.6.6 - Значения испытательного давления и время выдержки под давлением полиэтиленовых газопроводов (по табл. 24 СП РК 4.03-101-2013)

Рабочее давление газа, МПа	Испытательное давление, МПа	Продолжительность испытаний, ч
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Ине. № подп.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС	Лист
						76

Полиэтиленовые газопроводы давлением до 0,005 включ.	0,3	24
Полиэтиленовые газопроводы давлением св.0,005 до 0,3 включ.	0,6	24

Трубопровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на герметичность, если за время испытания трубопровода на прочность давление остается неизменным, а при проверке на герметичность не будут обнаружены утечки.

При обнаружении утечек визуально, по звуку или с помощью приборов участок трубопровода подлежит ремонту и повторному испытанию на прочность и проверке на герметичность.

При всех способах испытания на прочность и герметичность для измерения давления должны применяться проверенные опломбированные и имеющие паспорт дистанционные приборы или манометры класса точности не ниже 1 и с предельной шкалой на давление около 4/3 испытательного, устанавливаемые вне охранной зоны.

После испытания газопровода проводится вытеснение воздуха (продувка) газом.

О производстве и результатах очистки полости, а также испытаниях трубопроводов на прочность и проверки их на герметичность необходимо составить акты.

Обеспечение качества строительно-монтажных работ

Качество строительно-монтажных работ должно обеспечиваться специальной службой контроля качества строительных работ, создаваемой в строительной организации.

Контроль качества работ включает три уровня:

1. производственный контроль;
2. технический надзор;
3. инспекционный надзор.

Производственный контроль производится с целью обеспечения требуемого качества выполнения всех отдельных технологических операций в соответствии с требованиями проекта и действующей нормативной документацией.

Производственный контроль качества работ осуществляется силами и средствами Генподрядчика:

- исполнителями работ;
- службой качества, состоящей из инженерно-технических работников и контролеров полевой лаборатории, имеющейся у Генподрядчика или привлекаемой на субподрядной основе.

Производственный контроль строительно-монтажных работ включает в себя входной, операционный контроль технологических операций и приемочный контроль отдельных выполненных работ.

Результаты производственного контроля качества отражаются в исполнительной документации: специальных журналах, актах или заключениях.

В документах результаты контроля удостоверяются подписями контролера, исполнителя работ и инспектора технадзора.

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	34/2021-06-04-ПОС	Лист
Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	77
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Технический надзор осуществляется службами технадзора Заказчика. Целью технического надзора является контроль обеспечения выполнения всех проектных и технологических решений.

Инспекционный надзор осуществляется специальными комиссиями на всех стадиях строительного-монтажных работ. В проведении инспекционного контроля должны участвовать представители проектной организации (авторский надзор) и органы государственного технического надзора, действующие на основании специальных положений.

По результатам проверки такого контроля должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов.

Окончательное освидетельствование качества строительных работ производится при приемке объекта приемочной комиссией.

Входной контроль включает контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования. Входной контроль материалов и оборудования проводится:

- при поступлении материалов и оборудования на склад;
- на строительной площадке непосредственно перед применением.

Входной контроль материалов на строительной площадке перед их использованием организует представитель технического надзора Заказчика и представитель Генподрядной организации.

Во всех проверках качества строительных материалов и конструкций принимает участие строительная лаборатория, которая дает заключения по испытаниям.

При входном контроле проверяется соответствие поступающих материалов стандартам, паспортам и другим нормативным документам.

Контролируется также соблюдение правил разгрузки и хранения материалов и оборудования.

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов и обеспечить своевременное выявление дефектов и отступлений от проекта для принятия своевременных мер по их устранению или предупреждению.

При операционном контроле должно проверяться:

- соблюдение заданной в ППР технологии выполнения строительных процессов;
- соответствие выполняемых работ чертежам и стандартам.

Приемочному контролю подвергаются скрытые работы, ответственные конструкции, законченное строительство и сооружения в целом.

Контроль качества проведенных работ заключается в систематическом наблюдении и проверке соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям СН РК.

Приборы и инструменты, предназначенные для контроля качества работ, должны быть заводского изготовления и иметь паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации.

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 78
Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС

В соответствии с п.130 Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" от 16.06.2021г. № ҚР ДСМ-49 на трассе устраиваются временные передвижные санитарно-бытовые помещения с учетом климатогеографических особенностей района ведения работ.

Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее 50 м от разгрузочных устройств и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.

Номенклатура инвентарных зданий принята минимальной, а их габаритные характеристики должны удовлетворять требованиям перевозки автомобильным транспортом.

Номенклатура мобильных зданий и сооружений охватывает различные сферы обслуживания строителей, способствует удовлетворению требований санитарно-бытового обеспечения, создает предпосылки и условия для общего повышения культуры производства.

Обеспечение строителей санитарно-бытовыми помещениями является функцией Заказчика.

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях выполнен в соответствии с Пособием по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП РК 1.03-06-2002*)

Показатель потребной площади вспомогательных зданий определен по формуле:

$$S = \eta P, \quad (3.8.1)$$

где η – нормативный показатель площади; P – расчетная численность работающих (рабочих, ИТР, служащих, МОП).

Нормативный показатель площади принимается по табл. 12 Пособия

Таблица 3.8.1 – **Нормативные показатели площади временных зданий и сооружений**

Номенклатура	Единица измерения	Нормативный показатель
Гардеробная	м2/10 чел	7
Помещение для обогрева работающих	то же	1
Сушилка для одежды и обуви	то же	2
Помещение для приема пищи	то же	10
Уборная	м2/10 чел	1
Прорабская	м2/1 чел	3,0-3,5
Душевые сетки	сетка/5 человек	1

Всего по проекту для строительства объектов принято:

Таблица 3.8.2 – **Потребность в строительных кадрах по участкам строительства, чел**

Показатели	Количество	Формула расчета
------------	------------	-----------------

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
					34/2021-06-04-ПОС					80
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Продолжительность строительства – 1 п.к	17	$\frac{368,355 \text{ тыс. чел.} \cdot \text{ч}}{17 \text{ мес} \cdot 22 \text{ дня} \cdot 8 \text{ час}} = 123 \text{ рабочих}$ $123 \text{ рабочих} \cdot 1,12 = 137 \text{ работающих с учетом ИТР}$
Продолжительность строительства – 2 п.к	6	$\frac{69,244 \text{ тыс. чел.} \cdot \text{ч}}{6 \text{ мес} \cdot 22 \text{ дня} \cdot 8 \text{ час}} = 65 \text{ рабочих}$ $65 \text{ рабочих} \cdot 1,12 = 72 \text{ работающих с учетом ИТР}$
Продолжительность строительства – 3 п.к	14	$\frac{412,480 \text{ тыс. чел.} \cdot \text{ч}}{14 \text{ мес} \cdot 22 \text{ дня} \cdot 8 \text{ час}} = 167 \text{ рабочих}$ $167 \text{ рабочих} \cdot 1,12 = 187 \text{ работающих с учетом ИТР}$

* -численность определена в соответствии с рекомендациями Справочно-методического пособия по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР, ОАО ПКТИпромстрой, 2002 г.

Работы по строительству газопроводов выполняются с привлечением квалифицированного аттестованного персонала для выполнения работ по строительству газопроводов (как правило сварочных на газопроводах высокого давления, работ по монтажу и обвязке технологического и инженерного оборудования) и не менее 70% местного персонала для проведения земляных, общестроительных, дорожных, электротехнических работ и др.

Таблица 3.8.3 - **Результаты расчета потребности во временных зданиях**

№№ пп	Номенклатура	Расчетный показатель, м2	Количество человек или общая площадь, м2/кол-во инвентарных зданий
А	Санитарно-бытовые		
1	Гардеробная, сушилка и обогрев	1-пк= $123 \cdot (7+1+2)/10=123 \text{ м}^2$	123 м2/15,5~ 7 здания контейнерного типа полезная площадь S=15,5 м2 сер.1129-042
		2-пк= $65 \cdot (7+1+2)/10=65 \text{ м}^2$	65 м2/15,5~ 4 здания контейнерного типа полезная площадь S=15,5 м2 сер.1129-042
		3-пк= $167 \cdot (7+1+2)/10=167 \text{ м}^2$	45 м2/15,5~ 10 зданий контейнерного типа полезная площадь S=15,5 м2 сер.1129-042
2	Уборная	1-пк= $137 \cdot (1)/10=13,7 \text{ м}^2$	13,7/1~13 туалетных кабин «Стандарт»
		2-пк= $72 \cdot (1)/10=7,2 \text{ м}^2$	7,2/1~7 туалетных кабин «Стандарт»
		3-пк= $187 \cdot (1)/10=18,7 \text{ м}^2$	18,7/1~18 туалетных кабин «Стандарт»
Б	Помещение для приема пищи	1-пк= $137 \cdot 10/10=137 \text{ м}^2$	137/2 захода~3 столовые-раздаточные передвижные тип СРП-22 полезная площадь S=23,7 м2
		2-пк= $72 \cdot 10/10=72 \text{ м}^2$	72/2 захода~2 столовые-раздаточные передвижные тип СРП-22 полезная площадь S=23,7 м2
		3-пк= $187 \cdot 10/10=187 \text{ м}^2$	187/2 захода~3 столовые-раздаточные передвижные тип СРП-22 полезная площадь S=23,7 м2
В	Административно- бытовые помещения – прорабская,	1-пк= $14 \cdot (7+1+2)/10+14 \cdot 3,5=63,0$	63/23,7~2 пункта прорабских передвижных тип ППП-2, полезная площадь S=23,7 м2


Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

34/2021-06-04-ПОС

	контора с размещением ИТР	2-пк= $7*(7+1+2)/10)+7*3,5=31,5,0$	31,5/23,7~1 пункт прорабский передвижной тип ППП-2, полезная площадь S=23,7 м2
		3-пк= $20*(7+1+2)/10)+20*3,5=90,0$	90/23,7~3 пункта прорабский передвижной тип ППП-2, полезная площадь S=23,7 м2

МОСКВА	МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1129-042
ОАО ПКТИ промстрой	ЗДАНИЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА СИСТЕМЫ «УНИВЕРСАЛ» (на шасси)	Управление экономической, научно- технической и промышленной политики в строительной отрасли
2002 г	ГАРДЕРОБНАЯ на 15 человек	На 2 страницах стр.1

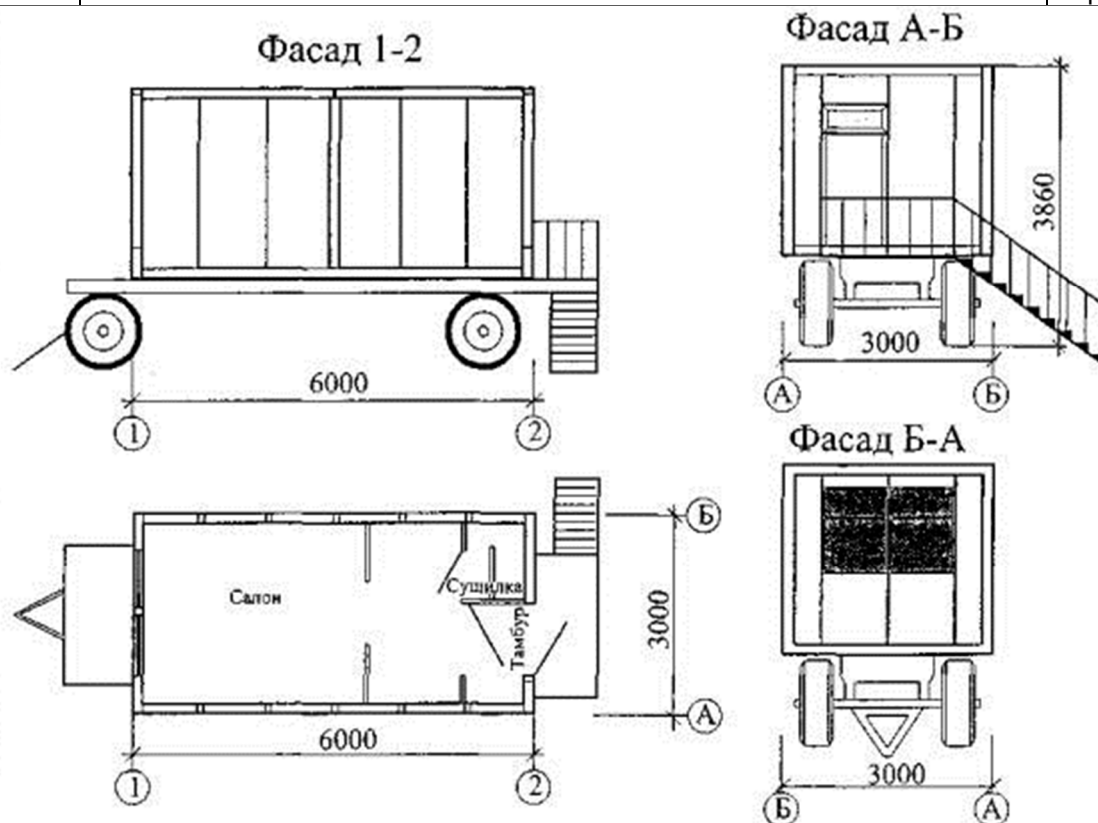

НАЗНАЧЕНИЕ

Здание предназначено для хранения уличной и домашней одежды, сушки и хранения рабочей одежды, умывания, снабжения питьевой водой, обогрева и отдыха.

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ


Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

34/2021-06-04-ПОС

Лист

82

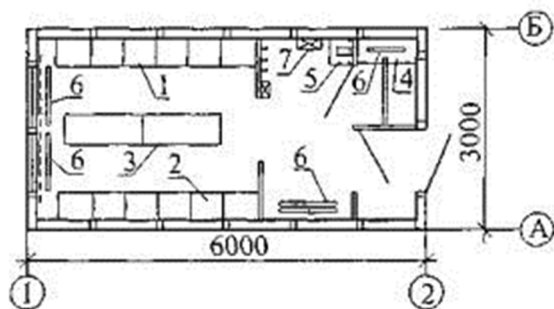

- 1 шкаф правый
- 2 шкаф левый
- 3 скамья
- 4 бак для воды
- 5 умывальник
- 6 электрорадиатор
- 7 электросушитель

	ГАРДЕРОБНАЯ на 15 человек	1129-042	Стр. 2
--	---------------------------	----------	--------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Масса, тн	3,6
Расчетный срок службы, лет	20
Оборачиваемость, раз	20-30
Строительный объем, м3	50,5
Площадь застройки, м2	17,8
Полезная площадь, м2	15,5
Габаритные размеры, м:	
длина	6,0
ширина	3,0
высота	3,86

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Электроснабжение -	от внешних сетей;
Водоснабжение -	от внешних сетей (привозное);
Отопление -	электрическое;
Вентиляция -	естественная и принудительная;
Канализация -	ассенизатор

Расход материалов на 1 м2 полезной площади

Сталь, кг	85
Пиломатериалы, м3	0,04
Утеплитель, м3	0,15

РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скоростной напор ветра	0,48 кПа (48 кгс/м2)
Масса снегового покрова	1,5 кПа (150 кгс/м2)
Расчетная температура наружного воздуха	минус 45 С
Степень огнестойкости	V
Климатические районы	подрайон I B, II A, III A

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Ине. № подп.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подп.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

34/2021-06-04-ПОС

Каркас - стальной тонкостенный профиль. Стены - трехслойные стеновые панели.
 Полы - линолеум по настилу из шпунтованных досок.
 Кровля - кровельная сталь.
 Отделка наружная - окраска масляной краской или эмалями.
 внутренняя - древесностружечные плиты, древесноволокнистые плиты.

РАЗРАБОТЧИК документации

МГП «Мосспецпроект»
 103045, г. Москва, Просвирин пер., д.5/6, стр.1 тел. 924-82-02

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АОЗТ "КССК"
 119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 2. тел. 430-78-27

УТВЕРЖДЕНИЕ

ТУ 5282-006-05108104-98



СОСТАВИТЕЛЬ каталожного листа

ОАО ПКТИпромстрой

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ каталожного листа

ОАО ПКТИпромстрой
 125040, Москва, Ленинградский пр-т, д. 26
 тел.(095) 214-36-49, факс : (095)214-95-53
 E-mail: pkti@tsr.ru; http://www.tsr.ru/~pkti

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://biotransservice.kz/p51782360-biotualet-standart-aziatiskim.html>. The website has a dark navigation bar with links: ГЛАВНАЯ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ, О НАС, КОНТАКТЫ, ДОСТАВКА И ОПЛАТА. The main content area displays the product "БИОТУАЛЕТ 'СТАНДАРТ' С АЗИАТСКИМ БАКОМ" with a price of 140 000 Tg. There is a "Купить" button and a "Бесплатная доставка" badge. The sidebar on the right contains a "МЕНЮ" section with links to Portfolio, Goods and services, News, Articles, About us, Delivery and payment, Certificates and licenses, Reviews, Frequently asked questions, and Vacancies. Below the menu is a "КОНТАКТЫ" section with phone numbers and contact information.



Мобильная туалетная кабина (МТК) изготовлена из ударопрочного (300кг/см²) полиэтилена (Borealis, Дания), обладает высокой стойкостью к УФ-излучению. Однослойная лицевая панель (арка и дверь) с ребрами жесткости. Петли на стальных заклепках. Накопительный бак 250 л. Внутренняя задвижка, бумагодержатель, сиденье с крышкой, крючок для одежды, души для замка. Вес -80кг.

Поставляется: в собранном виде – 2,8 м³
 в разобранном виде – 1,3 м³

Наиболее часто туалетные кабины устанавливаются:

- на строительных объектах;
 - на торговых предприятиях;
 - на складах и хранилищах;
 - на автостоянках;
 - на автозаправочных станциях.
- Также очень часто к услуге аренды биотуалетов прибегают организаторы:
- выездных корпоративов;
 - массовых мероприятий;
 - пикников на природе.

Ине. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. № дубл.			

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

34/2021-06-04-ПОС

Биотуалет "Эконом": продажа

+

← → ↺

https://biotransservice.kz/p51782360-biotualet-standart-aziatskim.html

Приложения

Интернет

Котировки

Новости

Почта

Рекомендуемые узлы

Яндекс

Импортированные

Биотуалет "Стандарт" с азиатским баком

Под заказ 140 000 Тг.

Купить

+77273671776

Биотуалет / Туалетную кабину

в нашей компании вы сможете приобрести на весьма выгодных условиях. Мы постараемся максимально подробно проинформировать вас и дать четкие инструкции по эксплуатации туалетных кабин.

Мы несколько лет успешно продаем туалетные кабинки как по городу Алматы, так и по всему Казахстану за счет слаженной системы отправки кабин.

Так же мы предлагаем комплексное обслуживание туалетных кабин в Алматы и Алматинской области, на новом и современном оборудовании собственного производства.

Обслуживание туалетных кабин производится качественно и быстро благодаря слаженной работе. Обслуживание мы можем вам предложить на договорной основе по пост оплате, что очень удобно для клиента, а так же удобство обслуживания по графику. Это позволяет решать любые задачи по обслуживанию биотуалетов в четко ограниченные сроки. Вам не придется переживать что вы забыли заказать обслуживание, мы приедем по графику в удобное для Вас время заранее оговоренное время.

Мы гарантируем нашим клиентам оперативное решения возникающих проблем. По необходимости для каждого заказчика мы можем прикрепить персонального менеджера.

Все вопросы решаются в срочном порядке менеджерами нашей компании по телефонам: 367-17-76 или 225-11-85

В нашей работе мы всегда придерживаемся принципов коммуникабельности, добросовестности и оперативности в решении поставленных задач!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ КОМПАНИЯМИ:

Комплексное обслуживание туалетных кабин включает в себя:

1) откачку отходов и чистку приемных баков пластиковых туалетов при помощи специального транспорта с вакуумным и моечным оборудованием;

2) заправка специальными реагентами в летний период и в зимний период незамерзающими реагентами.

3) при необходимости есть возможность обеспечения бумажными полотенцами, туалетной бумагой и жидким мылом;

4) при необходимости косметическая мойка биотуалетов внутри и снаружи.

5) разморозка кабин в зимний период.

Мы сможем предложить вам на выбор несколько моделей, все наши биотуалеты производятся из экологически чистого материала, поддающегося частой санитарной обработке;

Мы помогаем быстро и качественно создавать комфортные бытовые условия на строительных объектах;

Все пластиковые туалетные кабинки не только имеют эстетичный вид в Алматы, но и обладают повышенной прочностью (выдерживают нагрузку до 300 кг/см2), что помогает им быть устойчивыми к возможным проявлениям вандализма;

Надеемся что вы останетесь в числе наших постоянных клиентов!

АДРЕС

Казахстан, Алматинская область, Алматы

КОМПАНИЯ

ТОО "БиоТрансСервис"

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Менеджер

КАРТА

ГРАФИК РАБОТЫ

Понедельник

10:00 - 18:00

Вторник

10:00 - 18:00

Среда

10:00 - 18:00

Четверг

10:00 - 18:00

Пятница

10:00 - 18:00

Суббота

Выходной

Воскресенье

Выходной

Биотуалет "Эконом": продажа

+

← → ↺

https://biotransservice.kz/p51782360-biotualet-standart-aziatskim.html

Приложения

Интернет

Котировки

Новости

Почта

Рекомендуемые узлы

Яндекс

Импортированные

Биотуалет "Стандарт" с азиатским баком

Под заказ 140 000 Тг.

Купить

+77273671776

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные

Страна производитель

Дания

Вид оборудования

Туалетная кабина

Тип туалета

Химический (жидкостный)

Материал корпуса биотуалета

Полипропилен

Объем нижнего бака

250.0 (л)

Минимальная рабочая температура

-40.0 (град.)

Максимальная рабочая температура

40.0 (град.)

Количество посещений для одного человека

500

Цвет

Голубой

Вес

80.0 (кг)

Гарантийный срок

5 (мес)

Габаритные размеры

Высота

2200.0 (мм)

Ширина

1100.0 (мм)

Глубина

1100.0 (мм)

Комплектация

Кабина

Да

Сиденье с крышкой

Да

Вытяжная труба

Да

Бумагодержатель

Да

Защелка с индикатором «Свободно/Занято»

Да

Раковина (умывальник)

Нет

Крючок для одежды

Да

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Цена: 140 000 Тг.


Ине. № инв.	Взаим. инв. №	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Ине. № дубл.	Подп. и дата
Ине. № подл.	Ине. № подл.	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

34/2021-06-04-ПОС

Лист
85

МОСКВА	МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	Тип СРП-22
ОАО ПКТИ промстрой	ЗДАНИЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА СИСТЕМЫ «УНИВЕРСАЛ»	Управление экономической, научно- технической и промышленной политики в строительной отрасли
2002 г	СТОЛОВАЯ-РАЗДАТОЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ	На 2 страницах стр.1

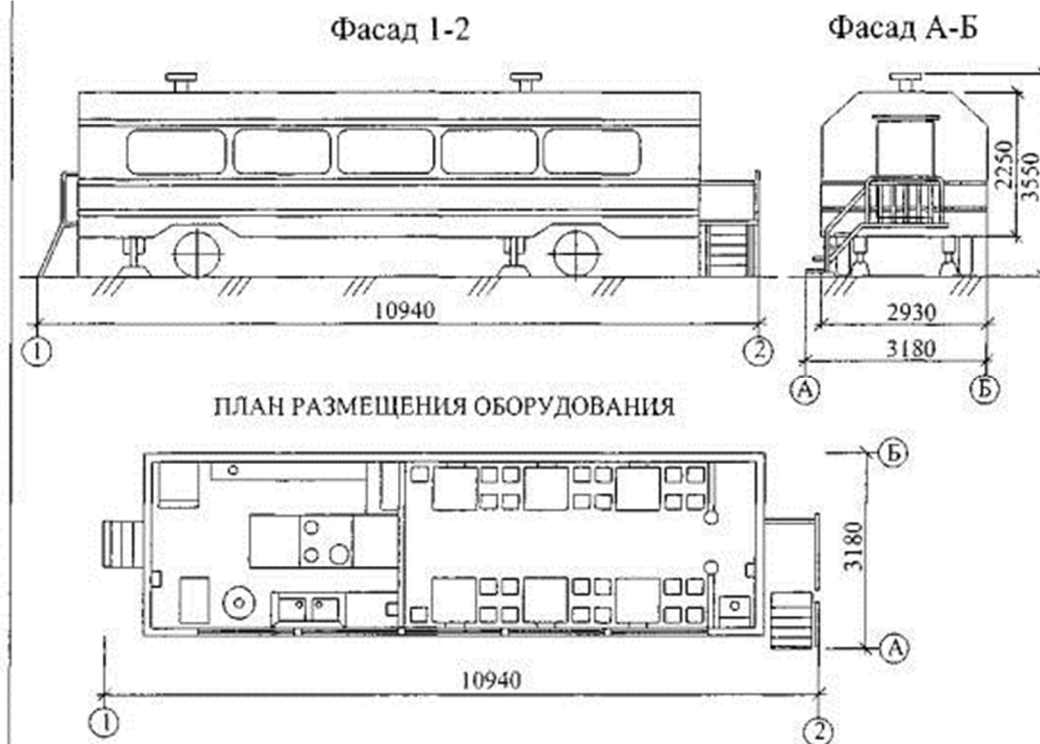

НАЗНАЧЕНИЕ

Здание предназначено для обеспечения привозной горячей пищей рабочих, занятых на участках строительных, ремонтно-строительных и дорожных работ.

Стол обеденный – 6

Табурет – 22

Масляный радиатор – 3-6

Электроплита 3-комфорочная – 1

Электромармит – 1

Электрохолодильник – 1

Электрокипятильник КНД-80 - 1

Двухкамерная мойка – 1

Насос ручной БКФ-2М - 1

Баки для воды - 3

Вентилятор «ОВ» - 1

Шкаф для одежды – 1

Витрина и прилавок - 1

Стол раздачи - 1

Стол для пищевых отходов - 1

Огнетушитель ОП-5 - 2

Зеркало – 1

Вешалка на 22 крючка – 1

Трап откидной – 1

СТОЛОВАЯ-РАЗДАТОЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ	ТИП СРП-22	Стр. 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА		

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № инв.	Взам. инв. №
Ине. № дубл.	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

34/2021-06-04-ПОС

Масса, кг	7,0
Расчетный срок службы, лет	20
Оборачиваемость, раз	20-30
Площадь застройки, м2	34,8
Полезная площадь, м2	23,7
В том числе: салон	15,3
кухня	8,4
Габаритные размеры, м:	
длина	10,94
ширина	3,18
высота	3,55
Высота внутри кузова	2,25

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Электроснабжение -	от внешних сетей;
Водоснабжение -	от внешних сетей;
Отопление -	электрическое;
Вентиляция -	В салоне: естественная и принудительная; На кухне: принудительная вытяжка
Канализация -	В местную канализационную сеть через сливные трубопроводы, (ассенизатор)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фургон закрытого типа, установленный на специальные шасси - сварную металлическую конструкцию из стандартных профилей.
Каркас кузова деревометаллический.
Наружная обшивка - листовая сталь толщиной 1,2 мм.
Внутренняя обшивка - древесноволокнистая плита с окрашенной поверхностью.
Полы - линолеум. Теплоизоляция выполнена из пенопласта.
Фургон имеет два отделения: салон и кухня. Каждое отделение имеет отдельный вход.


РАЗРАБОТЧИК документации	ГК "Мосгортранс", завод "АРЕМКУЗ", 113114, Москва, ул. Кожевническая, 18 тел. 235-75-13
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ГК "Мосгортранс", завод "АРЕМКУЗ", 113114, Москва, ул. Кожевническая, 18 тел. 235-75-13
УТВЕРЖДЕНИЕ	ТУ 400-12-64-91
СОСТАВИТЕЛЬ каталожного листа	ОАО ПКТИпромстрой
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ каталожного листа	ОАО ПКТИпромстрой 125040, Москва, Ленинградский пр-т, д. 26 тел.(095) 214-36-49, факс :(095)214-95-53 E-mail: pkti@tsr.ru; http://www.tsr.ru/~pkti

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

34/2021-06-04-ПОС

МОСКВА	МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	Тип ППП-2
ОАО ПКТИ промстрой	ЗДАНИЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА	Управление экономической, научно- технической и промышленной политики в строительной отрасли
2002 г	ПУНКТ ПРОРАБСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ	На 2 страницах стр.1

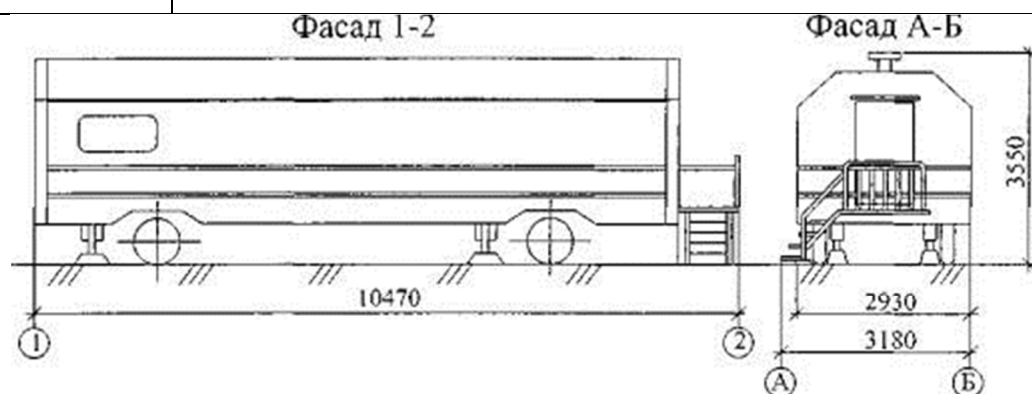

ПЛАН ПОМЕЩЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

Здание предназначено для эксплуатации на участках строительных, ремонтно-строительных и дорожных работ.

Вешалка на 8 крючков
 Вешалка на 6 крючков
 Вешалка с «плечиками»
 Решетка для сушки обуви
 Вешалка для рукавиц
 Масляный эл. радиатор
 Огнетушитель ОУ-2
 Огнетушитель ОУ-5
 Зеркало
 Аптечка

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

34/2021-06-04-ПОС

	ПУНКТ ПРОРАБСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ	Тип ППП-2	Стр. 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА			
Масса, т	5,55		
Строительный объем, м3	46,6		
Площадь застройки, м2	34,8		
Полезная площадь, м2	23,7		
Габаритные размеры, м:			
длина	10,47		
ширина	3,18		
высота	3,45		
Высота внутри кузова	2,25		
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
Электроснабжение -	От электросети трехфазного переменного тока		
Отопление -	электрическое;		
Вентиляция -	принудительная;		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ			
Фургон закрытого типа, установленный на специальные шасси - сварную металлическую конструкцию из стандартных профилей.			
Каркас кузова деревометаллический.			
Наружная обшивка - листовая сталь толщиной 1,2 мм.			
Внутренняя обшивка - древесноволокнистая плита с окрашенной поверхностью.			
Полы - линолеум. Теплоизоляция выполнена из пенопласта.			
Фургон имеет два отделения: контора прораба и гардеробная. Каждое отделение имеет отдельный вход.			
РАЗРАБОТЧИК документации	ГК "Мосгортранс", завод "АРЕМКУЗ", 113114, Москва, ул. Кожевническая, 18 тел. 235-75-13		
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ГК "Мосгортранс", завод "АРЕМКУЗ", 113114, Москва, ул. Кожевническая, 18 тел. 235-75-13		
УТВЕРЖДЕНИЕ	ТУ 400-12-64-91		
СОСТАВИТЕЛЬ каталожного листа	ОАО ПКТИпромстрой		
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ каталожного листа	ОАО ПКТИпромстрой 125040, Москва, Ленинградский пр-т, д. 26 тел.(095) 214-36-49, факс :(095)214-95-53 E-mail: pkti@tsr.ru; http://www.tsr.ru/~pkti		

Отопление временных зданий принято электрическое.

Необходимым элементом электрической системы теплоснабжения городка являются сборно-разборные электрические сети и внутренние системы. Тип источника электроэнергии определяется при привязке к местным источникам (дизельная электростанция, линия электропередач – ЛЭП, источник электроснабжения вдольтрассовая ВЛ, электросети стройплощадки). Для определения технико-экономических показателей в качестве **источника электроснабжения бытового городка строителей принята дизельная электростанция (ДЭС).**

Ине. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Ине. № подп.

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС	Лист
						89

Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой. Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных площадках и участках работ внутри зданий, должна соответствовать нормам установленной законодательством Республики Казахстан, вне зависимости от применяемых источников света. Система водоснабжения. Водоснабжение осуществляется путём доставки воды автотранспортом в резервуар питьевой воды, рассчитанный на трёхсуточный расход. В контейнерных зданиях, как правило, водоснабжение осуществляется из периодически заполняемых встроенных баков. Доставка воды производится автотранспортом, имеющим санитарно-эпидемиологическое заключение. Емкости для хранения воды должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан. Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды производится не реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим показаниям. Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и проводится бактериологический контроль воды. Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан.
					34/2021-06-04-ПОС
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					90

Водоснабжение должно обеспечить работающих питьевой водой, отвечающих требованиям ГОСТ 2874 - 82 "Вода питьевая. Для питьевых нужд в период строительства будет использована вода привозная из системы централизованного водоснабжения п.Актау и п. Мустафина (Протоколы микробиологического исследования воды № 269 от 17.02.22 г. ТОО «Куат Жолы», №2210282000004722 от 15.10.21г.ТОО «Коммунальщик» представлены в приложении №40 к ОПЗ).

Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, должна соответствовать требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 177 от 28.02.2015 г.

Канализация разрабатывается, прежде всего, для обслуживания раздаточной столовой и бытовых помещений. Для сбора хоз-бытовых стоков в комплектации зданий предусмотрены емкости для стоков (объем около 1,5 м3).

При выполнении строительно-монтажных работ вдоль трассы газопровода устанавливаются мобильные туалетные кабины «Биотуалет» и мобильные душевые кабины, пункты для обогрева рабочих, которые должны переставляться каждый раз по мере продвижения рабочей колонны вдоль трассы.

По мере накопления емкостей для стоков мобильные туалетные кабины «Биотуалет» и «Душевые» очищаются и нечистоты вывозятся специальным автотранспортом по Договору Генподрядчика со специализированной организацией.

Участок должен быть радиофицированным. Связь прорабской с мастерами должна осуществляться посредством телефона и коротковолновой (КВ) или ультракоротковолновой (УКВ) радиостанции.

Расстояние между временными зданиями и сооружениями принимаются в соответствии с транспортными, эксплуатационными и другими условиями и с учетом санитарно-технических и противопожарных требований.

Противопожарные требования касаются в первую очередь размещения зданий и устройства проездов для пожарных машин.

Расстояние между зданиями должно быть не менее 1 м.

Забор, ограждающий временные здания, устанавливается от дороги на расстоянии не менее 15 м, а от зданий — на расстоянии 2 м.

Тротуары или пешеходные трассы, в том числе для прохода к бытовым зданиям, располагаются, как правило, вдоль дорог, но не ближе 2 м от бортового камня проезжей части автодороги (или после кювета).

Кроме того, возле временных зданий предусматриваются площадки для сбора и удаления мусора и других отходов, установка щита со средствами пожаротушения, ящик с песком вместимостью 0,5 м и лопатой.

Благоустройство включает в себя работы по планировке его территории, устройству пешеходных дорожек, размещение навесов для отдыха, мест для курения, устройство ограды.

Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата	Име. № подл						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС					91	

Эксплуатация временных зданий, поддержание порядка на территории размещения временных инвентарных зданий и сооружений, соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также требований санитарной гигиены возлагаются на генподрядчика. Ответственность в целом несет лицо, назначенное приказом по строительной организации из числа инженерно-технического персонала (начальник участка, производитель работ).

Субподрядные организации возмещают расходы на содержание временных инвентарных зданий пропорционально численности работающих, пользующихся определенными видами услуг.

За соблюдение правил пожарной безопасности и поддержание порядка в бытовых помещениях персональную ответственность несет бригадир.

К площадкам строительства предусматриваются подъезды от существующих дорог.

Строительная площадка в ходе строительства своевременно очищается от строительного мусора, в зимнее время от снега, в теплое время года поливается.

Строительно-монтажные работы по трассе газопровода производятся строго в коридоре полосы отвода земель под строительство с проведением необходимых подготовительных работ на выделенной территории.

Строительные материалы и конструкции поступают на объект в готовом для использования виде. Подготовка материалов к работе производится в условиях строительной площадки и производственных баз подрядчика (приготовление смесей и растворов, резка материалов и конструкций и другие), где предусматриваются помещения, оснащенные средствами механизации, специальным оборудованием и системами местной вытяжной вентиляции.

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ. Укрытия должны иметь устройства для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для механизированного удаления отходов производства.

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны превышать установленные нормативы в соответствии санитарными правилами Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 177 от 28.02.2015 г.

Погрузочно-разгрузочные работы для грузов весом более 50 кг и при подъеме грузов на высоту более двух метров (далее - м) должны быть механизированы. Материалы на носилках по горизонтальному пути переносятся на расстояние не более 50 м.

Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами производятся с использованием средств индивидуальной защиты.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № подл.						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС					92	

Выполнение погрузо-разгрузочных работ с опасными грузами при неисправности тары, отсутствии маркировки и предупредительных на ней надписей не допускается.

Заготовка и обработка арматуры для проведения бетонных и железобетонных работ производится на производственных базах подрядчика.

Уплотнение бетонной массы должно производиться пакетами электровибраторов с дистанционным управлением.

Строительный мусор перед укладкой бетонной смеси удаляется промышленными пылесосами. Продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности сжатым воздухом не допускается.

Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи, окраска и антикоррозийная защита конструкций и оборудования производится до их подъема. После подъема, окраска или антикоррозийная защита проводится в местах стыков или соединения конструкций.

Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования производится на специальных стеллажах или подкладках; укрупнительная сборка и доизготовление (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, подгонка стыков и другие работы) - на выделенных для этих целей площадках.

При ручной сварке штучными электродами используются переносные малогабаритные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями.

Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).

Изоляционные работы на трубопроводах выполняются на берме траншеи, до опуска трубы в проектное положение.

Битумная мастика доставляется к рабочим местам в емкостях при помощи грузоподъемного крана. При перемещении битума вручную применяются металлические бачки с плотно закрывающимися крышками. Использовать битумные мастики с температурой выше плюс 180°C при изоляционных работах не допускается.

Цемент на рабочую площадку должен подаваться в контейнерах или пакетах.

На участке выполнения антикоррозийных работ предусматривается механизация технологических операций.

Нанесение антикоррозийных лакокрасочных материалов вручную осуществляется кистями с защитными шайбами у основания ручек.

Хранение и перенос горючих и легковоспламеняющихся материалов осуществляется в закрытой таре. Хранение и транспортировка материалов в бьющейся (стеклянной) таре не допускается. Тара должна иметь соответствующую надпись.

При переливе окрасочных материалов из бочек, бидонов и другой тары весом более десяти кг для приготовления рабочих растворов необходимо предусмотреть механизацию данного процесса.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Ине. № подл.						34/2021-06-04-ПОС	Лист 93
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата								

Оборудование с возможным выделением вредных газов, паров и пыли, оснащается укрытиями и устройствами, обеспечивающими герметизацию источников выделения вредных веществ.

Ручки ножей или аналогичных режущих инструментов должны иметь предохранительную скобу, предупреждающую возможность скольжения кисти руки. Рукоятки вибраторов оборудованы амортизаторами, форма рукояток изготавливается из материала низкой теплопроводности.

Доставка труб к месту производства сварочно-монтажных работ осуществляется механизировано. На рабочих местах лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы хранятся в количествах, не превышающих сменной потребности.

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. Цемент хранится в закрытых емкостях.

Строительные и отделочные материалы для строительства должны быть допущены к применению в Республике Казахстан.

Устройство рабочих мест на строительной площадке должно соответствовать следующим требованиям:

- 1) площадь рабочего места должна быть достаточной для размещения строительных машин, механизмов, инструмента, инвентаря, приспособлений, строительных конструкций, материалов и деталей, требующихся для выполнения трудового процесса;
- 2) положение рабочего должно исключать длительную работу с наклонами туловища, в напряженно вытянутом положении, с высоко поднятыми руками.

Процессы, выполняемые вручную или с применением простейших приспособлений, осуществляются в зоне досягаемости; процессы, выполняемые с помощью ручных машин в зоне оптимальной досягаемости; процессы, связанные с управлением машинами (операторы, машинисты строительных машин) в зоне легкой досягаемости.

Рабочее место должно включать зону для размещения трубных плетей и средств технического оснащения труда, зону обслуживания (транспортная зона) и рабочую зону.

Рабочие места оснащаются строительными машинами, ручным и механизированным строительным инструментом, средствами связи, устройствами для ограничения шума и вибрации.

При эксплуатации машин с повышенным уровнем шума применяются:

- 1) технические средства для уменьшения шума в источнике его образования;
- 2) дистанционное управление;
- 3) средства индивидуальной защиты;
- 4) выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия.

Работа в зонах с уровнем звука свыше восьмидесяти децибел без использования средств индивидуальной защиты слуха и пребывание строителей в зонах с уровнями звука выше ста двадцати децибел, не допускается.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС					94

Рабочее место с применением или приготовлением мастики, краски и других материалов с резким запахом обеспечивается естественным проветриванием, закрытое помещение оборудуется механической системой вентиляции.

Внутрисменный режим работы должен предусматривать предупреждение переохлаждения работающих лиц за счет регламентации времени непрерывного пребывания на холоде и времени обогрева.

Температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне «плюс» 21 - «плюс» 25°C.

В помещениях гардеробной и прорабской предусматривается бак для воды или бутилированная вода питьевая газированная и минерально-щелочная. Выдача горячего чая и молочнокислых напитков предусмотрена в столовой-раздаточной передвижной. Оптимальная температура жидкости должна быть «плюс» 12 - «плюс» 15°C.

Машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие обеспечиваются индивидуальными флягами для питьевой воды.

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви.

Увеличение продолжительности рабочей смены для работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, не допускается. Отдых между сменами составляет не менее двенадцати часов.

Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи производится до их подъема.

В процессе нанесения окрасочных материалов работники перемещаются в сторону потока свежего воздуха, чтобы аэрозоль и пары растворителей относились от них потоками воздуха.

Краскораспылители используются массой не более одного кг, усилие нажатия на курок краскораспылителя не должно превышать десяти Ньютонов.

Перед допуском работников в места с возможным появлением газа или вредных веществ проводятся детоксикационные мероприятия.

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС	95

Пол в гардеробной, туалетах должен быть влагостойким с нескользкой поверхностью, иметь уклон к трапу для стока воды. В гардеробных укладываются рифленые резиновые или пластмассовые коврики, легко поддающиеся мойке.

Размер помещения для сушки специальной одежды и обуви, его пропускная способность должны обеспечивать просушивание при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе.

Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, стирка или химчистка - по мере необходимости, но не реже 2-х раз в месяц.

Стирка спецодежды обеспечивается прачечными с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих.

Уборка бытовых помещений проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по назначению и хранится в специально выделенном месте.

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования).

На всех участках помещения гардеробной и контора прорабской оборудуются аптечки первой помощи.

В бытовых помещениях должны проводиться дезинсекционные и дератизационные мероприятия.

Работающие должны обеспечиваться горячим питанием. Организация питания предусматривается путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении (предложена Столовая раздаточная-передвижная).

Лица, занятые на участках с вредными и опасными условиями труда, должны проходить обязательные медицинские осмотры в соответствии с Правилами проведения обязательного медицинского осмотра, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан.

Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, осуществляются в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями, и выполняются мероприятия для защиты почвы от загрязнения.

В целях предотвращения выноса грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую территорию выезды со строительной площадки оборудуются пунктами мойки (очистки) колес автотранспорта с организацией системы сточной ливневой канализации с септиком и емкостью для забора воды.

Данные требования выполняются согласно п.11 гл. 2 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» за № 177 от 28.02.2015г.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.						Лист 96
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС						



Установка Предназначена для работы в особо стесненных условиях с пиковой пропускной способностью 3-5 машин в час. Комплект "Мойдодыр-К-1(М)" состоит из очистной установки, капсулы, погружного насоса (Дренажник 150/7ФН "Джилекс" производство Россия), моечного насоса (Водомер 60/92 "Джилекс" производства Россия), одного пистолета, а также типовой технологической схемы организации моечного поста из дорожных плит.

При отсутствии возможности выполнять бетонный приямок может быть приобретен комплект "Мойдодыр-К-1 (МП)". В данной комплектации вместо капсулы в комплект входит песколовка.

Характеристики


- Производительность – 3-5 автомобилей/час.
- Размеры установки (LxBxH) - 1,75x0,56x1,23 м
- Размеры капсулы (LxBxH) - 0,6x0,45x0,6** м
- Размеры моечной площадки - 4,6x3,2 м
- Масса без воды - 190+40 (капсула) кг
- Объем воды в установке - 0,7 м³
- Количество моечных пистолетов – 1 шт.
- Установленная мощность (напряжение) - 2,8 кВт (220 В)

Ине. № подп	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № дубл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

34/2021-06-04-ПОС

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата



Каждый рабочий выезд со строительной площадки оборудуется пунктом мойки (очистки) колес автотранспорта. Комплект оборудования пункта, как правило, располагается в пределах территории строительной площадки вблизи выезда на магистраль.

Территория пункта мойки (очистки) колес должна содержаться в чистоте и порядке.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	производится после обмыва (очистки) колес и днища каждого автомобиля. Техническое обслуживание оборудования пункта мойки (очистки) колес автотранспорта осуществляется в порядке, определенном паспортами и инструкциями по эксплуатации, разработанными заводами-изготовителями. Территория пункта мойки (очистки) колес автотранспорта должна быть подготовлена для обеспечения безопасного производства работ согласно СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». Обустройство пункта осуществляется в ходе выполнения работ подготовительного периода. Персонал пункта мойки должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. Оборудование, средства механизации, ручные машины и инструмент пунктов мойки (очистки) колес должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда. Запрещается их эксплуатация без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации, а также наличия неисправностей, при которых эксплуатация средств механизации согласно документации завода-изготовителя запрещается. При эксплуатации оборудования пункта мойки (очистки) колес персонал должен выполнять требования по охране труда и меры безопасности, указанные в паспортах и инструкциях заводов-изготовителей. Территория пункта мойки (очистки) колес должна содержаться в чистоте и порядке.
					34/2021-06-04-ПОС
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 100

Допуск на территорию пункта работников, не занятых на работах по обмыву (очистке) колес автотранспорта, запрещается.

Пункт мойки (очистки) колес, подъезды и подходы к нему в темное время суток должны быть освещены.

Септики-отстойники, водозаборные баки должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены.

Эксплуатация электроустановок пункта мойки (очистки) колес должна осуществляться в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок, межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей, правил эксплуатации электроустановок потребителей.

Обмыв (очистка) колес и днища автомобиля при работающем двигателе внутреннего сгорания запрещается.

Движение автотранспорта на территории пункта мойки (очистки) колес осуществляется под наблюдением и по команде одного из работников пункта.

3.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Работы производить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

СН РК 1.03-05-2011 и

СП РК 1.03-106-2012

Охрана труда и техника безопасности в строительстве

Технический регламент

Общие требования к пожарной безопасности, утвержденный Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439;

Правила устройства электроустановок

Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, Утв. приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359

Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность выполнения работ.

Рабочие места должны быть оборудованы необходимыми лестницами, подмостями, ограждениями, защитными и предохранительными устройствами, приспособлениями и пр.

Администрация строительства обязана обеспечить всех рабочих спецодеждой и спецобувью соответствующих размеров, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой работы.

Строительные площадки должны быть обеспечены аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи.

Для обеспечения охраны труда и соблюдения техники безопасности, строительные работы производить в соответствии с Инструкцией и мероприятиями, разрабатываемыми администрацией эксплуатирующей организации, согласно техническим регламентам эксплуатации газораспределительных систем.

Требования к персоналу выполняющему строительно-монтажные работы

Персонал, занятый на ремонтно-строительных работах в охранной зоне, должен быть обучен безопасным методам и приемам работы, проинструктирован по последовательности безопасного ведения работ,

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Подп. и дата	Ине. № подл.						Лист
													101
								34/2021-06-04-ПОС					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата									

При производстве работ повышенной опасности ответственный исполнитель работ должен иметь наряд-допуск, являющийся разрешением на проведение работ.

К таким работам относятся:

- работа грузоподъемных строительных механизмов в охранной зоне ЛЭП;
- работа землеройной техники по вскрытию коммуникаций в охранной зоне действующих трубопроводов;
- ручные землеройные работы при пересечении коммуникаций;
- газоопасные и огневые работы в охранной зоне действующих трубопроводов.

В наряде-допуске должны быть указаны место проведения работ, технологическая последовательность и способы производства работ, другие конкретные мероприятия, ответственные лица и срок его действия.

До начала работ по врезке проектируемых участков в действующие газопроводы Генподрядная организация обязана получить от организации, эксплуатирующей газопровод, письменное разрешение на производство работ по врезке в действующий газопровод. Приступать к огневым работам разрешается только после выполнения мероприятий, предусмотренных в разрешении на производство работ.

При выполнении подготовительных работ Заказчику необходимо:

- А. обозначить на местности местоположение газопровода, к которому выполняется присоединение газопровода, и прилегающих газопроводов;
- В. обеспечить связью ремонтно-строительные потоки с диспетчерской службой;
- С. передать по акту Генподрядчику трассу газопроводов, где будут проводиться работы по врезке в действующий газопровод.

Обязанности эксплуатирующих организаций

Со стороны эксплуатирующей организации разрабатываются организационно-технические мероприятия по безаварийному ведению работ. Проектные врезки, как правило, осуществляет эксплуатирующая или Генподрядная организация.

Основные положения мероприятий

А. Организационные:

- составление плана огневых работ при проведении присоединения к участку газопровода;
- издание приказа по координации действий со строительными организациями с назначением ответственного лица за ведения работ;
- инструктаж персонала, участвующего в проведении работ с оформлением наряда-допуска;
- осуществление контроля безопасного производства работ.

Б. Технические мероприятия:

- проверка загазованности в местах производства работ;

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	34/2021-06-04-ПОС					Лист
					Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	103

- обеспечение места работ средствами связи и пожаротушения.

Ответственный за производство работ обязан:

- проверить работоспособность всех машин и механизмов;
- проверить положение запорной арматуры;
- проверить наличие связи с постами;
- обеспечить контроль воздушной среды в зоне огневых работ;
- находиться на месте огневых работ, контролировать работу исполнителей;
- в случае возникновения опасности или ухудшения самочувствия исполнителей немедленно прекратить ведение работ, поставить об этом в известность руководство.

Исполнители огневых работ обязаны:

- пройти инструктаж по безопасному проведению работ и расписаться в наряде-допуске и журнале разового инструктажа;
- приступать к выполнению работ только по указанию ответственного за проведение этой работы;
- применять средства защиты и соблюдать меры безопасности, предусмотренные нарядом допуском и планом работ;
- знать признаки отравления вредными веществами, места расположения средств связи и сигнализации, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны;
- уметь оказать первую помощь пострадавшим;
- следить за состоянием товарищей по работе, оказывать им необходимую помощь. При ухудшении самочувствия сообщать об этом ответственному за проведение работ.

До начала работ проверяется положение (открыто, закрыто) и техническое состояние запорной арматуры, а также производится набивка системы уплотнений кранов специальной смазкой.

Технические транспортные средства, механизмы и персонал, не участвующие в огневой работе, а также места отдыха, обогрева и принятия пищи персонала (передвижные вагончики) и т.д. должны находиться за пределами опасной зоны.

Производство работ в зоне ЛЭП

Запрещается производить строительно-монтажные работы, складывать материалы, устраивать стоянки машин в охранной зоне воздушных линий электропередач без согласования с организацией, эксплуатирующей линию.

Охранные зоны линий электропередачи определяются двумя параллельными плоскостями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии в метрах:

для линии от 6 до 20 кВ включительно – 10

При выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ЛЭП работающим должен быть выдан наряд-допуск, определяющий безопасные условия их работ. Наряд-допуск должен быть подписан главным инженером или главным энергетиком строительно-монтажной организации при наличии

Ине. № подп.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 104
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС					

письменного разрешения на производство этих работ от организации, эксплуатирующей линию электропередачи. Указанные работы должны производиться с выполнением требований правил техники безопасности при эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше.

Работы строительно-дорожных машин в охранной зоне воздушных линий электропередачи разрешается только при условии предварительной выдачи машинисту наряда-допуска, как правило, при полностью снятом напряжении с линии электропередачи организацией, эксплуатирующей данную линию.

В случае невозможности снятия напряжения с линии электропередачи работа и перемещение машин допускается только под руководством и при непрерывном надзоре ответственного лица, назначенного из числа технических работников организации, выполняющей работу, имеющего квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV разряда.

Условия и охрана труда работающих

В рабочих зонах при проведении работ по строительству подводящих газопроводов должны соблюдаться требования, установленные СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», Санитарными правилами и нормами по гигиене труда в промышленности Республики Казахстан.

К наиболее травмоопасным видам строительных работ относятся монтажные, погрузо-разгрузочные, транспортные работы, испытания трубопроводов.

Разработка мероприятий по охране труда, производственной санитарии и технике безопасности в подробном исполнении выполняется строительно-монтажной организацией при разработке ППР, который согласовывается с эксплуатирующей организацией.

Подрядчик по выполнению строительно-монтажных работ обязан обеспечить соответствие санитарно-бытовых помещений и их оснащенность условиям работы и количеству персонала объектов во время строительства.

Организация работ, трудовой распорядок персонала должен соответствовать трудовому законодательству и санитарно-гигиеническим правилам и нормам Республики Казахстан.

Применяемые инструменты и приспособления должны отвечать условиям технической эксплуатации и требованиям технической и пожарной безопасности.

Работник до начала работы обязан проверить состояние своего рабочего места, а также исправность, соответствие предназначенного для предстоящей работы оборудования, инструментов, материалов, средств индивидуальной защиты и в случае обнаружения неисправностей принять меры к их устранению.

Территория в зоне производства работ должна постоянно содержаться в порядке и чистоте. Разлитые горючие продукты должны своевременно убираться, а загрязненная территория зачищаться от загрязненного грунта, смываться водой (используется привозная вода) или засыпаться чистым грунтом.

Проектом предусматривается максимальная механизация трудоемких работ, имеющих место в процессе проведения работ по строительству подводящих газопроводов.

Ине. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата						Лист 105
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС					

- *применение передвижных подъемно-транспортных средств – пневмоколесных и автомобильных кранов, автопогрузчиков, трубоукладчиков, трейлеров и других подъемно-транспортных механизмов;*
- *механизацию монтажных работ по всему комплексу оборудования объектов;*
- *компоновочные решения стройгенплана, позволяющие использовать передвижные подъемно-транспортные средства.*

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов по гигиене труда в промышленности проектом предусматриваются:

Организация системы связи для обеспечения оперативного управления процедурами по проведению
строительно-монтажных работ с использованием стационарных и мобильных средств связи.

Мероприятия по снижению воздействия вредных веществ, система контроля и сигнализации уровней опасных и вредных производственных факторов в местах проведения работ в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям к воздуху рабочей зоны.

Установка предохранительных и сигнализирующих устройств для безопасного проведения работ.

Применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Соблюдение необходимого уровня освещения на строительных площадках.

Своевременное удаление и обезвреживание отходов производства.

Размещение оборудования на площадках строительства с целью обеспечения безопасности работников.

С целью охраны труда, обеспечения промышленной санитарии и безопасных условий строительства в проекте предусматривается:

- *стальные трубы сваривать ручной электродуговой сваркой;*
- *все сварные стыки контролировать физическими методами.*

Строительно-монтажными организациями должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке рабочие инструкции по технике безопасности, по видам работ и профессиям применительно к проведению работ в местных условиях.

Весь персонал, занятый на строительстве газопровода, должен быть предварительно обучен безопасным методам производства работ, ознакомлен с инструкциями и правилами по технике безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

Огневые работы на трубопроводах, находящихся под давлением, должны выполняться в соответствии с «Типовой инструкцией по безопасному ведению огневых работ на газовых объектах».

Все строительно-монтажные работы по врезке в действующий газопровод должны производиться на основании письменного разрешения эксплуатирующей организации, в присутствии ответственного представителя этой организации. При этом также должны соблюдаться меры по обеспечению безопасной эксплуатации пересекаемых коммуникаций и сооружений.

Руководство работ по охране труда и соблюдению инструкций и правил техники безопасности, а также ответственность за ее состояние в строительно-монтажных организациях возлагается на управляющих, начальников и главных инженеров.

3.10 Охрана окружающей природной среды

К основным природоохранным мероприятиям относятся:

- соблюдение границ территорий, отводимых на период строительства во временное пользование для проведения строительных работ;
- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;
- вывоз собранных твердых отходов и отходов, образующихся при бытовой деятельности персонала строительного участка, в специально отведенные места;
- снятие, сохранение и использование почвенно-растительного слоя под строящимися сооружениями.

Использование плодородного слоя почвы для устройства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений для строительных целей не допускается.

После окончания основных работ восстановить водосборные каналы, дренажные системы, дороги, расположенные в пределах полосы отвода земель или пересекающие эту полосу.

К основным положениям по рекультивации земель относятся:

Работы по снятию и нанесению плодородного слоя почвы (техническая рекультивация) выполняется силами строительной организации.

Технология работ по технической рекультивации нарушенных земель при строительстве магистрального газопровода-отвода и подводящих газопроводов заключается в снятии плодородного слоя почвы до начала строительных работ, перемещение его к месту временного хранения и возвращения его на восстанавливаемые земли по окончании строительных работ.

3.11 Основные технико-экономические показатели по ПОС

№№ п/п		Показатели		Количество,	Количество работающих/в том
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

34/2021-06-04-ПОС

Лист

107

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

		<i>мес</i>	<i>числе рабочих, чел</i>
<i>Пусковые комплексы</i>	<i>Продолжительность строительства – 1 п.к</i>	<i>17</i>	<i>123/137</i>
	<i>Продолжительность строительства – 2 п.к</i>	<i>6</i>	<i>65/72</i>
	<i>Продолжительность строительства – 3 п.к</i>	<i>14</i>	<i>167/187</i>
<i>Общая продолжительность с учетом совмещения сроков строительства по пусковым комплексам и очередям, мес</i>		<i>12</i>	

3.12 Графическая часть. Стройгенплан.

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	34/2021-06-04-ПОС					Лист
										108

